



T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART 2024

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	3
1.GENEL DEĞERLENDİRME.....	4
1.1 Misyon.....	4
1.2 Vizyon	4
1.3 Temel Politikalar ve Öncelikler.....	4
1.4 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	5
1.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	6
1.6 Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme	15
1.7 Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları	18
2. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI	21
2.1 Devam Eden Projeler.....	21
1-2011H03-1424 Derslik ve Merkezi Birimler	21
2-2012H03-1584 Kampüs Alt Yapısı.....	22
2.2 Etüt Projeler.....	22
1-2023H03-212135 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	22
2.3 Yeni Projeler.....	23
2.3.1 -2023H03-212131 Yayın Alımı	23
2.3.2 -2023H03-212137 Muhtelif İşler	23
2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	30



Sunduğu eğitim ve yaptığı araştırmalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve itibarlı bir “araştırma üniversitesi” olmak, yüksek nitelikli öğrenci ve öğretim elemanlarını bünyesine çekerek eğitim ve araştırmalarda “rekabet üstünlüğü” elde eden ve bunu sürdürebilen, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programları ile başta Türkiye ve komşuları olmak üzere ülkelerin ihtiyaç duydukları “bilim insanlarını yetiştirmede” merkez üniversite olmak hedefleri ile yola çıkan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi; 2023 yılsonu itibari ile ön lisans düzeyinde 3.220’si Türk ve 133’ü yabancı uyruklu olmak üzere 3.353, lisans düzeyinde 17.233’ü Türk ve 1.944’ü yabancı uyruklu olmak üzere 19.177, lisansüstü eğitimde ise 4.444’ü Türk ve 506’sı yabancı uyruklu olmak üzere 4.950, toplamda ise 27.480 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış ve bu raporlar sayesinde idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanun’un 25’inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin “2023 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanmış olup, saygılarımla kamuoyuna sunarım.

Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Misyon

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Evrensel değerler ışığında verdiği nitelikli eğitimle bilim, kültür, spor ve sanat alanlarında sorgulamaya açık, ahlaki değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; yaptığı araştırmalar ile bilgi ve teknoloji üreterek toplum yararına sunmayı; sahip olduğu girişimcilik ruhuyla ürettiği bilgi ve teknoloji ekseninde insanlık için fayda üretmeyi; hissettiği sosyal sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası düzeyde beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunmayı misyonu olarak benimser.

1.2 Vizyon

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Sunduğu eğitim-öğretim ile iyi bir gelecek inşasına katkı sağlayan, ilim geleneğimizin engin birikimini günümüze taşımayı başaran, araştırma ve projeleriyle insanlık adına faydalar üreten, uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış, akademik, idari ve mali özerkliğe sahip bir üniversite olmayı vizyonu olarak benimser.

1.3 Temel Politikalar ve Öncelikler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kurumsal kültürünün ve kimliğinin oluşumuna yön veren değerler şunlardır:

Yönetsel Değerlerimiz:

- **Değerlere Dayalı Yönetim:** Belirlediğimiz ve benimsediğimiz değerlerimizi kurumsallaştırmak.
- **Rekabetçilik ve Performans Odaklılık:** Yapılanmasını rekabetçi ve performans odaklı bir temelde gerçekleştirmek ve rekabetçiliği üniversite içerisinde kurumsallaştırmak.
- **Paylaşımçı Olmak:** İdari iş ve işlemleri paylaşımcı bir usulle planlamak, kararları ilgili paydaşlarla birlikte almak.
- **Saydamlık:** Yönetsel şeffaflık ve hesap verebilirlik.

Eğitim Değerlerimiz:

- **Kalite Odaklı Olma ve Mükemmeliyetçilik:** Eğitimin niteliğini sürekli geliştirmek ve en üst kalitede eğitim sunmak.
- **Uluslararası Yaklaşım:** Uluslararası bir bakış ile eğitim faaliyetlerini sunmak.
- **Öğrenci Odaklılık:** Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklılığı benimsemek.
- **Analitik ve Yenilikçi Yaklaşım:** Bilgi toplumunda gerekli en temel iki özellik olan analitik ve yenilikçi düşünme biçimini sentezleyerek öğrencilere kazandırmak.
- **Milli ve Manevi Değerlere Saygı:** Eğitim-öğretim süreçlerinde milli, manevi ve evrensel değerlere karşı saygılı ve duyarlı olmak.

Araştırma Değerlerimiz:

- **Akademik Özerklik:** Araştırmacıların yürüttüğü araştırma ve eğitim faaliyetlerinde hürriyet haklarına önem vermek.
- **Disiplinler Arası Yaklaşım:** Farklı disiplinlerin ortak yaklaşımlarını aynı süreçlerde bütünleştirerek geniş bakış açıları sunmak ve yeni keşifler yapmak.
- **Araştırma İşbirliklerini Teşvik:** Bilimsel faaliyetlerde üniversite içi ve dışı, ulusal ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmek.
- **Ahlaki Duyarlılık:** Araştırma süreçlerinde bilim ahlakının gerekliliklerini itinayla yerine getirmeye çalışmak.

Toplumsal Sorumluluk Değerlerimiz:

- **Toplumsal Duyarlılık:** Mensuplarımızın milli çıkarlarımıza ve toplumsal gelişmelere duyarlı davranmalarını teşvik etmek.
- **Çözüm Ortağı Olmak:** Ulusal ve küresel sorunlara araştırma ve önerileriyle çözüm ortağı olmak.
- **Yerel ve Ulusal Kalkınmaya Destek:** Tercih ve faaliyetlerini yerel ve ulusal kalkınmaya faydalı olacak şekilde planlamak ve yürütmek. Üretilen bilgiyi iç ve dış paydaşlar aracılığı ile topluma aktarmak.

Girişimcilik Değerlerimiz:

- **Girişimciliği Teşvik Etmek:** Öğretim elemanı ve öğrencilerini girişimci olmaya teşvik etmek.
- **Bilimsel Fayda ile Ticari Fayda Arasındaki Dengeyi Gözetmek-** Faaliyetlerinde bilimsel kazanım ve kaygılar ile ekonomik fayda arasında denge kurmak.

1.4 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na ekli II sayılı cetvelde yer alan Üniversitemize 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile aşağıda belirtilen mevcut projeler için 183.402.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenekten aktarılmak suretiyle 15.000.000,00 TL ödenek eklenmiş ve böylelikle 2023 yılı toplam proje tutarı 198.402.000,00 TL olmuştur.

Proje No	Proje Adı	Hazine Yardımı	Yedek Ödenek	Ekleme/Aktarma	Toplam
2011H03-1424	Derslik ve Merkezi Birimler	160.001	—	-3.500	156.501
2023H03-212135	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	599	—	-10	589
2023H03-212137	Muhtelif İşler	17.050	14.000	3.500	34.550
2012H03-1584	Kampüs Alt Yapısı	2.000	—	10	2.010
2023H03-212131	Yayın Alımı	3.750	1.000	—	4.750
2023K12-214308	Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı	2	—	—	2
TOPLAM		183.402	15.000	—	198.402

Tablo 1: 2023 Yılı Yatırımlarının Finansman Kaynakları (Bin TL bazında)

1.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi fiziksel yapı durumları tabloda gösterilmiş olup, var olan fiziki yapı ve inşaatı devam eden alanlarla ilgili olarak gerekli açıklamalara da aşağıda yer verilmiştir.

Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (m ²)	Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (m ²)
Esenboğa Külliyesi	77.413,65	Varlık Yerleşkesi	5.248,00
Bilkent Yerleşkesi	11.536,00	Esenboğa Ek Hizmet Binası	2.390,00
Çubuk Yerleşkesi	19.705,00	Milli İrade Yerleşkesi	29.847,00
Cinnah Yerleşkesi	10.372,43	15 Temmuz Şehitleri Yerleşkesi	44.577,74
Etlik Ovacık Yerleşkesi	4.820,00	Tuz Gölü Yerleşkesi	10.200,00
TOPLAM(m²)		216.109,82	

Tablo 2: Kapalı Alan

Esenboğa Külliyesi



Esenboğa Külliyesi 1. etap bina kapalı alan toplamı 77.413,65 m² dir. Kapalı alanlar dört ayrı bina, bir ısı merkezi, kafe, spor merkezi ve soyunma birimlerinden oluşmaktadır. Açık alanlar 2 adet futbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, 606 araçlık açık otopark ve sosyal alanlar, üniversite göleti, kamelyalar, muhtelif türde ağaçların bulunduğu yeşil alanlardan oluşmaktadır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi sınırları içinde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından iki etap halinde yurt inşaatları tamamlanmış olup 2022-2023 eğitim öğretim döneminde kullanıma açılmıştır. Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Öğrenci Yaşam Merkezi inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Esenboğa Külliye Yerleşkesinde; Rektörlük, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü faaliyetlerine devam etmektedir.

Çubuk Yerleşkesi

Çubuk Yerleşkesi Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2015 tarih ve 25351 sayılı yazısı ile Üniversitemize eğitim-öğretim faaliyetleri süresince tahsis edilmiştir. Yerleşkemizdeki yapıların toplam kapalı alanı 19.705 m², açık alan toplamı 310.080 m²'dir.

Halk Sağlığı Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hippetarapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ekolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile sosyal etkinlik alanlarının mevcut olduğu Çubuk Yerleşkesinde okçuluk ve binicilik yapılmaktadır.



Esenboğa Ek Hizmet Binası:



Esenboğa Mah. Atatürk Cd. Çubuk/ANKARA adresinde bulunan bina; Çubuk Belediyesi Meclisi'nin 07.01.2011 tarihli kararıyla 5393 sayılı Kanun'un 75' inci maddesi (d) bendine göre Üniversitemize tahsisi yapılmıştır. Binanın oturma alanı 560 m² olup toplam kapalı alanı 2.390 m²'dir. Bina 1 bodrum, 1 zemin, 2 normal kat olmak üzere toplamda 4 kattan oluşmakta olup Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi idari bina olarak kullanılmaktadır.

15 Temmuz Şehitleri Yerleşkesi



29779 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yenimahalle İlçesi Çerçideresi mahallesinde bulunan 44.577,74 m² alanlı 8010 ada 9 parsel üzerindeki bina, Çevre Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 09.11.2020 sayılı oluru ile Üniversitemize eğitim-öğretim süresince tahsislidir.

15 Temmuz Şehitleri Yerleşkesinde; Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine bu yerleşkede devam etmektedir

Milli İrade Yerleşkesi



29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ankara ili Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde bulunan 7703 m² alanlı 90059 ada 2 numaralı parsel üzerinde Rektörlük Kampüsü olarak kullanılan bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2021 tarihli oluru ile Üniversitemize tahsislidir. Bina 29.847 m²’lik kapalı alana sahiptir.

Milli İrade Binasında; Rektörlük ve İdari Birimler, hazırlık eğitimi veren Yabancı Diller Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji Transfer Ofisi, İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Öğrenme ve Öğretme Birimi faaliyetlerine bu yerleşkede devam etmektedir.

Varlık Yerleşkesi

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesini de kapsayan 200.737 m² alanlı imarın 63805 ada 8 numaralı parseli Ankara Valiliği'nin 05.03.2015 tarih ve 16425 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsisi gerçekleştirilmiştir.

Merkez Araştırma Laboratuvarı Binası



5.248 m² kapalı alana sahip 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşan binada Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmetlerini sürdürmektedir.

Dış Hekimliği Fakültesi ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası



Dış Hekimliği Fakültesi ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası yapım işinde %71 oranında fiziki gerçekleşme olup sözleşmesi feshedilmiştir. 2024 yılı içerisinde tamamlama ihalesine çıkılarak söz konusu inşaatın tamamlanması planlanmaktadır.

Bilkent Yerleşkesi



Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya/ANKARA adresinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin de üzerinde bulunduğu 29104 ada 13 numaralı parselin Tıp Fakültesi Temel Bilimler ve Laboratuvar Binası yapılmak üzere 20.000 m²'lik kısmı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce 12.01.2012 tarihinde Üniversitemize tahsis yapılmıştır. Söz konusu tahsisli arsa üzerine Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası inşaat ihalesi TOKİ tarafından 15.08.2013 tarihinde yapılmıştır. Bina 1 bodrum, zemin ve 3 kattan oluşup 11.536 m² toplam kapalı alana sahiptir. Tıp Fakültesi Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası 2014-2015 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencileri öğrenimlerine bu binada devam etmektedir, Ayrıca Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Endokrinoloji ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezide bu yerleşkede hizmet vermektedir.

Cinnah Yerleşkesi



Güvenevler Mahallesi Cinnah Cad. No:16 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan iki adet binanın 16.07.2021 tarihli ve 1176966 sayılı yazı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce Üniversitemize tahsisi yapılmıştır. Tahsisi yapılan binalardan 4433 ada 9 numaralı parsel üzerindeki bina 1 bodrum, 1 zemin, 6 normal kat ve teras kattan oluşmakta olup 5.651,42 m² kapalı alana sahiptir. 4433 ada 10 numaralı parsel üzerindeki bina 1 bodrum, 1 zemin, 4 normal kattan oluşmakta olup 1.992,01 m² kapalı alana sahiptir ve bu iki binanın toplam kapalı alanı 7.643,43 m²'dir.

Çankaya İlçesi Cinnah Yerleşkesi Güvenevler Mahallesi adresinde bulunan diğer bina ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 01.06.2022 tarihli yazısı ile tahsisi yapılmıştır. Bina idari ofisler ile derslik olarak kullanılmaktadır. Tahsisi yapılan 4433 ada 23 numaralı parsel üzerindeki bina 2 bodrum, 5 normal kat ve teras kattan oluşmakta olup toplamda 2.729 m² kapalı alana sahiptir.

Cinnah Yerleşkesinde Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ile Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Ayrıca Rekabet ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlaması ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rekabet ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi de bu yerleşkemizde bulunmaktadır.

Etlik Ovacık Yerleşkesi



Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1480/2 Sokak Keçiören/ANKARA adresinde Keçiören Belediyesi'ne ait 91845 ada 1 numaralı parselde bulunan 3.640 m² kapalı alanlı bina 10.04.2012 tarihli protokol ile Keçiören Belediyesi'nce Üniversitemize tahsisi yapılmış 11.04.2022 tarihli protokol ile de 2032 yılına kadar Üniversitemiz kullanımına bırakılmıştır.

Söz konusu binaya ilaveten 2013 yılında 1.180 m² kapalı alanlı çelik bina yapılmıştır. Toplamda 4.820 m² kapalı alana sahip olup bina 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşmaktadır. Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bu yerleşkemizde bulunmaktadır.

Tuz Gölü Yerleşkesi

15 Mart 2018 tarihli ve 2018/11394 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde iken Üniversitemize bağlanan Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11.01.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve 3843 sayılı Kanun'un 4' üncü maddesi uyarınca Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu 19.06.2018 tarihli protokol kapsamında Üniversitemize devredilmiştir. Yerleşkede Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.



215 ada 11 numaralı parsel üzerinde bulunan bina 1 bodrum, 1 zemin ve 3 kattan oluşan 4.800 m² kapalı alana sahiptir.



215 ada 12 numaralı parsel üzerinde bulunan bina, 1 zemin ve 3 kattan oluşan 3.900 m² kapalı alana sahiptir.



215 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan bina, 1 bodrum, 1 zemin ve 1 kattan oluşan 1.500 m² kapalı alana sahiptir.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi



Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya/ANKARA adresinde; ortak kullanım protokolü kapsamında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hizmet vermektedir.

Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi

Yeni Batı Mah. 2026.Cad. Batıkent, Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunmakta olup, ortak kullanım protokolü kapsamında hizmet vermektedir.

1.6 Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme

Derslik ve Merkezi Birimler

- **AYBÜ Dış Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası Yapım İşi**



Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında yürütülen AYBÜ Dış Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesine 2023 yılı yatırım programında 30.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. AYBÜ Dış Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası Yapım İşinde; %71 fiziki gerçekleşme oranına sahip iken sözleşme 20.06.2022 tarihinde feshedilmiştir. Hukuki süreç devam etmekte olup, 2024 yılı içerisinde tamamlama ihalesine çıkılarak söz konusu inşaatın 2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

➤ Öğrenci Yaşam Merkezi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında yürütülen, öğrencilerimizin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Öğrenci Yaşam Merkezi Projesi inşaatına başlanılmış olup fiziki gerçekleşme oranı %11,8 seviyesinde iken iş akdi 18.07.2022 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. Öğrenci Yaşam Merkezi Binasının tamamlanabilmesi için 2023 yılında yeniden ihaleye çıkılmış olup yatırım programı çerçevesinde proje tamamlanacaktır.



➤ Sağlık Bilimleri Ortak Derslik Binası

AYBÜ Bilkent Yerleşkesi Sağlık Temel Bilimleri Fakültesi Ek Binası Yapım İş'i kapsamında yatırım programında yer alan 22.000 m²' lik inşaatın henüz ruhsat işlemleri devam ettiğinden projeye başlanılamamıştır.

Yayın Alımları

2023 yılında 2023H03-212131 numaralı Yayın Alımları Projesi kapsamında Üniversitemiz kütüphaneleri ihtiyaçları doğrultusunda basılı yayın alımları ve yapımları, elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları için kullanılmıştır. 2023H03-212131 numaralı Yayın Alımları Projesi kapsamında alınan basılı ve elektronik kitaplar, abone olunan kitaplar, süreli yayınlar, basılı süreli yayınlar ve abone olunan veri tabanı içindeki kaynakların sayısı ile birlikte Üniversitemiz kütüphane envanterinde yer alan toplam kaynak sayısı 7.346.958 adete ulaşmıştır.

Kampüs Altyapısı

2012H03-1584 numaralı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında çevre düzenleme (peyzaj) işleri yapılmış olup, yerleşkelerimizde sulama sistemi yapılması, temiz su hatlarının temizlenmesi, enerji hattının yenilenmesi, elektrik hattı ve foseptik su alt yapısı yapılması için kullanılmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2023 yılı içerisinde 2023H03-212135 nolu projeden AYBÜ Esenboğa Merkez Külliyesi depo yapımı için uygulama projesi hizmet alımı yapılmıştır.

Muhtelif İşler

2023 yılında 2023H03-212137 nolu Muhtelif İşler Projesi, Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kullanılmakta olup, yıl içerisinde projeden aşağıda yer alan giderler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan Giderler	
Bilgisayar Alımları	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları
Büro Makineleri Alımları	Laboratuvar Cihazı Alımları
Diğer Mefruşat Alımları	İşyeri Makine Teçhizat Alımları
Hastane Mefruşatı Alımları	Diğer Makine Teçhizat Alımları
Okul Mefruşatı Alımları	Atölye Gereçleri Alımları
İşyeri Mefruşatı Alımları	Laboratuvar Gereçleri Alımları
Büro Mefruşatı Alımları	Diğer Avadanlık Alımları
Kara Taşıtı Alımları	Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Diğer Müteahhitlik Giderleri	

Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı Projesi

GİMİRİKAM Projesi 2023 Yılı Yatırım Programında 2023K12-214308 proje nolu Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı Projesine dönüştürülmüştür. 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 2.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı yatırım programıyla GİMİRİKAM projesinden harcanmayan ve Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı Projesine aktarılan 16.267.000,00 TL'den 2023 yılı içerisinde 16.248.362,98 TL harcanmıştır.

1.7 Üniversitemiz 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 183.402.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Muhtelif İşler ve Yayın Alımları Projelerine ödenek ihtiyacı sebebiyle 15.000.000 TL yedek ödenek aktarılmış olup, toplam ödeneğimiz 198.402.000,00 TL olmuştur. 2023 yılsonu itibarıyla projelerden yapılan toplam harcama 32.624.817 TL' dir. Böylece başlangıç ödeneğine göre %17,78, toplam ödeneğe göre % 16,44 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

PROJE ADI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLEME/ DÜŞME	TOPLAM ÖDENEK	YILSONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI % (Toplam Ödenek)
EĞİTİM + DKH	183.402.000	15.000.000	198.402.000	32.624.817	16,44
EĞİTİM	183.400.000	15.000.000	198.400.000	32.622.817	16,44
Derslik ve Merkezi Birimler	160.001.000	-3.500.000	156.501.000	-	-
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	599.000	-10.000	589.000	480.000	81,49
Muhtelif İşler	17.050.000	17.500.000	34.550.000	25.385.669	73,47
Kampüs Alt Yapısı	2.000.000	10.000	2.010.000	2.007.940	99,90
Yayın Alımı	3.750.000	1.000.000	4.750.000	4.749.208	99,98
DKH	2.000	-	2.000	2.000	100
Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı	2.000	-	2.000	2.000	100

Tablo 3-Sektörel Bazda Harcama Oranları

*Toplam harcama e-bütçe ödenek durum masraf cetvelinden çekilmiş olup, Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı projesinin 2023 yılı bütçesinden özel hesabına aktarılan tutar harcama olarak alınmıştır.

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım projelerinin ekonomik sınıflandırmaya göre II. düzey dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Eko. Kod	Açıklama	KBÖ	Yedek Ödenek	Aktarma		Toplam Ödenek	Harcama
				Eklenen	Düşülen		
06.1	Mamul Mal Alımları	13.752.000	5.890.000	3.310.826	2.296.000	20.656.826	18.331.653
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.050.000	-	1.400.000	75.000	2.375.000	975.235
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	162.600.000	-	10.000	3.510.000	159.100.000	2.487.940
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.000.000	9.110.000	2.900.000	1.739.826	16.270.174	10.829.989
TOPLAM		183.402.000	15.000.000	7.620.826	7.620.826	198.402.000	32.624.817

Tablo 4-Sermaye Giderleri Ekonomik Dağılım


*Toplam harcama e-bütçe ödenek durum masraf cetvelinden çekilmiş olup, Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı projesinin 2023 yılı bütçesinden özel hesabına aktarılan tutar harcama olarak alınmıştır.

Yatırım Projelerinin sektörlere göre ödenek durumları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

Grafik 1: Eğitim Sektörü Gerçekleşmeleri

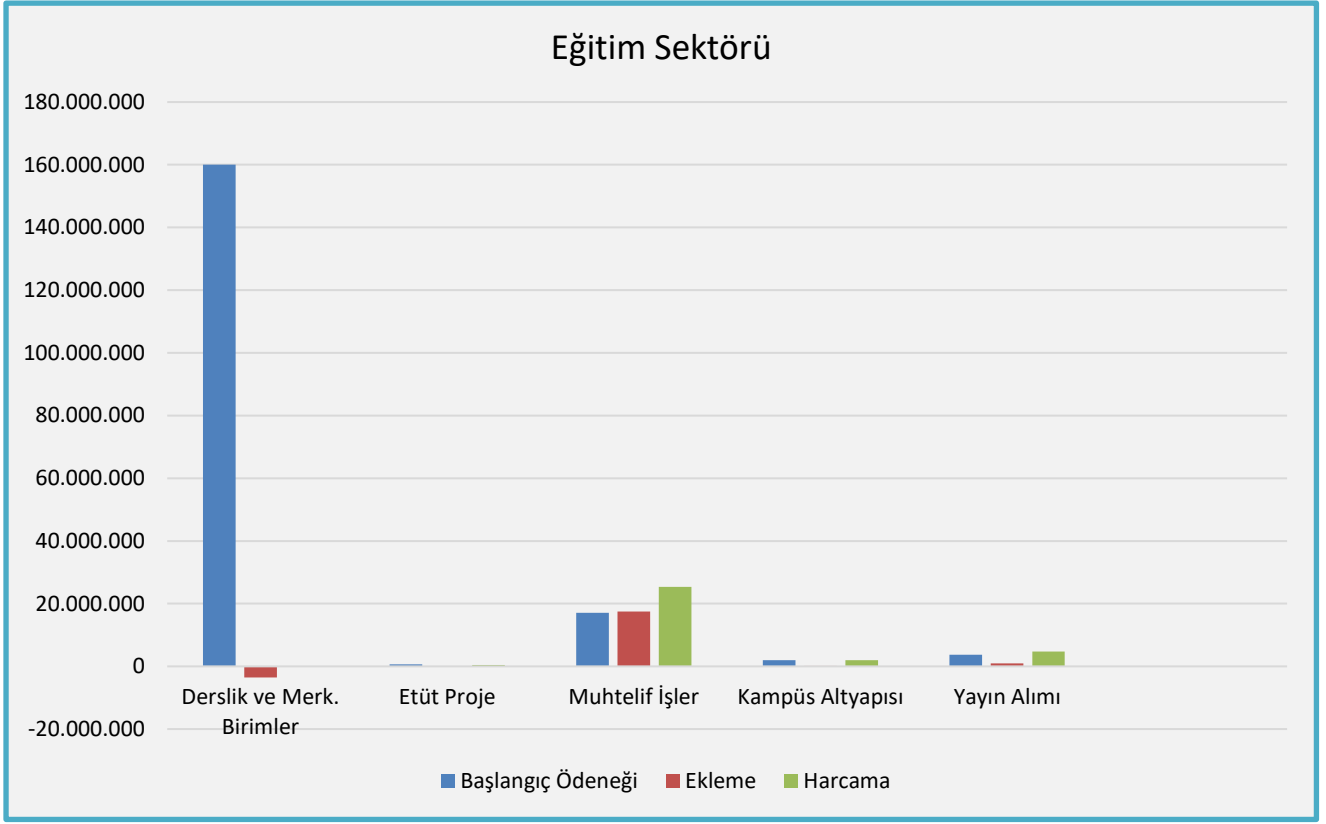

Grafik 2: DKH Sektörü Gerçekleşmeleri

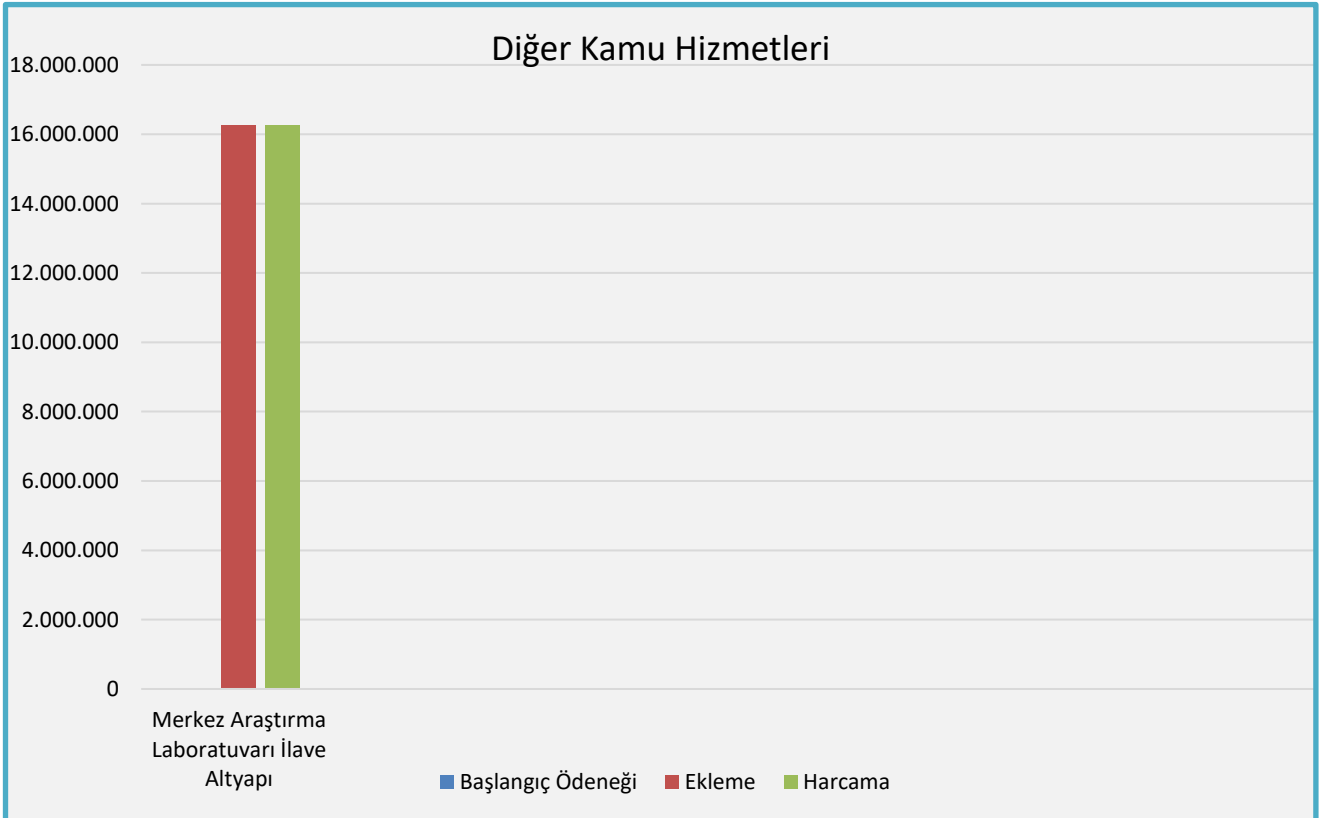

2. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

1-2011H03-1424 Derslik ve Merkezi Birimler

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011H03-1424 nolu projeye 160.001.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2011-2026 yıllarını kapsayan projenin toplam tutarı 435.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde projeden 3.500.000,00 TL ödenek düşülmüş olup toplam ödeneği 156.501.000,00 TL olmuştur. 2022 yılında varolan projelerin sözleşmeleri feshedildiğinden bu yıl projelerde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Projenin Diş. Hek. Fak. ve Tam. Tıp Uyg. Arş. Merkezi Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi ve Sağlık Bilimleri Ortak Derslik Binası olmak üzere 3 alt projesi bulunmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında izlenen Diş Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2023 yılında toplam proje tutarı 120.000.000,00 TL olup, projeye 2023 yılı yatırım programı ile 30.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Yine Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında izlenen Öğrenci Yaşam Merkezi Projesinin 2023 yılında toplam proje tutarı 240.000.000,00 TL olup, proje inşaatı için 2023 yılı yatırım programı ile 130.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve projeden ihtiyaçlar doğrultusunda 3.500.000 TL düşülmüştür. Projenin toplam maaliyeti değiştirilmemiştir.

Sağlık Bilimleri Ortak Derslik Binası projesine ruhsat işlemleri nedeniyle başlanılamadığından yatırım programında iz bedel olarak izlenmektedir. Projenin toplam tutarı 75.000.000 TL' dir.

Sektör:	EĞİTİM (Bin TL Bazında)						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Derslik ve Merkezi Birimler						
Numarası:	2011H03-1424						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2011-2026						
Karakteristiği:	Sağ. Bil. Ort. Ders.(22.000 m ²), Diş Hek. Fak. Ve Tam. Tıp.Uyg. Araş. Mer. (18.958m ²),Öğrenci Yaşam Merkezi (13.500m ²)						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2011	435.000	160.001	-	3.500	156.501	-	-

2-2012H03-1584 Kampüs Alt Yapısı

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde projeye 10.000,00 TL ödenek aktarılmış olup toplam ödeneği 2.010.000,00 TL olmuştur. Projeden 2023 yılında 2.007.940,00 TL harcama yapılarak başlangıç ödeneğine göre %100,40, toplam ödeneğe göre % 99,90 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM (Bin TL Bazında)						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Kampüs Alt Yapısı						
Numarası:	2012H03-1584						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2024						
Karakteristiği:	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2012	19.984	2.000	10	-	2.010	2.008	99,90

2.2 Etüt Projeler

1-2023H03-212135 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 599.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden yıl içerisinde 10.000,00 TL düşülmüş olup toplam ödeneği 589.000,00 TL olmuştur. Projeden 2023 yılında 480.000,00 TL tutarında harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre % 80,13, toplam ödeneğe göre % 81,49 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM (Bin TL Bazında)						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi						
Numarası:	2023H03-212135						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2023-2023						
Karakteristiği:	Etüd-Proje ve Müşavirlik						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2023	599	599	-	10	589	480	81,49

2.3 Yeni Projeler

2.3.1 -2023H03-212131 Yayın Alımı

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 3.750.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeye yıl içerisinde kur fiyatlarındaki artışlardan dolayı 1.000.000,00 TL yedek ödenek aktarılmış olup toplam ödenek 4.750.000,00 TL olmuştur. Projeden 2023 yılı içerisinde basılı ve elektronik yayın alımları için 4.749.207,84 TL harcama yapılmış olup başlangıç ödeneğine göre % 126,65, toplam ödeneğe göre %99,98 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM (Bin TL Bazında)						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Yayın Alımı						
Numarası:	2023H03-212131						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2023-2023						
Karakteristiği:	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2023	3.750	3.750	1.000	-	4.750	4.749	99,98

2.3.2 -2023H03-212137 Muhtelif İşler

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Muhtelif İşler Projesi kapsamında Üniversitemize tahsis edilen 17.050.000,00 TL ödenek, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilgi İşlem, Personel, Öğrenci İşleri, Kütüphane ve Dokümantasyon, İdari ve Mali İşler ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları bakım-onarım, yapım, mal alım ve gayri maddi hak alım ödemelerinde kullanılmıştır. Yıl içerisinde projeye 14.000.000,00 TL yedek ödenek aktarılmış olup, kurum içi ödenek aktarma işlemleri ile proje bütçesi toplam 34.550.000,00 TL olmuştur. Projeden 25.385.669,62 TL harcama yapılarak başlangıç ödeneğine göre %148,88, toplam ödeneğe göre % 73,47 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM						(Bin TL Bazında)
Proje Sahibi	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Muhtelif İşler						
Numarası:	2023H03-212137						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş	2023-2023						
Karakteristiği:	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2023	17.050	17.050	21.610	4.110	34.550	25.385	73,47

2.3.2.2 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2023H03-212137 (Bin TL Bazında)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2023	6.500	7.179	896	12.783	12.782	99,99

2023 yılında Muhtelif İşler Projesinin 6.500.000,00 TL' lik kısmı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. Projenin "Mamul Mal Alımları" ve "Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri" bütçe tertiplerine yıl içerisinde yapılan kurum içi aktarma işlemleri ve 4.890.000,00 TL yedek ödenek aktarması ile toplam ödenek 12.783.826 TL olmuştur. Projeden 12.782.747,13 TL tutarında harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre % 197 toplam ödeneğe göre % 99,99 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Alınan Malzemeler	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	1.875.733,08
İşyeri Mefruşatı Alımları	68.544
Okul Mefruşatı Alımları	1.055.760
Hastane Mefruşatı Alımları	19.788
Diğer Mefruşat Alımları	632.786
Büro Makineleri Alımları	3.548.859,62
Bilgisayar Alımları	1.918.535,99
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	45.595,20
Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.183.756,04
Diğer Avadanlık Alımları	93.102
Kara Taşıtı Alımları	1.791.186
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	549.101,20
Toplam	12.782.747,13

2.3.2.3 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2023 yılında Muhtelif İşler projesinin 4.000.000,00TL' lik kısmı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bütçesine tahsis edilmiş olup, 3.250.000,00 TL' si "Mamul Mal Alımları" , 750.000,00 TL' ise "Gayri Maddi Hak Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. Mamul mal alımları bütçe tertibinden yıl içerisinde 819.000,00 TL düşülmüştür. "Gayri Maddi Hak Alımları" bütçesine 1.325.000,00 TL eklenmiştir. Toplam ödeneği 4.506.000,00 TL olmuştur. Projeden yıl içerisinde DMO' ya mal alımları için 2.325.000,00 TL tutarında avans açılmış ancak evraklar yıl bitmeden tamamlanamadığından mahsup edilememiş dolayısıyla harcama 2023 yılı bütçesinden gerçekleştirilememiştir. Böylelikle yalnızca 931.491,11 TL tutarında harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre % 23,29, toplam ödeneğe göre % 20,66 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Proje Numarası	2023H03-212137 (Bin TL Bazında)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2023	4.000	1.981	1.475	4.506	931	20,66

Muhtelif İşler projesi kapsamında mal alımları gider kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.437,24
Diğer Makine Teçhizat Alımları	105.365,74
Toplam	106.802,98

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden Yazılım Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Hizmet	Miktar
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	824.688,13
Toplam	824.688,13

2.3.2.4 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2023H03-212137 (Bin TL Bazında)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2023	6.290	12.450	1.739	17.000	11.533	67,84

2023 yılında Muhtelif İşler projesinin 6.290.000,00 TL' lik kısmı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine ayrılmıştır. Yıl içerisinde projeye 9.110.000,00 TL yedek ödenek aktarılmış olup, kurum içi ödenek aktarmalar ile toplam ödeneği 17.000.174,00 TL olmuştur

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı' nın "Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri" bütçesi için 6.000.000,00 TL, Gayri Maddi Hak Alımları bütçesi için 40.000,00 TL, "Mamul Mal Alımları" bütçesi için 250.000,00 TL ayrılmıştır. Projeden 11.532.884,58 TL tutarında harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre % 183,35, toplam ödeneğe göre % 67,84 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Mamul Mal Alım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	24.855,27
Diğer Mefruşat Alımları	2.396,17
Büro Makineleri Alımlar	318,60
Laboratuvar Cihazı Alımları	792
İş yeri Makine Teçhizat Alımları	192.528,25
Diğer Makine Teçhizat Alımları	826.560,82
Atölye Gereçleri Alımları	663,75
Laboratuvar Gereçleri Alımları	2.202
Diğer Avadanlık Alımları	189.679,84
Toplam	1.239.996,70

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	12.000,00
Toplam	12.000,00

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.140.033,40
Diğer Müteahhitlik Giderleri	8.140.854,48
Toplam	10.280.887,88

2.3.2.5 Personel Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2023H03-212137 (Bin TL Bazında)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2023	50	-	-	50	50	100

2023 yılında Muhtelif İşler projesinin, 50.000,00 TL’lik kısmı Personel Daire Başkanlığının Gayri Maddi Hak Alımları” bütçesine ayrılmıştır. Projeden yıl içerisinde 50.000,00 TL harcama yapılarak % 100 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Alınan Hizmet	Miktar
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	50.000,00
Toplam	50.000,00

2.3.2.6 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2023H03-212137 (Bin TL Bazında)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2023	50	-	-	50	41	82

2023 yılında Muhtelif İşler projesinin, 50.000,00 TL’lik kısmı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının “Gayri Maddi Hak Alımları” bütçesine ayrılmış olup, projeden yıl içinde 40.546,80 TL tutarında harcama yapılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre % 82 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan İş	Miktar
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	40.546,80
Toplam	40.546,80

2.3.2.7 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2023H03-212137 (Bin TL Bazında)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2023	55	-	-	55	48	87,27

2023 yılında muhtelif işler projesinin, 55.000,00 TL’lik kısmı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının “Gayri Maddi Hak Alımları” bütçesine ayrılmış olup, projeden yıl içinde 48.000,00 TL tutarında harcama yapılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre % 87,27 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Alınan Hizmet	Miktar
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	48.000,00
Toplam	48.000,00

2.3.2.8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2023H03-212137 (Bin TL Bazında)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2023	105	-	-	105	-	-

2023 yılında muhtelif işler projesinin 105.000,00 TL’lik kısmı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının “Gayri Maddi Hak Alımları” bütçesine ayrılmış olup, projeden yıl içerisinde harcama yapılmamıştır.

3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER

- Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sâri projelerin hakediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle ödeme sürecinde sıkıntı yaşanmaktadır.
- Yıllık AFP (Ayrıntılı Finansman Programı) vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- Yıl içerisinde projelere Üniversite kaynaklarından yapılacak olan ödenek ekleme işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı iznine tabi olması sebebiyle iş ve işlemlerde gecikmeler yaşanmaktadır.
- AFP (Ayrıntılı Finansman Programı) ile ödeneklerin aylık olarak serbest bırakılması var olan hakediş ödemeleri ve bunun gibi ödemelerde aksaklığa sebep olabilmektedir.
- İhale sürecinin uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2023 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2023 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		476.383			190.105			183.400			15.000			32.623
Sağlık															
Diğer Kamu Hiz.	1		14.002			-			2			-			2
TOPLAM			490.385			190.105			183.402			15.000			32.625
