



T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART 2022

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	3
1.GENEL DEĞERLENDİRME.....	4
1.1 Misyon.....	4
1.2 Vizyon	4
1.3 Temel Politikalar ve Öncelikler.....	4
1.4 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	5
1.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	6
1.6 Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme	16
1.7 Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları	20
2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI	21
2.1 Devam Eden Projeler.....	21
1-2011H03-1424 Derslik ve Merkezi Birimler	21
2-2012H03-1584 Kampüs Alt Yapısı.....	22
2.2 Etüt Projeler.....	23
1-2021H03-167887 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	23
2.3 Yeni Projeler.....	24
2.3.1 -2021H03-167889 Yayın Alımı	24
2.3.2 -2021H03-167891 Muhtelif İşler	24
3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER	27
2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	28



Sunduğu eğitim ve yaptığı araştırmalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve itibarlı bir “araştırma üniversitesi” olmak, yüksek nitelikli öğrenci ve öğretim elemanlarını bünyesine çekerek eğitim ve araştırmalarda “rekabet üstünlüğü” elde eden ve bunu sürdürebilen, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programları ile başta Türkiye ve komşuları olmak üzere ülkelerin ihtiyaç duydukları “bilim insanlarını yetiştirmede” merkez üniversite olmak hedefleri ile yola çıkan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi; 31 Aralık 2021 tarihi itibarı ile ön lisans düzeyinde 2.509’u Türk ve 122’si yabancı uyruklu olmak üzere 2.631, lisans düzeyinde 15.324’ü Türk ve 2.127’si yabancı uyruklu

olmak üzere 17.451, lisansüstü eğitimde ise 4.241’i Türk ve 492’si yabancı uyruklu olmak üzere 4.733, toplamda ise 24.815 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanun’un 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca Üniversitemizin “2021 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanmış olup, saygılarımla kamuoyuna sunarım.

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Misyon

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Evrensel değerler ışığında verdiği nitelikli eğitimle bilim, kültür, spor ve sanat alanlarında sorgulamaya açık, ahlaki değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; yaptığı araştırmalar ile bilgi ve teknoloji üreterek toplum yararına sunmayı; sahip olduğu girişimcilik ruhuyla ürettiği bilgi ve teknoloji ekseninde insanlık için fayda üretmeyi; hissettiği sosyal sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası düzeyde beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunmayı misyonu olarak benimser.

1.2 Vizyon

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Sunduğu eğitim-öğretim ile iyi bir gelecek inşasına katkı sağlayan, ilim geleneğimizin engin birikimini günümüze taşımayı başaran, araştırma ve projeleriyle insanlık adına faydalar üreten, uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış, akademik, idari ve mali özerkliğe sahip bir üniversite olmayı vizyonu olarak benimser.

1.3 Temel Politikalar ve Öncelikler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kurumsal kültürünün ve kimliğinin oluşumuna yön veren değerler şunlardır:

Yönetsel Değerlerimiz:

- **Değerlere Dayalı Yönetim:** Belirlediğimiz ve benimsediğimiz değerlerimizi kurumsallaştırmak.
- **Rekabetçilik ve Performans Odaklılık:** Yapılanmasını rekabetçi ve performans odaklı bir temelde gerçekleştirmek ve rekabetçiliği üniversite içerisinde kurumsallaştırmak.
- **Paylaşımçı Olmak:** İdari iş ve işlemleri paylaşımcı bir usulle planlamak, kararları ilgili paydaşlarla birlikte almak.
- **Saydamlık:** Yönetsel şeffaflık ve hesap verebilirlik.

Eğitim Değerlerimiz:

- **Kalite Odaklı Olma ve Mükemmeliyetçilik:** Eğitimin niteliğini sürekli geliştirmek ve en üst kalitede eğitim sunmak.
- **Uluslararası Yaklaşım:** Uluslararası bir bakış ile eğitim faaliyetlerini sunmak.
- **Öğrenci Odaklılık:** Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklılığı benimsemek.
- **Analitik ve Yenilikçi Yaklaşım:** Bilgi toplumunda gerekli en temel iki özellik olan analitik ve yenilikçi düşünme biçimini sentezleyerek öğrencilere kazandırmak.
- **Milli ve Manevi Değerlere Saygı:** Eğitim-öğretim süreçlerinde milli, manevi ve evrensel değerlere karşı saygılı ve duyarlı olmak.

Araştırma Değerlerimiz:

- **Akademik Özerklik:** Araştırmacıların yürüttüğü araştırma ve eğitim faaliyetlerinde hürriyet haklarına önem vermek.
- **Disiplinler Arası Yaklaşım:** Farklı disiplinlerin ortak yaklaşımlarını aynı süreçlerde bütünleştirerek geniş bakış açıları sunmak ve yeni keşifler yapmak.
- **Araştırma İşbirliklerini Teşvik:** Bilimsel faaliyetlerde üniversite içi ve dışı, ulusal ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmek.
- **Ahlaki Duyarlılık:** Araştırma süreçlerinde bilim ahlakının gerekliliklerini itinayla yerine getirmeye çalışmak.

Toplumsal Sorumluluk Değerlerimiz:

- **Toplumsal Duyarlılık:** Mensuplarımızın milli çıkarlarımıza ve toplumsal gelişmelere duyarlı davranmalarını teşvik etmek.
- **Çözüm Ortağı Olmak:** Ulusal ve küresel sorunlara araştırma ve önerileriyle çözüm ortağı olmak.
- **Yerel ve Ulusal Kalkınmaya Destek:** Tercih ve faaliyetlerini yerel ve ulusal kalkınmaya faydalı olacak şekilde planlamak ve yürütmek. Üretilen bilgiyi iç ve dış paydaşlar aracılığı ile topluma aktarmak.

Girişimcilik Değerlerimiz:

- **Girişimciliği Teşvik Etmek:** Öğretim elemanı ve öğrencilerini girişimci olmaya teşvik etmek.
- **Bilimsel Fayda ile Ticari Fayda Arasındaki Dengeyi Gözetmek-** Faaliyetlerinde bilimsel kazanım ve kaygılar ile ekonomik fayda arasında denge kurmak.

1.4 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli II sayılı cetvelde yer alan Üniversitemize 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile aşağıda belirtilen mevcut projeler için 46.762.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca 2.000.000,00 TL'si yedek ödenekten aktarılmak suretiyle yıl içinde toplam 19.988.609,00 TL ödenek eklenmiş ve böylelikle 2021 yılı toplam proje tutarı 66.750.609,00 TL olmuştur.

Proje No	Proje Adı	Hazine Yardımı	Yedek Ödenek	Ekleme	Toplam
2011H03-1424	Derslik ve Merkezi Birimler	23.001	2.000	10.500	35.501
2021H03-167887	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400	—	—	400
2021H03-167891	Muhtelif İşler	10.000	—	6.488	16.488
2012H03-1584	Kampüs Alt Yapısı	1.860	—	1.000	2.860
2021H03-167889	Yayın Alımı	1.501	—	—	1.501
2019K12-149072	Girişimsel MR ve İnme Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİMRİKAM)	10.000	—	—	10.000
TOPLAM		46.762	2.000	17.988	66.750

Tablo 1: 2021 Yılı Yatırımlarının Finansman Kaynakları (Bin TL bazında)

1.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi fiziksel yapı durumları tabloda gösterilmiş olup, var olan fiziki yapı ve inşaatı devam eden alanlarla ilgili olarak gerekli açıklamalara da aşağıda yer verilmiştir.

Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (m ²)	Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (m ²)
Esenboğa Külliyesi	77.413,65	Varlık Yerleşkesi (Merkez Araş. Lab. Uygulama ve Araştırma Merkezi)	5.248,00
Bilkent Yerleşkesi	11.536,00	Esenboğa Ek Hizmet Binası	2.390,00
Çubuk Yerleşkesi	19.705,00	Milli İrade Yerleşkesi	29.847,00
Ulus Yerleşkesi	16.432,00	15 Temmuz Yerleşkesi	44.577,74
Cinnah Yerleşkesi	10.372,43	Tuzgölü yerleşkesi	10.200,00
Etlik Diş Hekimliği Ek Binası	4.820,00		
TOPLAM		232.541,82	

Tablo 2: Kapalı Alan

Esenboğa Külliyesi



Esenboğa Külliyesi 1. Etap bina kapalı alanı toplamı 77.413,65 m², açık alan toplamı 1.985.645,66 m²'dir. Kapalı alanlar dört ayrı bina, bir ısı merkezi, kafe, spor merkezi ve soyunma birimlerinden oluşmaktadır. Açık alanlar 2 adet futbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, 606 araçlık açık otopark ve sosyal alanlar, üniversite göleti, kamelyalar, muhtelif türde ağaçların bulunduğu yeşil alanlardan oluşmaktadır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi sınırları içinde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından iki etap halinde yurt inşaatları devam etmektedir.

Külliye alanımızda 2021 yılı itibariyle inşaatına başlanılan Külliye Giriş Kapısı ve Çevre düzenlenmesi işi tamamlanmış olup, öğrencilerimizin kültürel, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatı hızla devam etmekte ve 19.06.2023 yılında kullanıma sunulması planlanmaktadır.

Ayrıca 6.540 m² kapalı alana sahip olacak Camimizin inşaatı için temel kazısı yapılmış olup, inşaatı devam etmektedir.

Esenboğa Külliye Yerleşkesinde; Rektörlük, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Toplamda 12.654 öğrenci Esenboğa Külliyesinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, öğrenci başına 6,12 m² kapalı alan düşmektedir.

Çubuk Yerleşkesi

Çubuk ilçesi 190645 ada 3 ve 4 parsel numaralı arsalar ve üzerindeki taşınmazlar Hazine ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14.10.2015 tarih ve 25351 sayılı yazısı ile Üniversitemize eğitim öğretim faaliyetleri süresince tahsis edilmiştir. Bahsi geçen taşınmazların toplam kapalı alanı 19.705 m² açık alan toplamı 325.080 m² dir. Yerleşkede 2.283 öğrenci eğitim - öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, öğrenci başına 8,07 m² kapalı alan düşmektedir.

Halk Sağlığı Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile sosyal etkinlik alanlarının mevcut olduğu Çubuk Yerleşkesinde okçuluk ve binicilik sporları için altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.





Esenboğa Ek Hizmet Binası:



Esenboğa Mah. Atatürk Cd. Çubuk/Ankara adresinde Esenboğa Mahallesi 538 ada 3 ve 4 parselde bulunan bina 5393 sayılı kanunun 75. maddesi d bendine göre 07.01.2011 tarihli Çubuk Belediyesi Meclis kararıyla üniversitemize tahsisi yapılmıştır. 2.390 m² kapalı alanı bulunan binanın oturma alanı 560 m²'dir. Bina 1 bodrum, 1 zemin, 2 normal kat olmak üzere toplamda 4 kattan oluşmakta olup Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak kullanılmaktadır. Yerleşkede 158 öğrenci eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, öğrenci başına 15,13 m² kapalı alan düşmektedir.

Etlık Yerleşkesi; 15 Temmuz Şehitler Binası



29779 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yenimahalle İlçesi Çerçideresi Mahallesinde bulunan 44.577,74 m² alanlı 8010 ada 9 parsel üzerindeki Ayvalı Kampüsü olarak kullanılan bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 09.11.2020 tarihli oluru ile Üniversitemize eğitim öğretim süresince tahsislidir. 15 Temmuz Şehitler binasında; Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Dış Hekimliği Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler. Yerleşkede 5.599 öğrenci eğitim-öğretim hizmeti almakta olup, öğrenci başına 7,96 m² kapalı alan düşmektedir.

Milli İrade Binası



29779 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ankara ili Keçiören İlçesi Ayvalı Mahallesinde bulunan 7703 m² alanlı 90059 ada 2 parsel üzerindeki Rektörlük Kampüsü olarak

kullanılan bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 13.05.2020 tarihli oluru ile Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bina 29.847 m²'lik kapalı alana sahiptir.

Milli İrade Binasında; Rektörlük ve İdari Birimler, hazırlık eğitimi veren Yabancı Diller Yüksekokulu ile Spor Bilimleri Fakültesi eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yerleşkede 220 öğrenci eğitim - öğretim hizmeti almakta olup, öğrenci başına 135,67 m² kapalı alan düşmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci sayıları kayıtlı oldukları fakülte öğrenci sayılarında hesaplama dâhil edildiği için burada hesaplama dâhil edilmemiştir.

Varlık Yerleşkesi (Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi)



Ankara Etlik Zübeyde Hanım Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesini de kapsayan 200.737 m² alanlı imarın 63805 ada 8 numaralı parseli Ankara Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 05.03.2015 tarih ve 16425 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsisi gerçekleştirilmiştir. 5.248 m² kapalı alana sahip olan yerleşkemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Girişimsel MR ve İnme Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Bilkent Yerleşkesi



Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası

Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya/ANKARA adresinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin de üzerinde bulunduğu 29104 ada 13 (eski 9) numaralı parselin Tıp Fakültesi Temel Bilimler ve Laboratuvar Binası yapılmak üzere 20.000 m²'lik kısmı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 12.01.2012 tarihinde Üniversitemize tahsis edilmiştir. Söz konusu tahsisli arsa üzerine Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası inşaat ihalesi TOKİ tarafından 15.08.2013 tarihinde yapılmıştır. Bina 1 bodrum, zemin ve 3 kattan oluşup 11.536 m² toplam kapalı alana sahiptir. Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası 2014-2015 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencilerimiz öğrenimlerine bu binada devam etmektedir. Ayrıca Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezleri de bu yerleşkede hizmet vermektedir. Yerleşkede 2.720 öğrenci eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, öğrenci başına 4,24 m² kapalı alan düşmektedir.

Cinnah Yerleşkesi



Cinnah Yerleşkesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Cad. No:16 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan iki adet binanın 30.05.2011 tarihinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tahsisi yapılmıştır. Tahsisi yapılan binalardan 4433 ada 9 nolu parsel üzerindeki bina 1 bodrum, 1 zemin, 6 normal kat ve teras kattan oluşmakta olup, 5.651,42 m² kapalı alana sahiptir. 4433 ada 10 nolu parsel üzerindeki bina ise 1 bodrum, 1 zemin, 4 normal kattan oluşmakta olup, 1.992,01 m² kapalı alana sahip olup bu iki binanın toplam kapalı alanı 7.643,43 m² 'dir.

Güvenevler Mahallesi Güneş Sok. No:11 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA adresinde bulunan diğer bina ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan 22.01.2013 tarihli protokol ile

tahsisi yapılmıştır. Bina idari ofisler ile derslik olarak kullanılmaktadır. Tahsisi yapılan 4433 ada 23 nolu parsel üzerindeki bina 2 bodrum, 5 normal kat ve teras kattan oluşmakta, toplamda 2.729,00 m² kapalı alana sahiptir.

Cinnah Yerleşkesinde Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Ayrıca Teknoloji Transfer Ofisi, Rekabet ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlaması ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri de bu yerleşkemizde bulunmaktadır.

Yerleşkede toplam 242 öğrenci eğitim-öğretim hizmeti alıp, öğrenci başına 42,86 m² alan düşmektedir.

Ulus Yerleşkesi



Üniversitemiz kurulduğundan bu yana Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Ulus-Altındağ/ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ankara Valiliğinin 19.12.2012 tarih ve 28417 sayılı olurlarıyla kurulan devir, tasfiye ve paylaşırma komisyonu tarafından 6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi 5. fıkrası hükmü uyarınca binanın 20.02.2014 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğüne devri yapılmış olup tapu işlemleri tamamlanmıştır. Binanın 16.432 m² kapalı alanı, 1.400 m² oturma alanı bulunmaktadır.

Bina 3 bodrum, 1 zemin ve 6 normal kattan oluşmaktadır. Ulus Yerleşkesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ek Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı birimleri, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeler Ofisi faaliyetlerini Ulus Yerleşkesinde sürdürmektedir.

Etlik Dış Hekimliği Ek Binası



Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1480/2 Sokak Keçiören/ANKARA adresinde Keçiören Belediyesine ait 91845 ada 1 parsel (eski 90172 ada 1 parsel) de bulunan 3640 m² kapalı alanlı bina 10.04.2012 tarihli protokol ile Keçiören Belediyesince Üniversitemize tahsisi yapılmıştır.

Binaya ilaveten 2013 yılında 1180 m² kapalı alanlı çelik bina yapılmıştır. Toplamda 4820 m² kapalı alana sahip bina 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşmakta olup, hizmet binası olarak kullanılmaktadır.

Dış Hekimliği Fakültesi ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası

14.09.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanılmış olup, yapımı devam etmektedir.



Tuz Gölü Yerleşkesi

15 Mart 2018 tarihli ve 2018/11394 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde iken Üniversitemize bağlanan Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11.01.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve 3843 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu 19.06.2018 tarihli protokol kapsamında Üniversitemize devredilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 30/12/2020 tarihli ve 2020/25/09 sayılı kararı ile Üniversitemiz Şereflikoçhisar Yerleşkesinin ismi, "Tuz Gölü Yerleşkesi" olarak değiştirilmiştir.



215 ada 11 parsel üzerinde bulunan bina Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu olarak kullanılmakta olup 1 bodrum 1 zemin ve 3 kattan oluşan 4800 m² kapalı alana sahiptir.



215 ada 12 parsel üzerinde bulunan bina Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak kullanılmakta olup 1 zemin ve 3 kattan oluşan 3900 m² kapalı alana sahiptir.



215 ada 12 numaralı parsel üzerinde bulunan bina Şereflikoçhisar Uygulama Oteli olarak kullanılmakta olup 1 bodrum 1 zemin ve 1 kattan oluşan 1500 m² kapalı alana sahiptir.

Yerleşkede 939 öğrenci eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, öğrenci başına 10,86 m² kapalı alan düşmektedir.

Ankara Şehir Hastanesi



Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya/ANKARA adresinde; ortak kullanım protokolü gereğince Üniversite Hastanesi/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi

Yeni Batı Mah. 2026.Cad. Batıkent, Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunmakta olup, ortak kullanım protokolü imzalanmıştır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Hastanesi

02 Aralık 2016 tarihinde; Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile birlikte kullanım protokolü çerçevesinde afiliasyon gerçekleştirilmiş ve Eğitim Hastanesi unvanını almış ve 23.01.2017 tarihinden itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Hastanesi; Güçlükaya Mah. Fatih Cad. Çağla Sok. No:2 Keçiören/ANKARA adresinde hizmet vermeye devam etmektedir.

1.6 Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme

Derslik ve Merkezi Birimler

- AYBÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası Yapım İşi



Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında yürütülen ve 2021 yılı yatırım programında 50.000.000,00 TL tutarlı proje olan Diş Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Araştırma Merkezi Binası Yapım İşi için 10.09.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 32.647.000,00 TL olup, 14.09.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanmıştır. 17.01.2019 tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 32. Maddesiyle 05.01.2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen "Sözleşmelerin Devri ve Tasfiyesi" başlıklı geçici 4. madde hükümlerince yüklenicinin talebi üzerine 18.07.2019 tarihinde sözleşme devri yapılmış olup, 19.07.2019 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %71 seviyesinde olup 2022-2023 eğitim öğretim yılında bitmesi planlanmaktadır.

➤ Öğrenci Yaşam Merkezi

Öğrencilerimizin kültürel, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatı hızla devam etmekte olup, 19.06.2023 yılında kullanıma sunulması planlanmaktadır.



➤ Esenboğa Külliyesi

Esenboğa Külliyesi bina kapalı alanı toplamı 77.413,65 m², açık alan toplamı 1.985.645,66 m²'dir. Kapalı alanlar dört ayrı bina, bir ısı merkezi, kafe, spor merkezi/soyunma birimlerinden oluşmaktadır. Açık alanlar 2 adet futbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, 606 araçlık açık otopark ve sosyal alanlar, üniversite göleti, kamelyalar, muhtelif türde ağaçların bulunduğu yeşil alanlardan oluşmaktadır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 1000 ve 3000 kişilik olmak üzere iki etap halinde yurt inşaatlarına başlanılmış bitme aşamasına gelen yurt binaları 2022-2023 akademik yılında kullanıma açılacaktır.

Külliye alanımızda 2021 yılı itibariyle inşaatına başlanılan Külliye Giriş Kapısı ve Çevre düzenlenmesi işi tamamlanmış olup, öğrencilerimizin kültürel, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatı hızla devam etmektedir.

Ayrıca 6.540 m² kapalı alana sahip olacak Camimizin inşaatı için temel kazısı yapılmış olup, inşaatı devam etmektedir.

Esenboğa Külliye Yerleşkesinde; Rektörlük, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü faaliyetlerine devam etmektedir.





➤ **Sağlık Bilimleri Ortak Derslik Binası**

AYBÜ Bilkent Yerleşkesi Sağlık Temel Bilimleri Fakültesi Ek Binası Yapım İşi kapsamında yatırım programında yer alan 50.000 m²' lik inşaatın henüz ruhsat işlemleri devam ettiğinden projeye başlanılamamıştır.

Yayın Alımları

2021 yılında 2021H03-167889 numaralı Yayın Alımları Projesi ile Üniversitemiz kütüphaneleri ihtiyaçları doğrultusunda basılı yayın alımları ve yapımları ile elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları için harcanmıştır. 2021H03-167889 numaralı Yayın Alımları Projesi kapsamında alınan basılı ve elektronik kitaplar, abone olunan kitaplar ve süreli yayınlar ve basılı süreli yayınların sayısı ile birlikte Üniversitemiz kütüphane envanterinde yer alan toplam kaynak sayısı 1.168.188 âdete ulaşmıştır.

Kampüs Altyapısı

2012H03-1584 numaralı Kampüs Altyapısı projesi kapsamında Esenboğa Külliyesi Ana Giriş Kapısı ve Çevre Düzenleme işleri yapılmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2021 yılı içerisinde 2021H03-167887 nolu projeden 2021 yılında AYBÜ Esenboğa Yerleşkesi Maket Revizyon Proje Hizmeti, AYBÜ Senato Odası İç Mimari Projeleri, AYBÜ Esenboğa Yerleşkesi Rektörlük Binasında Çelik Merdiven ve Toplantı Salonu Projeleri, AYBÜ Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Sahada Jeotermal Araştırmalar Kapsamında Jeofizik Düşey Elektrik Sondajı (DES) Ölçüleri İle Gravite Ölçüm Çalışmaları ve Rapor Hazırlanması kapsamında proje danışmanlık hizmet alım işleri yapılmıştır.

Muhtelif İşler

2021 yılında 2021H03-167891 nolu Muhtelif İşler Projesi, Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kullanılmakta olup, yıl içerisinde projeden aşağıda yer alan giderler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan Giderler	
Büro Mefruşatı Alımları	Atölye Gereçleri Alımları
Diğer Mefruşat Alımları	Diğer Avadanlık Alımları
Büro Makinaları Alımları	İnşaat Malzemesi Giderleri
Bilgisayar Alımları	Elektrik Tesisatı Giderleri
Tıbbi Cihaz Alımları	Sihhi Tesisat Giderleri
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Su Tesisat Giderleri
Bilgisayar Yazılım Alımları	Laboratuvar Gereçleri Alımı

Girişimsel MR ve İnme Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi

2019K12-149072 nolu GİMİRİKAM projesi ile Türkiye'deki manyetik rezonans (MR) görüntüleme, inme veya girişimsel işlemler üzerine araştırma yapan öğretim üyelerinin, mühendislerin, doktorların ve diğer araştırmacıların birlikte tek bir çatı altında AR-GE faaliyetlerini yapabilecekleri, tüm araştırmacılara açık bir altyapının sağlanması hedeflenmektedir. Pandemi ve döviz kurlarındaki artış sebebiyle projeden 2021 yılı içerisinde fiili olarak harcama yapılamamıştır.


1.7 Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 46.762.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler, Muhtelif İşler ve Yayın Alımları Projelerine ödenek ihtiyacından dolayı 2.000.000,00TL'si yedek ödenekten olmak üzere toplam 19.988.609,00 TL ödenek ekleme yapılmış ve toplam ödeneğimiz 66.750.609,00 TL olmuştur. 2021 yılsonu itibari ile projelerden yapılan toplam harcama 33.505.400,00 TL' dir. Böylece başlangıç ödeneğine göre %59,04 toplam ödeneğe göre % 50,19 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

PROJE ADI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLEME	TOPLAM ÖDENEK	YILSONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI % (Toplam Ödenek)
EĞİTİM + DKH	46.762.000	19.988.609	66.750.609	33.505.400	50,19
EĞİTİM	36.762.000	19.988.609	56.750.609	33.505.400	59,04
Derslik ve Merkezi Birimler	23.001.000	12.500.000	35.501.000	14.900.049	41,97
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	400.000	-	400.000	294.410	73,60
Muhtelif İşler	10.000.000	6.488.609	16.488.609	14.575.274	88,40
Kampüs Alt Yapısı	1.860.000	1.000.000	2.860.000	2.234.672	78,13
Yayın Alımı	1.501.000	-	1.501.000	1.500.995	100
DKH	10.000.000	-	10.000.000	-	-
GİMİRİKAM	10.000.000	-	10.000.000	-	-

Tablo 3-Sektörel Bazda Harcama Oranları

*Toplam harcama e-bütçe ödenek durum masraf cetvelinden çekilmiş olup, Gimrikam projesinin özel hesabından yapılan harcama alınmıştır.

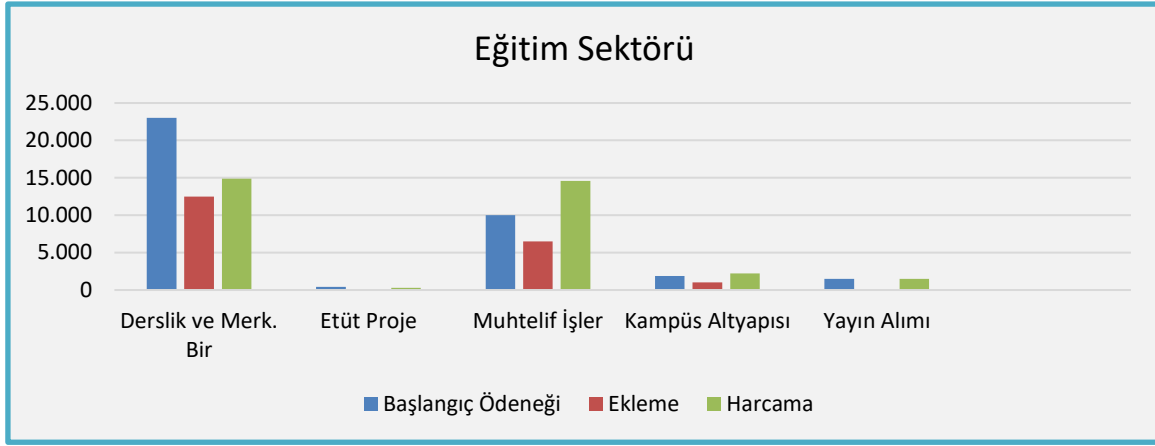

Grafik 1-Sektörel Bazda Harcama Oranları Grafiği

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım projelerinin ekonomik gider koda göre II. düzeyde dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eko. Kod	Açıklama	KBÖ	Yedek Ödenek	Eklenen	Toplam Ödenek	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	16.900.000	-	856.010	17.756.010	6.579.070
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	600.000	-	-	600.000	579.190
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	25.262.000	2.000.000	16.132.599	43.394.599	22.062.729
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.000.000	-	1.000.000	5.000.000	4.284.411
	TOPLAM	46.762.000	2.000.000	17.988.609	66.750.609	33.505.400

Tablo 4-Sermaye Giderleri Ekonomik Dağılım

*Toplam harcama e-bütçe ödenek durum masraf cetvelinden çekilmiş olup, Gimrikam projesinin özel hesabından yapılan harcama alınmıştır.

2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

1-2011H03-1424 Derslik ve Merkezi Birimler

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011H03-1424 nolu projeye 23.001.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2011-2024 yıllarını kapsayan projenin toplam tutarı 186.106.000,00 TL olup, yıl içerisinde projeye 10.500.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı

ve 2.000.000,00 TL yedek ödenek aktarımı yapılarak toplam ödeneği 35.501.000,00 TL olmuştur. Yıl içerisinde projeden toplam 14.900.048,46 TL harcama yapılarak başlangıç ödeneğine göre % 64,78, toplam ödeneğe göre % 41,97 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında izlenen Diş Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2021 yılında toplam proje tutarı 60.500.000,00 TL olup, projeye 2021 yılı yatırım programı ile 15.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde projede kullanılmak üzere, projenin geçmiş yıllardan devreden likit kaynaklarından 8.500.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve 2.000.000,00TL yedek ödenekten aktarılmıştır. Projeye ilişkin toplam 21 hakediş ödemesi yapılmış olup, projenin 2022 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Yine Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında izlenen Öğrenci Yaşam Merkezi Projesinin 2021 yılında toplam proje tutarı 40.000.000,00 TL olup, proje inşaatı için 2021 yılı yatırım programı ile 8.000.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde projede kullanılmak üzere 2.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Toplamda 13.500 m² kapalı alana sahip Öğrenci Yaşam Merkezi içerisinde 500 kişilik konferans salonu, 12 adet kafe-restoran, 17 adet dükkân-mağaza, öğrenci ve personel yemekhanesi ile mutfak olan projenin çalışmaları devam etmekte olup 2021 yılı itibariyle %10 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Öğrenci Yaşam Merkezinin 2023 yılı itibariyle kullanıma sunulması planlanmaktadır.

Sektör:	EĞİTİM						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Derslik ve Merkezi Birimler						
Numarası:	2011H03-1424						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2011-2024						
Karakteristiği:	Sağ. Bil. Ort. Ders.(50.000 m ²), Diş Hek. Fak. Ve Tam. Tıp.Uyg. Araş. Mer. (18.958m ²),Öğrenci Yaşam Merkezi (13.500m ²)						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2011	186.106	23.001	12.500	-	35.501	14.900	41,97

2-2012H03-1584 Kampüs Alt Yapısı

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 1.860.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Esenboğa Külliyesi Ana Giriş Kapısı ve Çevre Düzenlemesi işlerinde kullanılmış olup, yıl içerisinde projeye 1.000.000,00 ödenek eklenerek proje toplam ödeneği 2.860.000,00TL olmuştur. Projeden 2021 yılında 2.234.672,49 TL harcama yapılarak başlangıç ödeneğine göre %120,11 toplam ödeneğe göre % 78,13 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Kampüs Alt Yapısı						
Numarası:	2012H03-1584						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2022						
Karakteristiği:	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı,Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı,Peyzaj, Su isale hattı,Telefon Hattı						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2012	18.100	1.860	1.000	-	2.860	2.234	78,13

2.2 Etüt Projeler

1-2021H03-167887 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 400.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2021 yılında AYBÜ Esenboğa Yerleşkesi Maket Revizyon Proje Hizmeti, AYBÜ Senato Odası İç Mimari Projeleri, AYBÜ Esenboğa Yerleşkesi Rektörlük Binasında Çelik Merdiven ve Toplantı Salonu Projeleri, AYBÜ Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Sahada Jeotermal Araştırmalar Kapsamında Jeofizik Düşey Elektrik Sondajı (DES) Ölçüleri ile Gravite Ölçüm Çalışmaları ve Rapor Hazırlanması kapsamında proje danışmanlık hizmet alım işleri için 294.410,00 TL tutarında harcama yapılarak % 73,60 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi						
Numarası:	2021H03-167887						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2021-2021						
Karakteristiği:	Etüd-Proje ve Müş.						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2021	400	400	-	-	400	294	73,60

2.3 Yeni Projeler

2.3.1 -2021H03-167889 Yayın Alımı

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 1.501.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2021 yılı içerisinde basılı ve elektronik yayın alımları için 1.500.995,00 TL harcama yapılmış ve % 100 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Yayın Alımı						
Numarası:	2021H03-167889						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2021-2021						
Karakteristiği:	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2021	1.501	1.501	-	-	1.501	1.501	100

2.3.2 -2021H03-167891 Muhtelif İşler

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Muhtelif İşler Projesi kapsamında Üniversitemize tahsis edilen 10.000.000,00 TL ödenek, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın bakım-onarım, yapım, mal alım ve gayrimaddi hak alım ile kesin hesap ödemelerinde kullanılmış olup, ihtiyaçlardan dolayı yıl içerisinde projeye 6.488.609,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Proje bütçesine ekleme ile birlikte toplam ödenek 16.488,609,00 TL olmuştur. Projeden 14.475.274,70 TL harcama yapılarak başlangıç ödeneğine göre %145,75 toplam ödeneğe göre % 88,40 oranında bir gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Muhtelif İşler						
Numarası:	2021H03-167891						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2021-2021						
Karakteristiği:	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2021	10.000	10.000	6.488	-	16.488	14.575	88,40

2.3.2.1 Rektörlük

Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun E cetvelinin 65. Maddesine istinaden, Ankara Kalkınma Ajansı'nın "Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında "Yenilikçi Yaklaşımlarla Agat Taşı Takı-Hediyelik Eşya Tasarımı, Üretimi ve Tanıtımı" projesine 65.010,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir.

2.3.2.2 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2021H03-167891					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2021	1.900	750	-	2.650	2.404	90,72

2021 yılında Muhtelif İşler Projesinin 1.900.000,00 TL' lik kısmı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. Projeye yıl içerisinde 750.000 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Projeden 2.404.780,87 TL tutarında harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre 139,47 toplam ödeneğe göre % 90,72 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Alınan Malzemeler	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	1.177.848,99
Diğer Mefruşat Alımları	181.460,40
Büro Makinaları Alımları	292.750,44
Bilgisayar Alımları	397.016,92
Tıbbi Cihaz Alımları	1.300,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	354.404,12
Toplam	2.404.780,87

2.3.2.3 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2021 yılında Muhtelif İşler projesinin 4.000.000,00 TL' lik kısmının 3.400.000,00 TL' si Bilgi İşlem Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları" 600.000,00 TL' ise "Gayri Maddi Hak Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. Projeden yıl içerisinde toplamda 3.047.478,24 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 76,19 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Proje Numarası	2021H03-167891					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2021	4.000	-	-	4.000	3.047	76,19

Muhtelif İşler projesi kapsamında mal alımları gider kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Malzemeler	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	668.826,94
Bilgisayar Alımı	57.171,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.742.290,16
Toplam	2.468.288,10

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden Yazılım Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Malzemeler	Miktar
Bilgisayar Yazılım Alımları	579.190,14
Toplam	579.190,14

2.3.2.4 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2021H03-167891					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2021	4.100	5.673	-	9.773	9.058	92,68

2021 yılında Muhtelif İşler projesinin 4.000.000,00 TL' lik kısmı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı' nın "Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri" bütçesi için, 100.000,00 TL lik kısmı da "Mamul Mal Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. Yıl içerisinde projeye toplamda 5.673.599,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılarak toplam bütçesi 9.773.599,00TL olmuştur. Projeden 9.058.005,59 TL tutarında harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre 220,92 toplam ödeneğe göre % 92,68 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Mamul Mal Alım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	3.191,90
Diğer Mefruşat Alımları	34.255,69
İş yeri Makine Teçhizat Alımları	10.101,98
Tamir Bakım Aleti Alımları	1.744,04
Laboratuvar Gereçleri Alımı	380,55
Diğer Avadanlık Alımları	90.321,73
Toplam	139.995,89

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Diğer Gayrimenkul Bakım Onarım	1.865.277,71
Hizmet Binası Büyük Onarım	2.419.133,34
Toplam	4.284.411,05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
TOKİ 1.Etap Kesin Hesap	4.633.598,65
Toplam	4.633.598,65

3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER

- Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sâri projelerin hakediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır.
- Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- Yıl içerisinde projelere Üniversite kaynaklarından yapılacak olan ödenek ekleme işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı iznine tabi olması sebebiyle iş ve işlemlerde gecikmeler yaşanmaktadır.
- 2021 yılında ödeneklerin aylık olarak serbest bırakılması var olan hakediş ödemeleri ve bunun gibi ödemelerde aksaklığa sebep olabilmektedir.
- İhale sürecinin uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.
- Ayrıca projelerin gerçekleştirilmesi bakımından yeterince ödenek tahsis edilmemesi de sorunların başında yer almaktadır.

2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2021 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		216.107			136.392			36.762			19.988			33.505
Sağlık															
Diğer Kamu Hiz.	1		19.782			3,4			10.000			-			-
TOPLAM			235.889			136.395			46.762			19.988			33.505
