



T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART 2023

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	3
1.GENEL DEĞERLENDİRME.....	4
1.1 Misyon.....	4
1.2 Vizyon	4
1.3 Temel Politikalar ve Öncelikler.....	4
1.4 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	5
1.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	6
1.6 Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme	16
1.7 Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları	21
2. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI	23
2.1 Devam Eden Projeler.....	23
1-2011H03-1424 Derslik ve Merkezi Birimler	23
2-2012H03-1584 Kampüs Alt Yapısı.....	24
2.2 Etüt Projeler.....	24
1-2022H03-186347 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	24
2.3 Yeni Projeler.....	25
2.3.1 -2022H03-186343 Yayın Alımı	25
2.3.2 -2022H03-186352 Muhtelif İşler	25
3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER	31
2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	32



Sunduğu eğitim ve yaptığı araştırmalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve itibarlı bir “araştırma üniversitesi” olmak, yüksek nitelikli öğrenci ve öğretim elemanlarını bünyesine çekerek eğitim ve araştırmalarda “rekabet üstünlüğü” elde eden ve bunu sürdürebilen, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programları ile başta Türkiye ve komşuları olmak üzere ülkelerin ihtiyaç duydukları “bilim insanlarını yetiştirmede” merkez üniversite olmak hedefleri ile yola çıkan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi; 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ön lisans düzeyinde 3.074’u Türk ve 161’i yabancı uyruklu olmak üzere 3.235, lisans düzeyinde 15.909’u Türk ve 2.107’si yabancı uyruklu

olmak üzere 18.016, lisansüstü eğitimde ise 4.527’si Türk ve 538’i yabancı uyruklu olmak üzere 5.065, toplamda ise 26.316 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanun’un 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca Üniversitemizin “2022 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanmış olup, saygılarımla kamuoyuna sunarım.

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Misyon

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Evrensel değerler ışığında verdiği nitelikli eğitimle bilim, kültür, spor ve sanat alanlarında sorgulamaya açık, ahlaki değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; yaptığı araştırmalar ile bilgi ve teknoloji üreterek toplum yararına sunmayı; sahip olduğu girişimcilik ruhuyla ürettiği bilgi ve teknoloji ekseninde insanlık için fayda üretmeyi; hissettiği sosyal sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası düzeyde beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunmayı misyonu olarak benimser.

1.2 Vizyon

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Sunduğu eğitim-öğretim ile iyi bir gelecek inşasına katkı sağlayan, ilim geleneğimizin engin birikimini günümüze taşımayı başaran, araştırma ve projeleriyle insanlık adına faydalar üreten, uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış, akademik, idari ve mali özerkliğe sahip bir üniversite olmayı vizyonu olarak benimser.

1.3 Temel Politikalar ve Öncelikler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kurumsal kültürünün ve kimliğinin oluşumuna yön veren değerler şunlardır:

Yönetsel Değerlerimiz:

- **Değerlere Dayalı Yönetim:** Belirlediğimiz ve benimsediğimiz değerlerimizi kurumsallaştırmak.
- **Rekabetçilik ve Performans Odaklılık:** Yapılanmasını rekabetçi ve performans odaklı bir temelde gerçekleştirmek ve rekabetçiliği üniversite içerisinde kurumsallaştırmak.
- **Paylaşımçı Olmak:** İdari iş ve işlemleri paylaşımcı bir usulle planlamak, kararları ilgili paydaşlarla birlikte almak.
- **Saydamlık:** Yönetsel şeffaflık ve hesap verebilirlik.

Eğitim Değerlerimiz:

- **Kalite Odaklı Olma ve Mükemmeliyetçilik:** Eğitimin niteliğini sürekli geliştirmek ve en üst kalitede eğitim sunmak.
- **Uluslararası Yaklaşım:** Uluslararası bir bakış ile eğitim faaliyetlerini sunmak.
- **Öğrenci Odaklılık:** Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklılığı benimsemek.
- **Analitik ve Yenilikçi Yaklaşım:** Bilgi toplumunda gerekli en temel iki özellik olan analitik ve yenilikçi düşünme biçimini sentezleyerek öğrencilere kazandırmak.
- **Milli ve Manevi Değerlere Saygı:** Eğitim-öğretim süreçlerinde milli, manevi ve evrensel değerlere karşı saygılı ve duyarlı olmak.

Araştırma Değerlerimiz:

- **Akademik Özerklik:** Araştırmacıların yürüttüğü araştırma ve eğitim faaliyetlerinde hürriyet haklarına önem vermek.
- **Disiplinler Arası Yaklaşım:** Farklı disiplinlerin ortak yaklaşımlarını aynı süreçlerde bütünleştirerek geniş bakış açıları sunmak ve yeni keşifler yapmak.
- **Araştırma İşbirliklerini Teşvik:** Bilimsel faaliyetlerde üniversite içi ve dışı, ulusal ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmek.
- **Ahlaki Duyarlılık:** Araştırma süreçlerinde bilim ahlakının gerekliliklerini itinayla yerine getirmeye çalışmak.

Toplumsal Sorumluluk Değerlerimiz:

- **Toplumsal Duyarlılık:** Mensuplarımızın milli çıkarlarımıza ve toplumsal gelişmelere duyarlı davranmalarını teşvik etmek.
- **Çözüm Ortağı Olmak:** Ulusal ve küresel sorunlara araştırma ve önerileriyle çözüm ortağı olmak.
- **Yerel ve Ulusal Kalkınmaya Destek:** Tercih ve faaliyetlerini yerel ve ulusal kalkınmaya faydalı olacak şekilde planlamak ve yürütmek. Üretilen bilgiyi iç ve dış paydaşlar aracılığı ile topluma aktarmak.

Girişimcilik Değerlerimiz:

- **Girişimciliği Teşvik Etmek:** Öğretim elemanı ve öğrencilerini girişimci olmaya teşvik etmek.
- **Bilimsel Fayda ile Ticari Fayda Arasındaki Dengeyi Gözetmek-** Faaliyetlerinde bilimsel kazanım ve kaygılar ile ekonomik fayda arasında denge kurmak.

1.4 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli II sayılı cetvelde yer alan Üniversitemize 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile aşağıda belirtilen mevcut projeler için 45.507.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca 6.800.000,00 TL'si ek bütçeden aktarılacak suretiyle yıl içinde toplam 34.300.000,00 TL ödenek eklenmiş ve böylelikle 2022 yılı toplam proje tutarı 79.807.000,00 TL olmuştur.

Proje No	Proje Adı	Hazine Yardımı	Yedek Ödenek	Ekleme/Aktarma	Toplam
2011H03-1424	Derslik ve Merkezi Birimler	30.000	—	26.000	56.000
2022H03-186347	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100	—	142	242
2022H03-186352	Muhtelif İşler	12.000	—	8.174	20.174
2012H03-1584	Kampüs Alt Yapısı	1.205	—	-16	1.189
2022H03-186343	Yayın Alımı	2.200	—	—	2.200
2019K12-149072	Girişimsel MR ve İnme Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİMRİKAM)	2	—	—	2
TOPLAM		45.507	—	34.300	79.807

Tablo 1: 2022 Yılı Yatırımlarının Finansman Kaynakları (Bin TL bazında)

1.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi fiziksel yapı durumları tabloda gösterilmiş olup, var olan fiziki yapı ve inşaatı devam eden alanlarla ilgili olarak gerekli açıklamalara da aşağıda yer verilmiştir.

Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (m ²)	Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (m ²)
Esenboğa Külliyesi	77.413,65	Varlık Yerleşkesi (Merkez Araş. Lab. Uygulama ve Araştırma Merkezi)	5.248,00
Bilkent Yerleşkesi	11.536,00	Esenboğa Ek Hizmet Binası	2.390,00
Çubuk Yerleşkesi	19.705,00	Milli İrade Yerleşkesi	29.847,00
Ulus Yerleşkesi	16.432,00	15 Temmuz Yerleşkesi	44.577,74
Cinnah Yerleşkesi	10.372,43	Tuzgölü Yerleşkesi	10.200,00
Etlik Ovacık Yerleşkesi	4.820,00		
TOPLAM		232.541,82	

Tablo 2: Kapalı Alan

Esenboğa Külliyesi



Esenboğa Külliyesi 1. etap bina kapalı alanı toplamı 77.413,65 m², açık alan toplamı 1.985.645,66 m²'dir. Kapalı alanlar dört ayrı bina, bir ısı merkezi, kafe, spor merkezi ve soyunma birimlerinden oluşmaktadır. Açık alanlar 2 adet futbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, 606 araçlık açık otopark ve sosyal alanlar, üniversite göleti, kamelyalar, muhtelif türde ağaçların bulunduğu yeşil alanlardan oluşmaktadır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi sınırları içinde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından iki etap halinde yurt inşaatları tamamlanmış olup 2022-2023 eğitim öğretim döneminde kullanıma açılmıştır. Külliye alanımızda 2021 yılı itibarıyla inşaatına başlanılan Külliye Giriş Kapısı ve Çevre düzenlenmesi işi tamamlanmış olup, öğrencilerimizin kültürel, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Öğrenci Yaşam Merkezi inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 6.540 m² kapalı alana sahip olacak Camimizin inşaatı için temel kazısı yapılmış olup, inşaatı devam etmektedir.

Esenboğa Külliye Yerleşkesinde; Rektörlük, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, faaliyetlerine devam etmektedir.

Çubuk Yerleşkesi

Çubuk ilçesi 190645 ada 3 ve 4 parsel numaralı arsalar ve üzerindeki taşınmazlar Hazine ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14.10.2015 tarih ve 25351 sayılı yazısı ile Üniversitemize eğitim-öğretim faaliyetleri süresince tahsis edilmiştir. Ancak 3 numaralı parsel Toplu Konut İdaresi Başkanlığının kullanımına verilmiş olup, üniversitemiz kullanımında olan taşınmazların toplam kapalı alanı 19.705 m², açık alan toplamı 310.080 m²'dir.

Halk Sağlığı Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ekolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile sosyal etkinlik alanlarının mevcut olduğu Çubuk Yerleşkesinde okçuluk ve binicilik yapılmaktadır.



Esenboğa Ek Hizmet Binası:



Esenboğa Mah. Atatürk Cd. Çubuk/ANKARA adresinde Esenboğa Mahallesi 538 ada 3 ve 4 numaralı parselde bulunan bina 5393 sayılı Kanunun 75. maddesi d bendine göre 07.01.2011 tarihli Çubuk Belediye Meclisi kararıyla Üniversitemize tahsisi yapılmıştır. 2.390 m² kapalı alanı bulunan binanın oturma alanı 560 m²'dir. Bina 1 bodrum,1 zemin, 2 normal kat olmak üzere toplamda 4 kattan oluşmakta olup, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak kullanılmaktadır.

Etlik Yerleşkesi; 15 Temmuz Şehitler Binası



29779 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yenimahalle ilçesi Çerçideresi Mahallesinde bulunan 44.577,74 m² alanlı 8010 ada 9 numaralı parsel üzerindeki Ayvalı Kampüsü olarak kullanılan bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 09.11.2020 tarihli oluru ile Üniversitemize eğitim-öğretim süresince tahsislidir. 15 Temmuz Şehitler Binasında; Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler.

Milli İrade Binası



29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ankara ili Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesinde bulunan 7703 m² alanlı 90059 ada 2 numaralı parsel üzerinde Rektörlük Kampüsü olarak kullanılan bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 13.05.2020 tarihli oluru ile Üniversitemize tahsislidir. Bina 29.847 m²’lik kapalı alana sahiptir.

Milli İrade Binasında; Rektörlük ve İdari Birimler, hazırlık eğitimi veren Yabancı Diller Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerine bu yerleşkede devam etmektedir.

Varlık Yerleşkesi (Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi)



Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesini de kapsayan 200.737 m² alanlı imarın 63805 ada 8 numaralı parseli Ankara Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 05.03.2015 tarih ve 16425 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsisi gerçekleştirilmiştir. 5.248 m² kapalı alana sahip yerleşkemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Bilkent Yerleşkesi



Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya/ANKARA adresinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin de üzerinde bulunduğu 29104 ada 13 (eski 9) numaralı parselin Tıp Fakültesi Temel Bilimler ve Laboratuvar Binası yapılmak üzere 20.000 m²'lik kısmı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 12.01.2012 tarihinde Üniversitemize tahsis yapılmıştır. Söz konusu tahsisli arsa üzerine Tıp Fakültesi Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası inşaat ihalesi TOKİ tarafından 15.08.2013 tarihinde yapılmıştır. Bina 1 bodrum, zemin ve 3 kattan oluşup 11.536 m² toplam kapalı alana sahiptir. Tıp Fakültesi Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası 2014-2015 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencileri öğrenimlerine bu binada devam etmektedir, Ayrıca Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Endokrinoloji ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezleri de bu yerleşkede hizmet vermektedir.

Cinnah Yerleşkesi



Güvenevler Mahallesi Cinnah Cad. No:16 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan iki adet binanın 30.05.2011 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tahsisi yapılmıştır. Tahsisi yapılan binalardan 4433 ada 9 numaralı parsel üzerindeki bina 1 bodrum, 1 zemin, 6 normal kat ve teras kattan oluşmakta olup, 5.651,42 m² kapalı alana sahiptir. 4433 ada 10 numaralı parsel üzerindeki bina 1 bodrum, 1 zemin, 4 normal kattan oluşmakta olup 1.992,01 m² kapalı alana sahiptir ve bu iki binanın toplam kapalı alanı 7.643,43 m²'dir.

Güvenevler Mahallesi Güneş Sok. No:11 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA adresinde bulunan diğer bina ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan 22.01.2013 tarihli protokol ile tahsisi yapılmıştır. Bina idari ofisler ile derslik olarak kullanılmaktadır. Tahsisi yapılan 4433 ada 23 numaralı parsel üzerindeki bina 2 bodrum, 5 normal kat ve teras kattan oluşmakta olup toplamda 2.729,00 m² kapalı alana sahiptir.

Cinnah Yerleşkesinde Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ile Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Ayrıca Rekabet ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlaması ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi de bu yerleşkemizde bulunmaktadır.

Ulus Yerleşkesi



Üniversitemiz kurulduğundan bu yana Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Ulus, Altındağ/ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ankara Valiliğinin 19.12.2012 tarih ve 28417 sayılı olurlarıyla kurulan devir, tasfiye ve paylaşırma komisyonu tarafından 6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi 5. fıkrası hükmü uyarınca binanın 20.02.2014 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğüne devri yapılmış olup tapu işlemleri tamamlanmıştır. Bina 16.432 m² kapalı alanı, 1.400 m² oturma alanı bulunmaktadır.

Bina 3 bodrum, 1 zemin ve 6 normal kattan oluşmaktadır. Ulus Yerleşkesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ek Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeler Ofisi faaliyetlerini Ulus Yerleşkesinde sürdürmektedir. ¹

¹ Ulus Yerleşkesinde hizmet veren birimler 2023 yılı itibarıyla Milli İrade Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.

Etlik Ovacık Yerleşkesi



Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1480/2 Sokak Keçiören/ANKARA adresinde Keçiören Belediyesine ait 91845 ada 1 numaralı parsel (eski 90172 ada 1 parsel) de bulunan 3640 m² kapalı alanlı bina 10.04.2012 tarihli protokol ile Keçiören Belediyesince Üniversitemize tahsisi yapılmıştır. Binaya ilaveten 2013 yılında 1180 m² kapalı alanlı çelik bina yapılmıştır.

Toplamda 4820 m² kapalı alana sahip bina 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşmaktadır. Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Dış Hekimliği Hastanesi bu yerleşkemizde bulunmaktadır.

Dış Hekimliği Fakültesi ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası

Dış Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Araştırma Merkezi Binası Yapım İşinde % 71 oranında fiziki gerçekleşme olup, sözleşmesi feshedilmiştir.



Tuz Gölü Yerleşkesi

15 Mart 2018 tarihli ve 2018/11394 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde iken Üniversitemize bağlanan Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.01.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve 3843 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu 19.06.2018 tarihli protokol kapsamında Üniversitemize devredilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 30/12/2020 tarihli ve 2020/25/09 sayılı kararı ile Üniversitemiz Şereflikoçhisar Yerleşkesinin ismi, "Tuz Gölü Yerleşkesi" olarak değiştirilmiştir.



215 ada 11 parsel üzerinde bulunan bina Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu olarak kullanılmakta olup 1 bodrum 1 zemin ve 3 kattan oluşan 4800 m² kapalı alana sahiptir.



215 ada 12 parsel üzerinde bulunan bina Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak kullanılmakta olup 1 zemin ve 3 kattan oluşan 3900 m² kapalı alana sahiptir.



215 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan bina Şereflikoçhisar Uygulama Oteli olarak kullanılmakta olup 1 bodrum 1 zemin ve 1 kattan oluşan 1500 m² kapalı alana sahiptir.

Ankara Şehir Hastanesi



Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya/ANKARA adresinde; ortak kullanım protokolü gereğince Üniversite Hastanesi/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi

Yeni Batı Mah. 2026.Cad. Batıkent, Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunmakta olup, ortak kullanım protokolü imzalanmıştır.

1.6 Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme

Derslik ve Merkezi Birimler

- AYBÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası Yapım İşi



Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında yürütülen ve 2022 yılı yatırım programında 8.100.000,00 TL tutarlı proje olan Diş Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Araştırma Merkezi Binası Yapım İşi için imzalanan sözleşme feshedilmiştir.

Öğrenci Yaşam Merkezi

Öğrencilerimizin kültürel, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatına başlanılmış olup fiziki gerçekleşme oranı % 11,8 seviyesinde iken iş akdi 18.07.2022 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. Öğrenci Yaşam Merkezi Binasının tamamlanabilmesi için 2023 yılında yeniden ihaleye çıkılacak olup gerekli iş ve işlemler tamamlandıktan sonra 2024-2025 akademik yılına kadar inşaatın tamamlanarak kullanıma başlanması planlanmaktadır.



➤ Esenboğa Külliyesi

Esenboğa Külliyesi bina kapalı alanı toplamı 77.413,65 m², açık alan toplamı 1.985.645,66 m²'dir. Kapalı alanlar dört ayrı bina, bir ısı merkezi, kafe, spor merkezi/soyunma birimlerinden oluşmaktadır. Açık alanlar 2 adet futbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, 606 araçlık açık otopark ve sosyal alanlar, üniversite göleti, kamelyalar, muhtelif türde ağaçların bulunduğu yeşil alanlardan oluşmaktadır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 6000 ve 1750 kişilik olmak üzere iki etap halinde yurt inşaatları 2022-2023 akademik yılında kullanıma açılmıştır.

Külliye alanımızda 2021 yılı itibarıyla inşaatına başlanılan Külliye Giriş Kapısı ve Çevre düzenlenmesi işi tamamlanmıştır. Ayrıca 6.540 m² kapalı alana sahip olacak Camimizin inşaatı için temel kazısı yapılmış olup, inşaatı devam etmektedir.



➤ **Sağlık Bilimleri Ortak Derslik Binası**

AYBÜ Bilkent Yerleşkesi Sağlık Temel Bilimleri Fakültesi Ek Binası Yapım İşi kapsamında yatırım programında yer alan 30.000 m²' lik inşaatın henüz ruhsat işlemleri devam ettiğinden projeye başlanılamamıştır.

➤ **Çubuk Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi 3. Etap Yapım İşi**

Çubuk Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi 3. Etap Yapım İşi için 16.10.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış 08.10.2021 yer teslimi yapılmış olup, söz konusu işin kesin kabulü 2022 Şubat sonunda yapılmıştır.

Yayın Alımları

2022 yılında 2022H03-186343 numaralı Yayın Alımları Projesi ile Üniversitemiz kütüphaneleri ihtiyaçları doğrultusunda basılı yayın alımları ve yapımları ile elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları için harcanmıştır. 2022H03-186343 numaralı Yayın Alımları Projesi kapsamında alınan basılı ve elektronik kitaplar, abone olunan kitaplar ve süreli yayınlar ve basılı süreli yayınların sayısı ile birlikte Üniversitemiz kütüphane envanterinde yer alan toplam kaynak sayısı 1.316.874 adete ulaşmıştır.

Kampüs Altyapısı

2012H03-1584 numaralı Kampüs Altyapısı projesi kapsamında Esenboğa Külliyesi Ana Giriş Kapısı ve Çevre Düzenleme işleri yapılmış olup, Derslik ve Merkezi Birimler Projesine bağlı projelerin altyapı (Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı,Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı,Peyzaj, Su isale hattı,Telefon Hattı) giderleri için kullanılmaktadır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2022 yılı içerisinde 2022H03-186347 nolu projeden AYBÜ Esenboğa yerleşkesinde spor tesisleri için proje alımı yapılmıştır.

Muhtelif İşler

2022 yılında 2022H03-186352 nolu Muhtelif İşler Projesi, Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kullanılmakta olup, yıl içerisinde projeden aşağıda yer alan giderler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan Giderler	
Büro Mefruşatı Alımları	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
Okul Mefruşatı Alımları	Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri
Diğer Mefruşat Alımları	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları
Büro Makinaları Alımları	Diğer Fikri Hak Alımlar
Bilgisayar Alımları	Proje Giderleri
Tıbbi Cihaz Alımları	Sosyal Tesis Yapım Giderleri
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Diğer Avadanlık Alımları
Diğer Makine Teçhizat Alımları	

Girişimsel MR ve İnme Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi

2019K12-149072 proje nolu GİMİRİKAM projesine 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 2.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden yıl içerisinde fiili olarak harcama yapılmamış olup, projenin özel hesabına aktarılan tüm tutarlar harcama olarak yansıtılmıştır. Ayrıca proje 2022 yılı sonu itibarıyla kapanmış olup, 2023 yılı Yatırım Programı ile birlikte Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Alt Yapı projesine dönüştürülmüştür.


1.7 Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 45.507.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler, Muhtelif İşler ve Yayın Alımları Projelerine ödenek ihtiyacından dolayı 6.800.000 TL si ek bütçeden aktarılmak üzere toplam 34.300.000,00 TL ödenek ekleme yapılmış ve toplam ödeneğimiz 79.807.000,00 TL olmuştur. 2022 yılsonu itibarıyla projelerden yapılan toplam harcama 21.093.856,94 TL’ dir. Böylece başlangıç ödeneğine göre %46,35 toplam ödeneğe göre % 26,43 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

PROJE ADI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLEME	TOPLAM ÖDENEK	YILSONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI % (Toplam Ödenek)
EĞİTİM + DKH	45.507.000	34.300.000	79.807.000	21.093.857	26,43
EĞİTİM	45.505.000	34.300.000	79.805.000	21.091.857	26,43
Derslik ve Merkezi Birimler	30.000.000	26.000.000	56.000.000	2.254.418	4,03
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	142.000	242.000	241.900	99,96
Muhtelif İşler	12.000.000	8.174.000	20.174.000	15.211.765	75,40
Kampüs Alt Yapısı	1.205.000	-16.000	1.189.000	1.188.917	99,99
Yayın Alımı	2.200.000	-	2.200.000	2.194.857	99,77
DKH	2.000	-	2.000	2.000	100
GİMRİKAM	2.000	-	2.000	2.000	100

Tablo 3-Sektörel Bazda Harcama Oranları

*Toplam harcama e-bütçe ödenek durum masraf cetvelinden çekilmiş olup, Gimrikam projesinin özel hesabına aktarılan tutar harcama olarak alınmıştır.

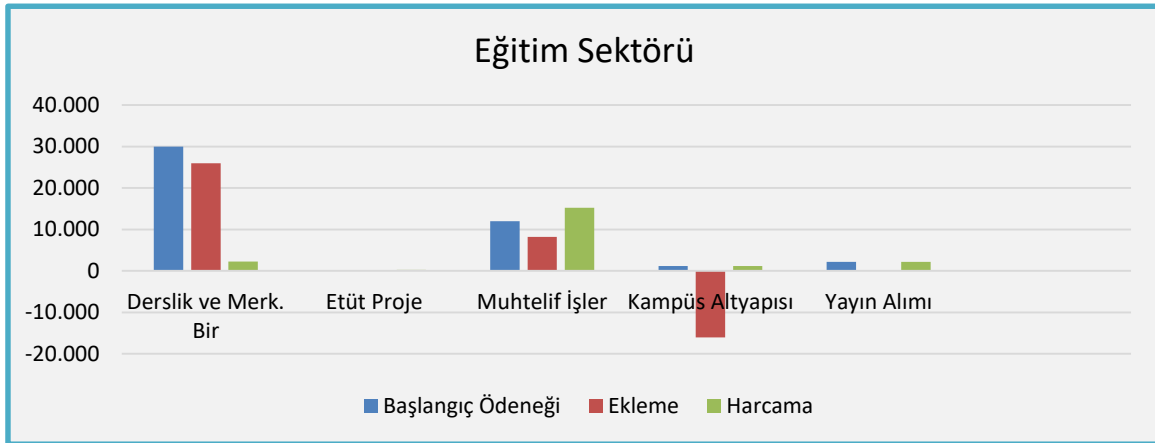

Grafik 1-Sektörel Bazda Harcama Oranları Grafiği

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım projelerinin ekonomik gider koda göre II. düzeyde dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eko. Kod	Açıklama	KBÖ	Yedek Ödenek	Eklenen	Toplam Ödenek	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	9.602.000	-	2.300.000	9.499.879	9.501.879
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	600.000		-	600.000	581.953
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	31.405.000		26.126.000	57.531.000	3.685.590
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.900.000	6.800.000	5.874.000	9.774.000	7.324.435
	TOPLAM	45.507.000	6.800.000	34.300.000	79.807.000	21.093.857

Tablo 4-Sermaye Giderleri Ekonomik Dağılım

*Toplam harcama e-bütçe ödenek durum masraf cetvelinden çekilmiş olup, Gimrikam projesinin özel hesabına aktarılan tutar harcama olarak alınmıştır.

2. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

1-2011H03-1424 Derslik ve Merkezi Birimler

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011H03-1424 nolu projeye 30.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2011-2024 yıllarını kapsayan projenin toplam tutarı 186.101.000,00 TL olup, yıl içerisinde projeye 26.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak toplam ödeneği 56.000.000,00 TL olmuştur. Yıl içerisinde projeden toplam 2.254.418,18 TL harcama yapılarak başlangıç ödeneğine göre % 7,51 toplam ödeneğe göre %4,02 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında izlenen Diş Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2022 yılında toplam proje tutarı 60.499.000,00 TL olup, projeye 2022 yılı yatırım programı ile 8.100.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde projede kullanılmak üzere, projenin geçmiş yıllardan devreden likit kaynaklarından 16.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

Yine Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında izlenen Öğrenci Yaşam Merkezi Projesinin 2022 yılında toplam proje tutarı 50.600.000,00 TL olup, proje inşaatı için 2022 yılı yatırım programı ile 21.898.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde projede kullanılmak üzere 10.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Toplamda 13.500 m² kapalı alana sahip Öğrenci Yaşam Merkezi içerisinde 500 kişilik konferans salonu, 12 adet kafe-restoran, 17 adet dükkân-mağaza, öğrenci ve personel yemekhanesi ile mutfak olan projenin çalışmaları için ikmal ihalesine çıkılacaktır.

Sektör:	EĞİTİM						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Derslik ve Merkezi Birimler						
Numarası:	2011H03-1424						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2011-2024						
Karakteristiği:	Sağ. Bil. Ort. Ders.(50.000 m ²), Diş Hek. Fak. Ve Tam. Tıp.Uyg. Araş. Mer. (18.958m ²),Öğrenci Yaşam Merkezi (13.500m ²)						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2011	186.101	30.000	26.000	-	56.000	2.254	4,03

2-2012H03-1584 Kampüs Alt Yapısı

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 1.205.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde projeye ek bütçe ile 126.000,00 TL eklenmiş olup düşmelerle birlikte toplam ödeneği 1.189.000,00TL olmuştur. Projeden 2022 yılında 1.188.917,58 TL harcama yapılarak başlangıç ödeneğine göre %98,66 toplam ödeneğe göre % 99,99 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Kampüs Alt Yapısı						
Numarası:	2012H03-1584						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2022						
Karakteristiği:	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı,Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı,Peyzaj, Su isale hattı,Telefon Hattı						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2012	18.100	1.205	126.000	142.000	1.189	1.188	99,99

2.2 Etüt Projeler

1-2022H03-186347 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeye yıl içerisinde 142.000,00 TL aktararak toplam ödeneği 242.000,00 TL olmuştur. Projeden 2022 yılında 241.900.00 TL tutarında harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre % 241,90 toplam ödeneğe göre % 99,59 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi						
Numarası:	2022H03-186347						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2022-2022						
Karakteristiği:	Etüd-Proje ve Müşavirlik						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2022	100	100	142	-	242	241	99,96

2.3 Yeni Projeler

2.3.1 -2022H03-186343 Yayın Alımı

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 2.200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2022 yılı içerisinde basılı ve elektronik yayın alımları için 2.194.856,63 TL harcama yapılmış ve % 99,77 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Yayın Alımı						
Numarası:	2022H03-186343						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2022-2022						
Karakteristiği:	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2022	2.200	2.200	-	-	2.200	2.194	99,77

2.3.2 -2022H03-186352 Muhtelif İşler

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Muhtelif İşler Projesi kapsamında Üniversitemize tahsis edilen 12.000.000,00 TL ödenek, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın bakım-onarım, yapım, mal alım ve gayri maddi hak alım ödemelerinde kullanılmıştır.

Yıl içerisinde projeye 1.500.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş olup, ek bütçe ile 6.674.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Proje bütçesine ekleme ile birlikte toplam ödenek 20.174.000,00TL olmuştur. Projeden 15.211.764,55 TL harcama yapılarak başlangıç ödeneğine göre %126,76 toplam ödeneğe göre % 75,40 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Muhtelif İşler						
Numarası:	2022H03-186352						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2022-2022						
Karakteristiği:	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2022	12.000	12.000	8.174	-	20.174	15.211	75,40

2.3.2.2 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2022H03-186352					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2022	4.200	1.500	-	5.700	3.648	64

2022 yılında Muhtelif İşler Projesinin 4.200.000,00 TL' lik kısmı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. Projeye yıl içerisinde 500.000,00 TL likit karşılığı ödenek ve ek bütçe ile 1.000.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Projeden 3.648.165,35 TL tutarında harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre % 86,86 toplam ödeneğe göre % 64 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Alınan Malzemeler	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	1.254.206,96
Okul Mefruşatı Alımları	777.835,10
Diğer Mefruşat Alımları	260.538,96
Büro Makinaları Alımları	454.112,95
Bilgisayar Alımları	40.828,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	860.643,38
Toplam	3.648.165,35

2.3.2.3 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2022 yılında Muhtelif İşler projesinin 3.518.000,00 TL' lik kısmının 3.000.000,00 TL' si "Mamul Mal Alımları" , 518.000,00 TL' ise "Gayri Maddi Hak Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. Projeye yıl içerisinde "Mamul Mal Alımları" harcamalarında kullanılmak üzere 500.000 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş olup "Gayri Maddi Hak Alımları" bütçesinden 2.800,00 TL düşülmüştür. Projeden yıl içerisinde toplamda 3.655.114,33 TL tutarında harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre % 103,90, toplam ödeneğe göre % 91,03 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Proje Numarası	2022H03-186352					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2022	3.518	500	2,8	4.015	3.655	91,03

Muhtelif İşler projesi kapsamında mal alımları gider kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Malzemeler	Miktar
Diğer Makine Teçhizat Alımları	3.157.090,00
Toplam	3.157.090,00

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden Yazılım Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Malzemeler	Miktar
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	498.024,33
Toplam	498.024,33

2.3.2.4 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2022H03-186352					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2022	4.205	7.600	1.426	10.379	7.830	75,44

2022 yılında Muhtelif İşler projesinin 4.205.000,00 TL' lik kısmı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine ayrılmış olup, Yıl içerisinde projeye toplamda 500.000,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi ve 5.674.000,00 TL ek bütçe ile toplam bütçesi 10.379.000,00 TL olmuştur.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’ nın “Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri” bütçesi için 9.774.000,00 TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için 100.000,00 TL, Gayri Maddi Hak Alımları bütçesi için 5.000,00 TL, “Mamul Mal Alımları” bütçesi için 500.000,00 TL ayrılmıştır. Projeden 7.829.555,85 TL tutarında harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre % 186,20 toplam ödeneğe göre % 75,44 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Mamul Mal Alım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	352,23
Diğer Mefruşat Alımları	36.698,70
İş yeri Makine Teçhizat Alımları	15.367,14
Diğer Makine Teçhizat Alımları	157.372,86
Diğer Avadanlık Alımları	277.614,90
Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderler	12.361,39
Toplam	499.767,22

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	5.000,00
Toplam	5.000,00

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	360.112,40
Diğer Müteahhitlik Giderleri	6.517.692,23
Hizmet Binası Büyük Onarım	446.630,00
Toplam	7.324.434,63

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Diğer Müteahhitlik Giderleri	354,00
Toplam	354,00

2.3.2.5 Personel Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2022H03-186352					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2022	22	2,80	-	24,80	24,78	99,92

2022 yılında Muhtelif İşler projesinin, 22.000,00 TL’lik kısmı Personel Daire Başkanlığının “Gayri Maddi Hak Alımları” bütçesine ayrılmış olup, projeye 2.800,00 TL ödenek aktarılmış ve toplam ödenek 24.800,00 TL olmuştur. Projeden yıl içerisinde 24.780,00 TL harcama yapılarak başlangıç ödenegine göre % 112,64, toplam ödenegine göre % 99,92 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan İş	Miktar
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	24.780,00
Toplam	24.780,00

2.3.2.6 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2022H03-186352					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2022	40	-	-	40	40	99,68

2022 yılında Muhtelif İşler projesinin, 40.000,00 TL’lik kısmı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının “Gayri Maddi Hak Alımları” bütçesine ayrılmış olup, projeden yıl içinde 39.871,02 TL tutarında harcama yapılmıştır. Başlangıç ödenegine göre % 99,68 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan İş	Miktar
Diğer Fikri Hak Alımları	39.871,02
Toplam	39.871,02

2.3.2.7 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2022H03-186352					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2022	15	-	-	15	14	95,19

2022 yılında muhtelif işler projesinin, 15.000,00 TL’lik kısmı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının “Gayri Maddi Hak Alımları” bütçesine ayrılmış olup, projeden yıl içinde 14.278,00 TL tutarında harcama yapılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre % 95,19 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan İş	Miktar
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	14.278,00
Toplam	14.278,00

3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER

- Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sâri projelerin hakediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle ödeme sürecinde sıkıntı yaşanmaktadır.
- Yıllık AFP (Ayrıntılı Finansman Programı) vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- Yıl içerisinde projelere Üniversite kaynaklarından yapılacak olan ödenek ekleme işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı iznine tabi olması sebebiyle iş ve işlemlerde gecikmeler yaşanmaktadır.
- AFP (Ayrıntılı Finansman Programı) ile ödeneklerin aylık olarak serbest bırakılması var olan hakediş ödemeleri ve bunun gibi ödemelerde aksaklığa sebep olabilmektedir.
- İhale sürecinin uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.

2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2022 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödenek			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		218.501			157.481			45.505			34.300			21.091
Sağlık															
Diğer Kamu Hiz.	1		22.350			3,4			2			-			2
TOPLAM			240.851			157.484			45.507			34.300			21.093
