



ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

2024 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
MART 2025

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	4
1.GENEL DEĞERLENDİRME.....	5
1.1 Misyon.....	5
1.2 Vizyon	5
1.3 Amaç ve Hedefler.....	6
1.3.1 İdarenin Amaç ve Hedefleri	6
1.4 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	7
1.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	8
1.6 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme.....	16
1.7 Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları	19
2. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI	22
2.1 Devam Eden Projeler.....	22
2.1.1-2011H03-1424 Derslik ve Merkezi Birimler	22
2.1.2-2012H03-1584 Kampüs Altyapısı.....	23
2.1.3- 2023K12-214308 Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı Projesi	23
2.2 Etüt Projeler.....	24
2.2.1- 2024H03-233647 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	24
2.3 Yeni Projeler.....	24
2.3.1 - 2024H03-233651 Yayın Alımı	24
2.3.2 -2024H03-233649 Muhtelif İşler	25
2.3.3 -2024I00-228260 Muhtelif İşler (Sağlık)	30
3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER	31

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: 2024 Yılı Yatırımlarının Finansman Kaynakları (Bin TL bazında).....	7
Tablo 2: Kapalı Alan	8
Tablo 3: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Gerçekleşen Giderler.....	18
Tablo 4: Sektörel Bazda Harcama Oranları.....	19
Tablo 5: Sermaye Giderleri Ekonomik Dağılım	20
Tablo 6: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Bilgileri.....	22
Tablo 7: Kampüs Altyapısı Proje Bilgileri	23
Tablo 8: Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı Proje Bilgileri	23
Tablo 9: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Bilgileri.....	24
Tablo 10: Yayın Alımları Proje Bilgileri.....	24
Tablo 11: Muhtelif İşler Proje Bilgileri.....	25
Tablo 12: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Proje Bilgileri	26
Tablo 13: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Harcama Detayları	26
Tablo 14: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Proje Bilgileri	27
Tablo 15: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Harcama Detayları.....	27
Tablo 16: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Proje Bilgileri	28
Tablo 17: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Harcama Detayları	28
Tablo 18: Personel Daire Başkanlığı Proje Bilgileri	29
Tablo 19: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Proje Bilgileri.....	29
Tablo 20: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Proje Bilgileri.....	29
Tablo 21: Muhtelif İşler(Sağlık) Proje Bilgileri	30
Tablo 22: Muhtelif İşler(Sağlık) Harcama Detayları	30

Grafik Listesi

Grafik 1: Eğitim Sektörü Gerçekleşmeleri	21
Grafik 2: DKH Sektörü Gerçekleşmeleri	21
Grafik 3: Sağlık Sektörü Gerçekleşmeleri.....	21

SUNUŞ



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bilimsel veriler ışığında çağımızın ihtiyacına cevap veren araştırma faaliyetleri ile bilim ve teknolojiye katkıda bulunacak, donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla ülkemizin 97. ve başkentimiz Ankara'nın 5. devlet üniversitesi olarak kurulmuştur.

Bünyesinde bulunan 15 fakülte, 5 enstitü, 4 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 1 yüksekokulu ve uygulama ve araştırma merkezleri ile ülkemize ve insanlığa hizmet edecek, bilimin ve insanlığın geleceğine yön verecek, güncel

sorunlara duyarlı, ülkemize ve topluma yol gösteren bir üniversite olma hedefini merkeze koymuş olan bir üniversitedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış ve bu raporlar sayesinde idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanun'un 25'inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin "2024 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu" hazırlanmış olup saygılarımla kamuoyuna sunarım.

Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

2020-2024 Dönemi Üniversitemiz Stratejik Planı 2024 yılı sonu itibariyle uygulama dönemini tamamlayıp, plan dönemini kapsayan misyon ve vizyon aşağıda gösterilmiştir.

2025-2029 Dönemi Stratejik Planı ise 2025 yılı Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Plan dönemini kapsayan misyon ve vizyona ise 2025 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda yer verilecektir.

1.1 Misyon

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Evrensel değerler ışığında verdiği nitelikli eğitimle bilim, kültür, spor ve sanat alanlarında sorgulamaya açık, ahlaki değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; yaptığı araştırmalar ile bilgi ve teknoloji üretmek toplum yararına sunmayı; sahip olduğu girişimcilik ruhuyla ürettiği bilgi ve teknoloji ekseninde insanlık için fayda üretmeyi; hissettiği sosyal sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası düzeyde beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunmayı misyonu olarak benimser.

1.2 Vizyon

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Sunduğu eğitim-öğretim ile iyi bir gelecek inşasına katkı sağlayan, ilim geleneğimizin engin birikimini günümüze taşımayı başaran, araştırma ve projeleriyle insanlık adına faydalar üreten, uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış, akademik, idari ve mali özerkliğe sahip bir üniversite olmayı vizyonu olarak benimser.

1.3 Amaç ve Hedefler

2020-2024 Dönemi Üniversitemiz Stratejik Planı 2024 yılı sonu itibariyle uygulama dönemini tamamlayıp yine aşağıda bu dönem Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere yer verilmiştir.

1.3.1 İdarenin Amaç ve Hedefleri

✓ AMAÇ 1: Nitelikli, Rekabetçi ve Yenilikçi Mezunlar Yetiştirmek

Hedef 1.1: Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek

Hedef 1.2: Lisans programlarının kontenjanlarında yüksek doluluk oranına sahip olmak

Hedef 1.3: En yüksek yüzdelik dilimden öğrencilere sahip olmak

Hedef 1.4: Yabancı dilde nitelikli eğitim vermek ve uluslararası öğrenci sayısını artırmak

Hedef 1.5: Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak

✓ AMAÇ 2: Araştırma Amaçlı Bilimsel Faaliyetleri Artırmak

Hedef 2.1: Bilimsel araştırma projeleri desteklerinin ve sayısının artırılması

Hedef 2.2: Ulusal ve uluslararası sıralama endekslerinde yer almak ve üst sıralara yerleşmek

✓ AMAÇ 3: İnovasyon Amaçlı Bilimsel Çalışmaları ve Girişimcilik Faaliyetleri Artırmak

Hedef 3.1: Üniversite genelinde girişimciliği kurumsallaştırmak, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında yer almak için altyapı oluşturmak.

Hedef 3.2: Araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmak

Hedef 3.3: Girişimcilik faaliyetlerini artırmak

✓ AMAÇ 4: Kamu İdareleri, Özel Kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleriyle İşbirliğine Girerek Toplumsal Sorumluluk Projelerine Katkıda Bulunmak

Hedef 4.1: AYBÜ mensubu öğretim elemanları ve idari personel ile öğrencilerinin toplumsal sorumluluk faaliyetlerinde aktif yer almalarını sağlayacak sistem ve süreçler geliştirmek ve teşviklerde bulunmak

✓ AMAÇ 5: Üniversitenin Eğitim, Araştırma, Toplumsal Sorumluluk ve Girişimcilik Stratejileri İle Uyumlu ve Onları Destekleyici Fiziki Altyapıyı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek

Hedef 5.1: Fiziksel altyapıyı geliştirmek

Hedef 5.2: Kütüphane hizmetlerinin yeterliliğini sağlamak

Hedef 5.3: İnsan kaynaklarını geliştirmek

Hedef 5.4: Kurumsal kalite ve strateji çalışmalarını geliştirmek

Hedef 5.5: Kurumsal gelişimde katılımcı bir üniversite olma

1.4 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na ekli II sayılı cetvelde yer alan Üniversitemize 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile aşağıda belirtilen mevcut projeler için 197.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenekten aktarılacak suretiyle 100.000.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneği ve projelerin geçmiş yıl ödeneklerinden 136.500.000 TL ilave eklenmiştir.

Ayrıca 17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında yatırım projelerinden 16.461.000,00 TL kesinti yapılmış olup 2024 yılında projelerimiz toplam ödeneği 417.539.000,00 TL olmuştur.

Tablo 1: 2024 Yılı Yatırımlarının Finansman Kaynakları (Bin TL bazında)

Proje No	Proje Adı	Hazine Yardımı	Yedek Ödenek	Ekleme/ Aktarma (-,+)	Tasarruf Kesintisi	Toplam
2011H03-1424	Derslik ve Merkezi Birimler	130.001	100.000	126.500	13.000	343.501
2024H03-233647	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500	-	1.450	50	1.900
2024H03-233649	Muhtelif İşler	26.110	-	12.000	2.611	35.499
2012H03-1584	Kampüs Alt Yapısı	8.000	-	-3.450	800	3.750
2024H03-233651	Yayın Alımı	5.889	-	-	-	5.889
2024I00-228260	Muhtelif İşler (Sağlık)	7.000	-	-	-	7.000
2023K12-214308	Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı	20.000	-	-	-	20.000
TOPLAM		197.500	100.000	136.500	16.461	417.539

1.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi fiziksel yapı durumları tabloda gösterilmiş olup, var olan fiziki yapı ve inşaatı devam eden alanlarla ilgili olarak gerekli açıklamalara da aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 2: Kapalı Alan

Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (m ²)	Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (m ²)
Esenboğa Külliyesi	78.473,65	Varlık Yerleşkesi	5.248,00
Bilkent Yerleşkesi	11.536,00	Esenboğa Ek Hizmet Binası	2.390,00
Çubuk Yerleşkesi	18.645,00	Milli İrade Yerleşkesi	29.847,00
Cinnah Yerleşkesi	10.372,43	15 Temmuz Şehitleri Yerleşkesi	44.577,74
Etlik Ovacık Yerleşkesi	4.820,00	Tuz Gölü Yerleşkesi	10.200,00
TOPLAM (m ²)		216.109,82	

Esenboğa Külliyesi



Esenboğa Külliyesi 1. etap bina kapalı alanı toplamı 78.473,65 m² dir. Kapalı alanlar dört ayrı eğitim binası, bir ısı merkezi, kafe, spor merkezi ve soyunma odalarından oluşmaktadır. Açık alanlar futbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, 606 araçlık açık otopark ve sosyal alanlar, üniversite göleti, kamelyalar, muhtelif türde ağaçların bulunduğu yeşil alanlardan oluşmaktadır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi sınırları içinde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından iki etap halinde yurt inşaatları tamamlanmış olup 2022-2023 eğitim öğretim döneminde kullanıma açılmıştır. Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Öğrenci Yaşam Merkezi inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Esenboğa Külliye Yerleşkesinde; Rektörlük, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine devam etmektedir.

Çubuk Yerleşkesi

Yerleşkemizdeki yapıların toplam kapalı alanı 18.645 m² olup, Halk Sağlığı Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ekolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile sosyal etkinlik alanları bulunmaktadır. Yerleşkede okçuluk ve binicilik faaliyetleri de yapılmaktadır.



Esenboğa Ek Hizmet Binası



Bina 1 bodrum, 1 zemin, 2 normal kat olmak üzere toplamda 4 kattan oluşmakta olup toplam kapalı alanı 2.390 m²'dir. Bina Teknoloji Geliştirme Bölgesi idari hizmetleri için kullanılmaktadır.

15 Temmuz Şehitleri Yerleşkesi



Yerleşke 44.577,74 m² kapalı alana sahip olup Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine bu yerleşkede devam etmektedir.

Milli İrade Yerleşkesi



Bina 29.847 m²'lik kapalı alana sahip olup Rektörlük ve İdari Birimler, hazırlık eğitimi veren Yabancı Diller Yüksekokulu ile Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji Transfer Ofisi, İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Öğrenme ve Öğretme Birimi faaliyetlerine bu yerleşkede devam etmektedir.

Varlık Yerleşkesi

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesini de kapsayan 200.737 m² alanlı imarın 63805 ada 8 numaralı parseli Ankara Valiliği'nin 05.03.2015 tarih ve 16425 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsisi gerçekleştirilmiştir. Hidrojen Teknolojileri ve Enerji Uygulamaları Araştırma Merkezi de bu yerleşkemizde hizmet vermektedir.

Merkez Araştırma Laboratuvarı Binası



5.248 m² kapalı alana sahip 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşan binada Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmetlerini sürdürmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası



Diş Hekimliği Fakültesi ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası yapım işinde % 69 oranında fiziki gerçekleşme mevcut olup 2026 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Bilkent Yerleşkesi



Bina 1 bodrum, zemin ve 3 kattan oluşup 11.536 m² toplam kapalı alana sahiptir. Tıp Fakültesi Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası 2014-2015 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencileri öğrenimlerine bu binada devam etmektedir. Ayrıca Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Endokrinoloji ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezi, İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezi de bu yerleşkede hizmet vermektedir.

Cinnah Yerleşkesi



Bina 1 bodrum,1 zemin, 6 normal kat ve teras kattan oluşmakta olup 5.651,42 m² kapalı alana sahiptir. Yine 4433 ada 10 numaralı parsel üzerindeki bina 1 bodrum, 1 zemin, 4 normal kattan oluşmakta olup 1.992,01 m² kapalı alana sahiptir ve bu iki binanın toplam kapalı alanı 7.643,43 m²'dir.

Bu binalarda Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Rekabet ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlaması ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.



İdari ofisler ve derslik olarak kullanılan bina 2 bodrum, 5 normal kat ve teras kattan oluşmakta olup toplamda 2.729 m² kapalı alana sahiptir. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerimiz burada eğitim görmektedir.

Etlik Ovacık Yerleşkesi



Bina 4.820 m² kapalı alana sahip olup, bina 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşmaktadır. Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bu yerleşkemizde bulunmaktadır.

Tuz Gölü Yerleşkesi

Yerleşkede Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.



Bina 1 bodrum, 1 zemin ve 3 kattan oluşan 4.800 m² kapalı alana sahiptir.



Bina 1 zemin ve 3 kattan oluşan 3.900 m² kapalı alana sahiptir.



Bina 1 bodrum, 1 zemin ve 1 kattan oluşan 1.500 m² kapalı alana sahiptir.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya/ANKARA adresinde; ortak kullanım protokolü kapsamında Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde hizmet vermektedir.

Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Batı Mah. 2026. Cad. Batıkent, Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunmakta olup, ortak kullanım protokolü kapsamında hizmet vermektedir.

1.6 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

➤ AYBÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası Yapım İşi

Derslik ve Merkezi Birimler ana projesi altında yürütülen AYBÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası Yapım İşinde; % 69 fiziki gerçekleştirme oranına sahip iken sözleşme 20.06.2022 tarihinde feshedilmiştir.

Projenin tamamlama ihalesine 24.09.2024 tarihinde çıkmış olup 2026 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır.



➤ Öğrenci Yaşam Merkezi

Derslik ve Merkezi Birimler ana projesi altında yürütülen, öğrencilerimizin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Öğrenci Yaşam Merkezi Projesi inşaatına başlanılmış olup fiziki gerçekleşme oranı %11,8 seviyesinde iken iş akdi 18.07.2022 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. Öğrenci Yaşam Merkezi Binasının tamamlanabilmesi için 30.11.2023 yılında yeniden ihaleye çıkılmış olup yatırım programı çerçevesinde proje tamamlanacaktır.



➤ Merkezi Derslik

22.000 m²'lik inşaat için 2018 yılında yatırım programına alınan proje, yatırım programında iz bedel olarak yer almış ve programa girişinden buyana herhangi bir yapım işine başlanılamamıştır. 2025 yılı yatırım programı ile proje tutarı 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup 2025 yılı içerisinde etüt-proje çalışmaları tamamlanacaktır.

YAYIN ALIMLARI

2024 yılında 2024H03-233651 nolu Yayın Alımları projesi kapsamında Üniversitemiz kütüphanelerinin elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmıştır. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Üniversitemize devredilen 746.500 basılı yabancı dergi ve Türkiye adresli süreli yayınlar 31/05/2024 tarihli resmi yazı ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne devredilmiştir.

2024H03-233651 numaralı Yayın Alımları Projesi kapsamında alınan basılı ve elektronik kitaplar, abone olunan kitaplar, süreli yayınlar, basılı süreli yayınlar ve abone olunan veri tabanı içindeki kaynakların sayısı ve bahsedilen devir ile birlikte Üniversitemiz kütüphane envanterinde yer alan toplam kaynak sayısı 6.046.403'tür.

KAMPÜS ALTYAPISI

2012H03-1584 numaralı Kampüs Altyapısı projesi kapsamında çevre düzenleme (peyzaj) işleri yapılmış olup, Esenboğa Yerleşkesi iç avlu sismik tarama ve kazı, sınıflarda soğutma sistemi yapılması, çit yapılması, çitlerin taşınması ve montajı yapılması için kullanılmıştır.

ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

2024 yılı içerisinde 2024H03-233647 nolu projeden AYBÜ Varlık Yerleşkesi zemin etütü ve raporlama hizmeti, 2025 yıl içerisinde yapım aşamasına geçilecek olan Esenboğa Külliyesi 800 KVA'lık "Güneş Enerji Santrali" projesi için hizmet alımları yapılmıştır.

MUHTELİF İŞLER

2024 yılında 2024H03-233649 nolu Muhtelif İşler projesi, Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kullanılmakta olup, yıl içerisinde projeden aşağıda yer alan giderler gerçekleştirilmiştir.

Tablo 3: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Gerçekleşen Giderler

Yapılan Giderler	
Bilgisayar Alımları	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları
Büro Makineleri Alımları	İşyeri Makine Teçhizat Alımları
Tıbbi Cihaz Alımları	Diğer Makine Teçhizat Alımları
Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	Atölye Gereçleri Alımları
İşyeri Mefruşatı Alımları	Zirai Gereç Alımları
Büro Mefruşatı Alımları	Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Diğer Müteahhitlik Giderleri	Malzeme Giderleri
Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları
Tamir Bakım Aleti Alımları	Gayri Maddi Hak Alımları

MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İLAVE ALTYAPI PROJESİ

2024 yılında 2023K12-214308 proje nolu Merkez Araştırma Laboratuvarı ilave altyapı projesi kapsamında, Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop Sistemi, X-Işını Difraktometre Cihazı Alımı, Atomik Kuvvet Mikroskobu Güncellemesi ve ilan ödemesi yapılmıştır.

1.7 Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları

7849 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 197.500.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Öğrenci Yaşam Merkezi projesine ödenek ihtiyacı sebebiyle 100.000.000,00 TL yedek ödenek aktarılmış ve 126.500.000,00 TL geçmiş yıl ödeneklerinden eklenmiştir. Yine ödenek ihtiyacı sebebiyle Muhtelif İşler projesine 9.000.000,00 TL ve Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 1.000.000,00 TL geçmiş yıl ödeneklerinden eklenmiştir.

17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında yatırım projelerinden 16.461.000,00 TL kesinti yapılmış olup 2024 yılında projelerimiz toplam ödeneği 417.539.000,00 TL olmuştur. 2024 yıl sonu itibariyle projelerden yapılan toplam harcama 273.650.863,00 TL dir. Böylece başlangıç ödeneğine göre % 138,56 toplam ödeneğe göre ise % 65,54 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 4: Sektörel Bazda Harcama Oranları

PROJE ADI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	EKLEME	AKTARMA	DÜŞÜLEN	KEŞİNTİ	TOPLAM ÖDENEK	YILSONU HARCAMA	GERÇ ORANI % (Toplam Ödenek)
EĞİTİM/SAĞLIK/DKH	197.500.000	236.500.000	3.450.000	3.450.000	16.461.000	417.539.000	273.650.863	65,54
EĞİTİM	170.500.000	236.500.000	3.450.000	3.450.000	16.461.000	390.539.000	249.376.207	63,85
Derslik ve Merkezi Birimler	130.001.000	226.500.000	-	-	13.000.000	343.501.000	202.892.301	59,07
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500.000	1.000.000	450.000	-	50.000	1.900.000	1.878.000	98,84
Muhtelif İşler	26.110.000	9.000.000	3.000.000	-	2.611.000	35.499.000	35.153.074	99,03
Kampüs Alt Yapısı	8.000.000	-	-	3.450.000	800.000	3.750.000	3.567.840	95,14
Yayın Alımı	5.889.000	-	-	-	-	5.889.000	5.884.992	99,93
SAĞLIK	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	4.274.656	61,07
Muhtelif İşler	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	4.274.656	61,07
DKH	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	100
Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	100

*Toplam harcama e-bütçe ödenek durum masraf cetvelinden çekilmiş olup, Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı projesinin 2024 yılı bütçesinden özel hesabına aktarılan tutar harcama olarak alınmıştır.

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım projelerinin ekonomik sınıflandırmaya göre II. düzey dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Tablo 5: Sermaye Giderleri Ekonomik Dağılım

Sektör/ Proje	Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ	Eklenen/ Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
EĞİTİM						
Derslik ve Merkezi Birimler	06.05	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	130.001.000	213.500.000	343.501.000	202.892.301
Kampüs Altyapısı	06.05	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	8.000.000	-4.250.000	3.750.000	3.567.840
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	06.05	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	500.000	1.400.000	1.900.000	1.878.000
Yayın Alımları	06.01	Mamul Mal Alımları	5.889.000	-	5.889.000	5.884.992
Muhtelif İşler Projesi	06.1	Mamul Mal Alımları	14.250.000	3.689.000	17.939.000	17.883.774
	06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	4.610.000	-1.300.000	3.310.000	3.102.846
	06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.250.000	-	1.250.000	1.169.743
	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.000.000	7.000.000	13.000.000	12.996.711
SAĞLIK						
Muhtelif İşler Projesi	06.1	Mamul Mal Alımları	5.000.000	2.000.000	7.000.000	4.274.656
	06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000	-2.000.000	-	-
DİĞER KAMU HİZMETLERİ						
Merkez Laboratuvarı İlave Altyapı Projesi	06.01	Mamul Mal Alımları	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000
TOPLAM			197.500.000	220.039.000	417.539.000	273.650.863

*Toplam harcama e-bütçe ödenek durum masraf cetvelinden çekilmiş olup, Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı projesinin 2024 yılı bütçesinden özel hesabına aktarılan tutar harcama olarak alınmıştır.

Yatırım Projelerinin sektörlere göre ödenek durumları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

Grafik 1: Eğitim Sektörü Gerçekleşmeleri

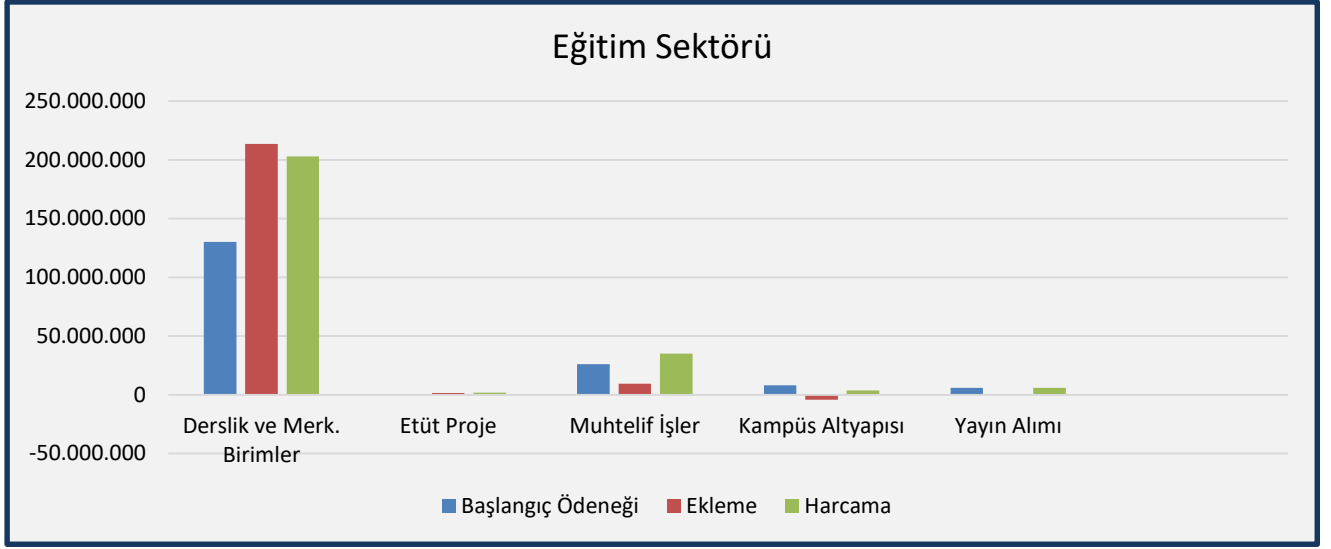

Grafik 2: DKH Sektörü Gerçekleşmeleri



Grafik 3: Sağlık Sektörü Gerçekleşmeleri



2. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1-2011H03-1424 Derslik ve Merkezi Birimler

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011H03-1424 nolu projeye 130.001.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2011-2026 yıllarını kapsayan projenin toplam tutarı 880.000.000,00 TL dir. 17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında proje ödeneğinden 13.000.000 TL kesinti yapılmıştır. Projeye 126.500.000,00 TL geçmiş yıl ödeneklerinden, 100.000.000,00 TL yedek ödenekten (YHÖ) eklenmiş olup projenin 2024 yılı toplam ödeneği 343.501.000,00 TL olmuştur. Projeden yıl içerisinde 202.892.301,51 TL harcama yapılmıştır. Projenin Diş. Hek. Fak. ve Tam. Tıp Uyg. Arş. Merkezi Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi ve Merkezi Derslik Binası olmak üzere 3 alt projesi bulunmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında izlenen Diş Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2024 yılında toplam proje tutarı 200.000.000,00 TL olup, projeye 2024 yılı yatırım programı ile 70.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında projeden 7.000.000,00 TL kesinti yapılmış ve toplam ödeneği 63.000.000,00 TL olmuştur. 24/09/2024 tarihinde tamamlama ihalesine çıkılarak 11.810.755,33 TL harcama yapılmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında izlenen Öğrenci Yaşam Merkezi Projesinin 2024 yılında toplam proje tutarı 605.000.000,00 TL olup, proje inşaatı için 2024 yılı yatırım programı ile 60.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Projeden 6.000.000,00 TL kesinti yapılmıştır. Projeye 100.000.000,00 TL yedek ödenek ve 126.500.000,00 TL geçmiş yıl ödeneklerinden ilave ekleme yapılarak toplam ödeneği 280.500.000,00 TL olmuştur. 2024 yılı içerisinde 191.081.546,18 TL harcama yapılmıştır.

2024 yılı yatırım programı ile toplam proje tutarı 75.000.000 TL olan Merkezi Derslik Binası yapım işinin 2025 yılında proje ihalesine çıkılacaktır.

Tablo 6: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Bilgileri

Sektör:	EĞİTİM						(Bin TL Bazında)
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Derslik ve Merkezi Birimler						
Numarası:	2011H03-1424						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2011-2026						
Karakteristiği:	Merkezi Ders.(22.000 m ²), Diş Hek. Fak. Ve Tam. Tıp.Uyg. Araş. Mer. (18.958m ²),Öğrenci Yaşam Merkezi (13.500m ²)						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklene	Düşülen			
2011	880.000	130.001	226.500	13.000	343.501	202.892	59,07

2.1.2-2012H03-1584 Kampüs Altyapısı

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2012H03-1584 nolu projeye 8.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında projeden 800.000,00 TL kesinti yapılmıştır. Projeden 3.000.000,00 TL Muhtelif İşler Projesine, 450.000,00 TL ise Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine aktarılmıştır. Böylelikle projenin 2024 yılı ödeneği 3.750.000,00 TL olmuştur. Projeden 2024 yılında 3.567.840,00 TL harcama yapılarak başlangıç ödeneğine göre % 44,60 toplam ödeneğe göre % 95,14 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 7: Kampüs Altyapısı Proje Bilgileri

Sektör:	EĞİTİM						(Bin TL Bazında)
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Kampüs Altyapısı						
Numarası:	2012H03-1584						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2025						
Karakteristiği:	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2012	48.160	8.000	-	4.250	3.750	3.567	95,14

2.1.3- 2023K12-214308 Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı Projesi

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2023K12-214308 nolu projeye 20.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bütçenin tamamı özel hesaba aktarılmış olup aktarılan tüm tutar harcama olarak gösterilmiştir.

Tablo 8: Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı Proje Bilgileri

Sektör:	DİĞER KAMU HİZMETLERİ (DKH)					(Bin TL Bazında)	
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Merkez Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı Projesi						
Numarası:	2023K12-214308						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2023-2024						
Karakteristiği:	Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2023	47.284	20.000	-	-	20.000	20.000	100

2.2 Etüt Projeler

2.2.1- 2024H03-233647 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında projeden 50.000,00 TL kesinti yapılmıştır. Projeye 450.000,00 TL aktarma ve 1.000.000,00 TL geçmiş yıl ödeneklerinden ekleme yapılarak projenin 2024 yılı toplam ödeneği 1.900.000,00 TL olmuştur. Projeden 2024 yılında 1.878.000,00 TL tutarında harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre % 375,60, toplam ödeneğe göre % 98,84 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 9: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Bilgileri

Sektör:	EĞİTİM (Bin TL Bazında)						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi						
Numarası:	2024H03-233647						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2024-2024						
Karakteristiği:	Etüd-Proje ve Müşavirlik						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2024	500	500	1.450	50	1.900	1.878	98,84

2.3 Yeni Projeler

2.3.1 - 2024H03-233651 Yayın Alımı

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 5.889.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2024 yılı içerisinde yayın alımları için 5.884.992,29 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneğe göre % 99,93 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 10: Yayın Alımları Proje Bilgileri

Sektör:	EĞİTİM (Bin TL Bazında)						
Proje Sahibi Kurum	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Yayın Alımı						
Numarası:	2024H03-233651						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş	2024-2024						
Karakteristiği:	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2024	5.889	5.889	-	-	5.889	5.884	99,93

2.3.2 -2024H03-233649 Muhtelif İşler

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Muhtelif İşler Projesi kapsamında Üniversitemize 26.110.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem, Personel, Kütüphane ve Dokümantasyon, İdari ve Mali İşler ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları bakım-onarım, yapım, mal alım ve gayri maddi hak alım ödemelerinde kullanılmıştır.

17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında projeden 2.611.000,00 TL kesinti yapılmıştır. Yıl içerisinde projeye geçmiş yıl ödeneklerinden 9.000.000,00 TL eklenmiş olup, kampüs altyapı projesinden 3.000.000,00 TL aktarılmış ve proje bütçesi toplamı 35.499.000,00 TL olmuştur. Projeden 35.153.074,13 TL harcama yapılarak başlangıç ödeneğine göre % 134,63 toplam ödeneğe göre ise % 99,03 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 11: Muhtelif İşler Proje Bilgileri

Sektör:	EĞİTİM							(Bin TL Bazında)
Proje Sahibi	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ							
Projenin;								
Adı:	Muhtelif İşler							
Numarası:	2024H03-233649							
Yeri:	ANKARA							
Başlama ve Bitiş	2024-2024							
Karakteristiği:	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap							
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %	
			Eklenen	Düşülen				
2024	26.110	26.110	12.000	2.611	35.499	35.153	99,03	

2.3.2.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2024 yılında Muhtelif İşler projesinin 11.000.000,00 TL'si İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesine tahsis edilmiş olup 9.750.000,00 TL'lik kısmı “Mamul Mal Alımları” ve 1.250.000,00 TL'lik kısmı “Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri” bütçesi için ayrılmıştır.

Proje bütçesinden 17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında 2.611.000,00 TL kesinti yapılmıştır. Ayrıca 2.150.000,00 TL proje içi aktarma ile düşülmüş olup toplam ödenek 6.239.000,00 TL olmuştur.

Projeden 6.153.918,19 TL tutarında harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre % 56, toplam ödeneğe göre ise % 98,64 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 12: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Proje Bilgileri

Proje Numarası	2024H03-233649 (Bin TL Bazında)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2024	11.000	-	4.761	6.239	6.153	98,64

Tablo 13: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Harcama Detayları

Alınan Malzemeler	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	100.270,00
İşyeri Mefruşatı Alımları	659.670,00
Büro Makineleri Alımları	432.102,82
Bilgisayar Alımları	3.185.531,52
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	118.320,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	488.280,00
Malzeme Giderleri	18.240,00
Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	1.151.503,85
Toplam	6.153.918,19

2.3.2.2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2024 yılında Muhtelif İşler projesinin 7.785.000,00 TL' lik kısmı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bütçesine tahsis edilmiş olup 4.000.000,00 TL' si "Mamul Mal Alımları", 3.785.000,00 TL ise "Gayri Maddi Hak Alımları" bütçesi için ayrılmıştır.

Mamul mal alımları bütçe tertibine geçmiş yıl ödeneklerinden 4.400.000,00 TL ve proje içi aktarma ile 3.721.048,00 TL eklenerek toplam "Mamul Mal Alımları" bütçesi 11.850.000,00 TL olmuştur. "Gayri Maddi Hak Alımları" bütçesinden 1.000.000,00 TL'si proje içi aktarma ile düşülmüş olup toplam ödeneği 14.906.048,47 TL olmuştur.

Projeden yıl içerisinde 14.806.446,32 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre % 190,19 toplam ödeneğe göre ise % 99,33 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 14: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Proje Bilgileri

Proje Numarası	2024H03-233649 (Bin TL Bazında)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2024	7.785	8.121	1.000	14.906	14.806	99,33

Tablo 15: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Harcama Detayları

Yapılan İş	Miktar
Büro Makineleri Alımları	2.323.200,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	9.476.400,24
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	3.006.846,08
Toplam	14.806.446,32

2.3.2.3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2024 yılında Muhtelif İşler projesinin 6.500.000,00 TL' lik kısmı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine tahsis edilmiş olup 500.000,00 TL'si "Mamul Mal Alımları", 6.000.000,00 TL'si "Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri" bütçesine ayrılmıştır.

Yıl içerisinde projeye 4.600.000,00 TL geçmiş yıl ödeneklerinden, 3.000.000,00 TL ise projeler arası aktarma ile eklenerek toplam ödenek 14.100.000,00 TL olmuştur. Projeden yıl içerisinde 14.096.709,62 TL harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre % 216,87, toplam ödeneğe göre ise % 99,98 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 16: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Proje Bilgileri

Proje Numarası	2024H03-233649 (Bin TL Bazında)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2024	6.500	7.600	-	14.100	14.096	99,98

İlgili tertiplerden yapılan harcama detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 17: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Harcama Detayları

Yapılan İş	Miktar
Diğer Mefruşat Alımları	10.500,00
İş yeri Makine Teçhizat Alımları	64.260,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	334.856,40
Tamir Bakım Aleti Alımları	67.266,00
Atölye Gereçleri Alımları	92.535,60
Zirai Gereç Alımları	513.096,80
Diğer Avadanlık Alımları	17.484,00
Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	933.272,40
İnşaat Malzemesi Giderleri	775.458,00
Elektrik Tesisatı Giderleri	722.300,70
Sihhi Tesisat Giderleri	1.043.043,72
Diğer Malzeme Giderleri	194.124,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	46.800,00
Diğer Müteahhitlik Giderleri	8.565.746,40
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	715.965,60
Toplam	14.096.709,62

2.3.2.4 Personel Daire Başkanlığı

2024 yılında Muhtelif İşler projesinin, 90.000,00 TL’lik kısmı Personel Daire Başkanlığının “Gayri Maddi Hak Alımları” bütçesine yazılım alımları kapsamında ayrılmıştır. Projenin bütçesi alımları Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yapıldığından ilgili birim bütçesine aktarılmıştır. Projeden yıl içerisinde harcama yapılmamıştır.

Tablo 18: Personel Daire Başkanlığı Proje Bilgileri

Proje Numarası	2024H03-233649 (Bin TL Bazında)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2024	90	-	90	-	-	-

2.3.2.5 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2024 yılında muhtelif işler projesinin 100.000,00 TL’lik kısmı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının “Gayri Maddi Hak Alımları” bütçesine ayrılmış olup, projeden yıl içinde yazılım geliştirme hizmet alımları kapsamında 96.000,00 TL tutarında harcama yapılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre % 96 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 19: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Proje Bilgileri

Proje Numarası	2024H03-233649 (Bin TL Bazında)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2024	100	-	-	100	96	96

2.3.2.6 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2024 yılında muhtelif işler projesinin 635.000,00 TL’lik kısmı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının “Gayri Maddi Hak Alımları” bütçesine ayrılmış olup, proje içi aktarma ile düşülerek proje ödeneği 153.951,53 TL olmuştur. Projeden yıl içerisinde harcama yapılmamıştır.

Tablo 20: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Proje Bilgileri

Proje Numarası	2024H03-233649 (Bin TL Bazında)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2024	635	-	481	154	-	-

2.3.3 -2024I00-228260 Muhtelif İşler (Sağlık)

2024 yılında Muhtelif İşler (Sağlık) projesine ayrılan 7.000.000,00 TL'nin 5.000.000,00 TL'si "Mamul Mal Alımları" 2.000.000,00 TL'si "Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri" bütçesine ayrılmıştır.

Yıl içerisinde projeden 4.274.655,98 TL harcama yapılmış olup toplam ödeneye göre % 61,07 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 21: Muhtelif İşler(Sağlık) Proje Bilgileri

Sektör:	SAĞLIK (Bin TL Bazında)						
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ						
Projenin;							
Adı:	Muhtelif İşler						
Numarası:	2024I00-228260						
Yeri:	ANKARA						
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2024-2024						
Karakteristiği:	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı						
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
			Eklenen	Düşülen			
2024	7.000	7.000	-	-	7.000	4.274	61,07

Tablo 22: Muhtelif İşler(Sağlık) Harcama Detayları

Alınan Hizmet	Miktar
Tıbbi Cihaz Alımları	3.137.538,56
Bilgisayar Alımları	685.712,27
Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	451.405,15
Toplam	4.274.655,98

3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER

- Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sâri projelerin hak ediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle ödeme sürecinde sıkıntı yaşanmaktadır.
- Yıllık AFP (Ayrıntılı Finansman Programı) vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- Yıl içerisinde projelere Üniversite kaynaklarından yapılacak olan ödenek ekleme işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı iznine tabi olması sebebiyle iş ve işlemlerde gecikmeler yaşanmaktadır.
- AFP (Ayrıntılı Finansman Programı) ile ödeneklerin aylık olarak serbest bırakılması var olan hak ediş ödemeleri ve bunun gibi ödemelerde aksaklığa sebep olabilmektedir.
- İhale sürecinin uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.
