



T.C.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT
ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART 2019

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	3
1.GENEL DEĞERLENDİRME	5
1.1 Misyon.....	5
1.2 Vizyon	5
1.3 Temel Politikalar ve Öncelikler	5
1.4 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	6
1.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	7
1.6 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme	17
1.7 Üniversitemiz 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	23
2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI	25
2.1 Devam Eden Projeler.....	25
1-2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler	25
2-2012H033150 Kampüs Alt Yapısı.....	26
3-2014K120710 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	26
2.2 Etüt Projeler.....	27
1-2017H036080 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	27
2.3 Yeni Projeler	27
1-2018H037000 Yayın Alımı.....	27
2-2018H036090 Muhtelif İşler.....	28
3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER	31
2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	32



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2018/2019 eğitim öğretim yılı itibari ile ön lisans düzeyinde 1.583' ü Türk ve 74'ü yabancı uyruklu olmak üzere 1.657, lisans düzeyinde 11.845' i Türk ve 1.542 'si yabancı uyruklu olmak üzere 13.387, lisansüstü eğitimde ise 4.169 ' i Türk ve 403' ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4.572 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti vermektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanun'un 25. Maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca Üniversitemizin "2018 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu" hazırlanmış olup saygılarımla kamuoyuna sunarım.

Prof. Dr. Metin DOĞAN
Rektör



“Milli Eğitim'in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.”

M. Kemal ATATÜRK

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Misyon

Bireyin ve toplumun entelektüel ve yenilikçi kapasitesinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bilimsel bilginin üretilmesini, yayılımını, sosyal ve ekonomik faydaya dönüşümünü sağlamada yetkin bir üniversite olmak.

1.2 Vizyon

Keşif ve yenilik doğuran araştırmalarıyla ufuklar açan, mensup ve yetiştirdikleriyle daha iyi bir gelecek inşasına katkı sunan, geliştirdiği toplumsal projeler ile ulusal ve küresel kültürün insanlık değerleri üzerinde yükselmesine yardımcı olan akademik, idari ve mali özerkliğe sahip bir dünya üniversitesi olmak.

1.3 Temel Politikalar ve Öncelikler

- ✓ Belirlediğimiz ve benimsediğimiz değerlerimizi kurumsallaştırmak ve her tür sapmaya karşı toleranssız olmak.
- ✓ Bir dünya üniversitesi olmak amacıyla yapılanmasını rekabetçi bir temelde gerçekleştirmek ve rekabetçiliği üniversite içerisinde kurumsallaştırmak.
- ✓ Sürekli gelişim için öğrenerek ilerlemeyi esas almak.
- ✓ Öğretim ve öğretimde mükemmellik öncelikler sıralamasında asla yeri değişmeyecek bir anlayış ve uygulama geliştirmek.
- ✓ Uluslararası bir bakış ile öğrenim ve öğretim faaliyetlerini sunmak.
- ✓ Eğitim faaliyetlerinde öğrenci odaklılığı benimsemek.
- ✓ Bilgi toplumunda gerekli en temel iki özellik olan analitik ve yenilikçi düşünme biçimini sentezleyerek öğrencilere kazandırmak.
- ✓ Bilimsel faaliyetlerde güç odaklarının baskısına maruz kalmadan hareket etme serbestisi sunmak.
- ✓ Farklı disiplinlerin ortak yaklaşımlarını aynı süreçlerde bütünleştirerek geniş bakış açıları sunmak ve yeni keşifler yapmak.
- ✓ Bilimsel faaliyetlerde üniversite içi ve dışı, ulusal ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmek.
- ✓ Çalışan ve mensuplarımızın toplumsal gelişmelere duyarlı davranmalarını teşvik etmek.
- ✓ Ulusal ve küresel sorunlara araştırma ve önerileriyle çözüm ortağı olmak.
- ✓ Tercih ve faaliyetlerini yerel ve ulusal kalkınmaya faydalı olacak şekilde planlamak ve yürütmek.
- ✓ Faaliyetleriyle sosyo-ekonomik fayda sağlamada ulusal ve küresel ölçekte ihtirash olmak.
- ✓ Faaliyetlerinde bilimsel kazanım ve kaygılar ile ekonomik fayda arasında denge kurmak.
- ✓ Öğretim elemanı ve öğrencilerini girişimci olmaya teşvik etmek temel politika ve önceliklerimizdendir.

1.4 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Üniversitemize 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile aşağıda belirtilen mevcut projeler için 40.010.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca yıl içinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 1.000.000,00 TL yedek ödenekten aktarma yapılmış olup, 2.725.000,00 TL yıl içinde ödenek eklenmiş ve böylelikle 2018 yılı toplam proje tutarı 43.735.000,00 TL olmuştur.

Proje No	Proje Adı	Hazine Yardımı	Yedek Ödenek	Ekleme	Toplam
2011H037200	Derslik ve Merkezi Birimler	28.500	1.000	—	29.500
2017H036080	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	250	—	—	250
2018H036090	Muhtelif İşler	10.000	—	532	10.532
2012H033150	Kampüs Alt Yapısı	500	—	—	500
2018H037000	Yayın Alımı	750	—	293	1.043
2014K120710	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10	—	1.900	1.910
TOPLAM		40.010	1.000	2.725	43.735

Tablo 1:2018 Yılı Yatırımlarının Finansman Kaynakları

1.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'nün fiziksel yapı durumları tabloda gösterilmiş olup var olan fiziki yapı ve inşaatı devam eden alanlarla ilgili olarak gerekli açıklamalara da aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 1: Kapalı Alan

Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (M ²)	Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (M ²)
Esenboğa Külliyesi	77.413,65	Merkezi araştırma Lab. Binası	5.248,00
Bilkent Yerleşkesi	11.536,00	Esenboğa Uluslararası Dök. Merkezi	2.390,00
Çubuk Yerleşkesi	19.705,00	Milli İrade Yerleşkesi	29.847,00
Ulus Yerleşkesi	16.432,00	15 Temmuz Yerleşkesi	44.577,74
Cinnah Yerleşkesi	10.372,50	Keçiören Yurt Binası	2.354,00
Keçiören Yerleşkesi (Ovacık)	5.130,00	ŞerefliKoçhisar Yerleşkesi	8.700,00
TOPLAM		233.705,89	

Esenboğa Külliyesi:

Esenboğa Külliyesi 1. Etap bina kapalı alanı toplamı 77.413,65 m², açık alan toplamı 86.440,00 m²'dir. Kapalı alanlar dört ayrı bina, bir ısı merkezi, Kafe, Spor Merkezi/Soyunma Birimlerinden oluşmaktadır. Açık alanlar 2 adet futbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, 606 araçlık açık otoparktan oluşmaktadır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi içerisinde yurt yapılmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna 40.000 m²' lik bir alan tahsis edilmiştir.

Esenboğa Külliye Yerleşkesinde; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin bazı bölümleri eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Toplamda 4.342 öğrenci Esenboğa Külliyesinde eğitim-öğretim hizmeti alıp, öğrenci başına 17,82 m² alan düşmektedir.



Çubuk Yerleşkesi:

Çubuk ilçesi 96 ada 85 parsel, 124 ada 4 parsel ve 144 ada 153 parsel numaralı arsalar ve üzerindeki taşınmazlar Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14.10.2015 tarih ve 25351 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsis edilmiştir. Bahsi geçen taşınmazların toplam kapalı alanı 19.705 m²'dir. Yerleşkede 1.056 öğrenci eğitim - öğretim hizmeti alıp, öğrenci başına 18,66 m² alan düşmektedir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Hipoterapi Merkezi ve Fitoterapi Merkezi ile sosyal etkinlik alanlarının mevcut olduğu Çubuk Yerleşkesinde okçuluk ve binicilik sporları için altyapı çalışmaları devam etmektedir.



Esenboğa Uluslararası Dökümantasyon Merkezi:



Esenboğa Mah. Atatürk Cd. Çubuk/Ankara adresinde Esenboğa Mahallesi 538 ada da bulunan eski Esenboğa Belediye Hizmet binası 5393 sayılı kanunun 75. Maddesi d bendine göre 07.01.2011 tarihli Çubuk Belediyesi Meclis kararıyla üniversitemize tahsis yapılmıştır. 2.240 m² kapalı alanı bulunan binanın oturma alanı 560 m²' dir. Bina 1 bodrum, 1 zemin, 2 normal kat olmak üzere toplamda 4 kattan oluşmaktadır. Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi bu binada hizmet vermektedir. Toplam kapalı alan 2.390 m²' dir. Esenboğa Uluslararası Dökümantasyon Merkezi ile aynı ada da bulunan 5 ve 6 parseller üzerinde ki halı saha ve sosyal tesisler de 28/05/2014 tarihinde Üniversitemize tahsis edilmiştir.

Etlik Yerleşkesi;

15 Temmuz Şehitler Binası:



29779 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yenimahalle İlçesi Çerçideresi Mahallesinde bulunan 44.577,74 m² alanlı 8010 ada 9 parsel üzerindeki Ayvalı Kampüsü olarak kullanılan bina, Maliye Bakanlığı' nın 29.07.2016 tarih ve 21276 sayılı oluru ile Üniversitemize tahsis edilmiştir. 15 Temmuz Şehitler Binasında; Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Dış Hekimliği Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler.

Yerleşkede 4.050 öğrenci eğitim - öğretim hizmeti alıp, öğrenci başına 11 m² alan düşmektedir.

Milli İrade Binası:



29779 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ankara ili Keçiören İlçesi Ayvalı Mahallesinde bulunan 7703 m² alanlı 90059 ada 2 parsel üzerindeki Rektörlük Kampüsü olarak kullanılan bina Maliye Bakanlığı’ nın 29.07.2016 tarih ve 21276 sayılı oluru ile Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bina 29.847 m²’lik kapalı alana sahiptir.

Milli İrade Binasında; Yabancı Diller Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Fakültesinin bazı bölümleri ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yerleşkede 2.297 öğrenci eğitim - öğretim hizmeti alıp, öğrenci başına 12,99 m² alan düşmektedir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarları Binası:



Ankara Etlik Zübeyde Hanım Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesini de kapsayan 200.737 m² alanlı imarın 63805 ada 8 numaralı parseli Ankara Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 05.03.2015 tarih ve 16425 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsisi gerçekleştirilmiştir. 5.248 m² kapalı alana sahip olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşmaktadır.

Bilkent Yerleşkesi:



Sağlık Temel Bilimleri Ve Laboratuvarları Binası;

Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya / Ankara adresinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin de üzerinde bulunduğu 29104 ada 9 numaralı parselin Tıp Fakültesi Temel Bilimler ve Laboratuvar Binası yapılmak üzere 20.000 m²'lik kısmı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 12.01.2012 tarihinde Üniversitemize tahsis yapılmıştır. Bu alanda yeniden imar uygulaması yapılarak parselin geometrik şekli değiştirilmiş ve 29104 ada 13 parsel olarak tescil edilmiş olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü' nün 05.10.2018 tarihli ve 35497 sayılı yazıları ile Üniversitemize tahsis edilmiştir. Söz konusu tahsisli arsa üzerine Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası inşaat ihalesi TOKİ tarafından 15.08.2013 tarihinde yapılmıştır. Bina 1 bodrum, zemin ve 3 kattan oluşup 11.536 m² toplam kapalı alana sahiptir. Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası 2014-2015 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencilerimiz öğrenimlerine bu binada devam etmektedir.

Yerleşkede 2.093 öğrenci eğitim - öğretim hizmeti alıp, öğrenci başına 5,51 m² alan düşmektedir.

Cinnah Yerleşkesi:



Cinnah Yerleşkesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Cad. No:16 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan iki adet binanın 30.05.2011 tarihinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tahsisi yapılmıştır. Tahsisi yapılan binalardan 4433 ada 9 nolu parsel üzerindeki bina 1 bodrum, 1 zemin, 6 normal kat ve teras kattan oluşmakta olup 5.651,42 m² kapalı alana sahiptir. 4433 ada 10 nolu parsel üzerindeki bina 1 bodrum, 1 zemin, 4 normal kattan oluşmakta olup 1.992,01 m² kapalı alana sahip olup bu iki binanın toplam kapalı alanı 7.643,43 m² dir.

Cinnah Yerleşkesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü faaliyet göstermektedir.

Güvenevler Mahallesi Güneş Sok. No:11 Kavaklıdere, Çankaya / ANKARA adresinde bulunan diğer bina ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan 22.01.2013 tarihli protokol ile tahsisi yapılmıştır. Bina idari ofisler ile derslik olarak kullanılmaktadır. Tahsisi yapılan 4433 ada 23 nolu parsel üzerindeki bina (kapalı alan 2.729,07 m² bina oturma alanı 325 m², açık alan 650 m²) ve 2 bodrum, 5 normal kat, teras kattan oluşmaktadır. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerimiz eğitim görmektedir.

Ayrıca Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk üniversite olarak Pearson Test of English Academic (PTE Academic)merkezi ile DİLMER hizmetlerini bu binada vermektedir.

Yerleşkede 3.019 öğrenci eğitim - öğretim hizmeti alıp, öğrenci başına 3,43 m² alan düşmektedir.

Ulus Yerleşkesi:



Üniversitemiz kurulduğundan bu yana Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Ulus - Altındağ / Ankara adresinde bulunmaktadır. Ankara Valiliğinin 19.12.2012 tarih ve 28417 sayılı olurlarıyla kurulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu tarafından 6360 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi 5. Fıkrası hükmü uyarınca binanın 20.02.2014 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğüne devri yapılmış olup tapu işlemleri tamamlanmıştır. Binanın 16.432 m² kapalı alanı, 1.400 m² oturma alanı bulunmaktadır.

Bina 3 bodrum, 1 zemin ve 6 normal kattan oluşmaktadır. Ulus Yerleşkesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ek Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeler Ofisi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerini Ulus Yerleşkesinde sürdürmektedir.

Keçiören Yerleşkesi:



Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1480/2 Sokak Keçiören/ANKARA adresinde Keçiören Belediyesine ait 90172 ada 1 Parsel de bulunan 3527 m² kapalı alanlı bina 10.04.2012 tarihli protokol ile Keçiören Belediyesince Üniversitemize tahsisi yapılmıştır. Binaya ilaveten 2013 yılında 1285 m² kapalı alanlı çelik bina yapılmıştır.

Yerleşke toplamda 4812 m² kapalı alanlı ve 3.500 m² açık alana sahip olup 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşmakta olup hizmet binası olarak kullanılmaktadır.

Keçiören Yurt Binası:



29779 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü geçici kullanımında iken Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 22.11.2016 tarih ve 32357 sayılı yazısı ile Keçiören İlçesi 19 Mayıs Mahallesinde bulunan 30978 ada 8 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan bina Üniversitemizin geçici kullanımına bırakılmıştır. 2.354 m² kapalı alana sahip olup 3 bodrum kat, 1 zemin kat, 3 kat ve 1 teras kattan oluşmaktadır.

ŞerefliKoçhisar Yerleşkesi:



15 Mart 2018 tarihli ve 2018/11394 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde iken Üniversitemize bağlanan ŞerefliKoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11.01.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve 3843 Sayılı Kanunun 4. Maddesi uyarınca Şerefli Koçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu 19.06.2018 tarihli protokol kapsamında Üniversitemize devredilmiştir.

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi:

Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya / Ankara adresinde; ortak kullanım protokolü gereğince Üniversite Hastanesi/Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi:

Yeni Batı Mah.2026.Cad. Batıkent Yenimahalle/ANKARA adresinde ortak kullanım protokolü imzalanmıştır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Hastanesi:

02 Aralık 2016 tarihinde; Tepebaşı ağız Diş Sağlığı Merkezi ile birlikte kullanım protokolü çerçevesinde Afiliasyon gerçekleştirilmiş ve Eğitim Hastanesi unvanını almış ve 23.01.2017 tarihinden itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Hastanesi; Güçlü Kaya Mah. Fatih Cad. Çağla Sok. No:2 Keçiören / ANKARA adresinde hizmete devam etmektedir.

1.6 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme

Derslik ve Merkezi Birimler



TOKİ I.Etap (77.413 m2)

Esenboğa Külliyesi 1. Etap toplam 4 ana blok, 1 spor kafe, 2 spor merkezi, 1 teknik merkez yapılarından oluşmaktadır. toplam kapalı inşaat alanı 77.413 m² dir.

Ankara İli Çubuk İlçesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü İnsan ve Toplu Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Doğa ve Mühendislik Fakültesi ve Laboratuvarlar Binası, Teknik Binası, Teknik Bina, Spor Merkezi ve Kafe binası İnşaatları ile Alt yapı ve Çevre Düzenlemesi İşi kapsamında Esenboğa Merkez Külliyesi 1. Etap Geçici Kabul işlemleri tamamlanmıştır. Hakediş ödeme seviyesi %93'tür.

Diş Hek. Fak.ve Tam.Tıp Uyg.Araş.Mer. (18.958 m²)

AYBÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası Yapım İşi' için 10.09.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 32.647.000,00 TL olan söz konusu işe 14.09.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanmıştır.

Sağ.Bil.Ort.Ders. (50.000 m²)

AYBÜ Bilkent Yerleşkesi Sağlık Temel Bilimleri Fakültesi Ek Binası Yapım İşi ihaleyi 72.180.000,00 TL bedel ile 25.01.2019 tarihinde sözleşme imzalanarak 31.01.2019 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Sözleşme gereği iş bitim tarihi 06.09.2021 olarak belirlenmiştir.

Üniversitemiz Esenboğa Külliyesinden Kareler







Merkezi Arařtırma Laboratuvarı



Ankara Etlik Zübeyde Hanım Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesini de kapsayan 200737 m² alanlı imarın 63805 ada 8 numaralı parseli Ankara Valiliğı Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 05.03.2015 tarih ve 16425 sayılı yazısı ile üniversitemize kesin tahsisi gerçekleştirilmiştir.

Merkez Arařtırma Laboratuvarı Binası; biri bodrum kat olmak üzere üç katlı, olarak kurgulanmıştır. Binada 20 adet ofis, 31 laboratuvar, 22 depo, 2 arşiv odası, 2 adet asansör makine dairesi, 1 danışma, 2 mutfak, 1 kantin, 1 sığınak, 1 makine teknik hacim, 2 soğuk oda, 1 saf su odası, 2 soyunma odası ve çatı katında, kapalı, açık ve yarı açık mekanlar bulunmaktadır.

Yapı boyutu, 83,90 m x 22,10 m olup, 5248,91 m²lik inşaat alanına sahiptir. Yapı yüksekliğı 16,70 m olup, bina yüksekliğı 9,85 m dir. Merkezi Arařtırma Laboratuvar binasının kesin kabulü 21.03.2018 tarihinde yapılmıştır.



Yayın Alımları

2018 yılında 2018H037000 numaralı Yayın Alımları Projesi için 750.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde kur artışları sebebiyle projeye 293.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, tahsis edilen bu ödenek kapsamında 1.043.000,00 TL tutarında veri taban aboneliği ile basılı kitap alımları yapılmıştır.

2018H037000 numaralı Yayın Alımları Projesi kapsamında alınan kitaplar ile birlikte Üniversitemiz kütüphane envanterinde yer alan toplam kitap sayısı 60.890 adete ulaşmıştır.

Kampüs Altyapısı

Kampüs Altyapısı projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile paralel olarak yürütülmektedir. Kampüs Altyapısı projesi ile 2018 yılında Esenboğa Külliyesi İnşaatının alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2018 yılı içerisinde Çubuk Yerleşkemize ait Asansör Projesi Hizmet Alım İş i ile AYBÜ Tıbbi Bitkiler Bahçesi Uygulama Projesi Hizmet Alım İş leri gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İş ler

2018 yılında 2018H036090 nolu Muhtelif İş ler Projesi kapsamında aşağıda yer alan iş ler tamamlanmıştır.

Yapılan İş	
Büro Mefruşatı Alımları	Tamir Bakım Aleti Alımları
Okul Mefruşatı Alımları	Atölye Gereçleri Alımları
Hastane Mefruşatı Alımları	Diğer Avadanlık Alımları
Diğer Mefruşat Alımları	Kara Taşıt Alımları
Büro Makineleri Alımları	Hareketli İş Makinesi Alımları
Bilgisayar Alımları	Bilgisayar Yazılım Alımları
Tıbbi Cihaz Alımları	Diğerleri
Laboratuvar Cihazı Alımları	Diğer Fikri Hak Alımları
İş yeri Makine Teçhizat Alımları	Diğer Giderler
Diğer Makine Teçhizat Alımları	Hizmet Binası


1.7 Üniversitemiz 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 40.010.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 1.000.000,00 TL yedek ödenek aktarması ve 2.725.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklemeler ile 2018 yılı toplam yatırım bütçesi 43.735.000,00 TL olmuştur.

2018 yılsonu itibari ile projelerden yapılan toplam harcama 43.735.000,00 TL' dir. Böylece % 31,98 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

PROJE ADI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YEDEK ÖDENEK	EKLEME	TOPLAM ÖDENEK	YILSONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI % (Toplam Ödenek)
	40.010	1.000	2.725	43.735	13.988	31,98
EĞİTİM (Toplam)	40.000	1.000	825	41.825	12.088	28,90
Derslik ve Merkezi Birimler	28.500	1.000	—	29.500	1.307	4,29
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	250	—	—	250	62	24,8
Muhtelif İşler	10.000	—	532	10.532	9.676	96,76
Kampüs Alt Yapısı	500	—	—	500	—	—
Yayın Alımı	750	—	293	1.043	1.043	100
DKH-SOSYAL (Toplam)	10	—	1.900	1.910	1.900	99,99
Merkezi Araştırma Lab.	10	—	—	1.910	1.900	99,99
İnşaat	—	—	—	—	—	—
Diğer	10	—	1.900	1.910	1.900	99,99

Tablo 3-Sektörel Bazda Harcama Oranları

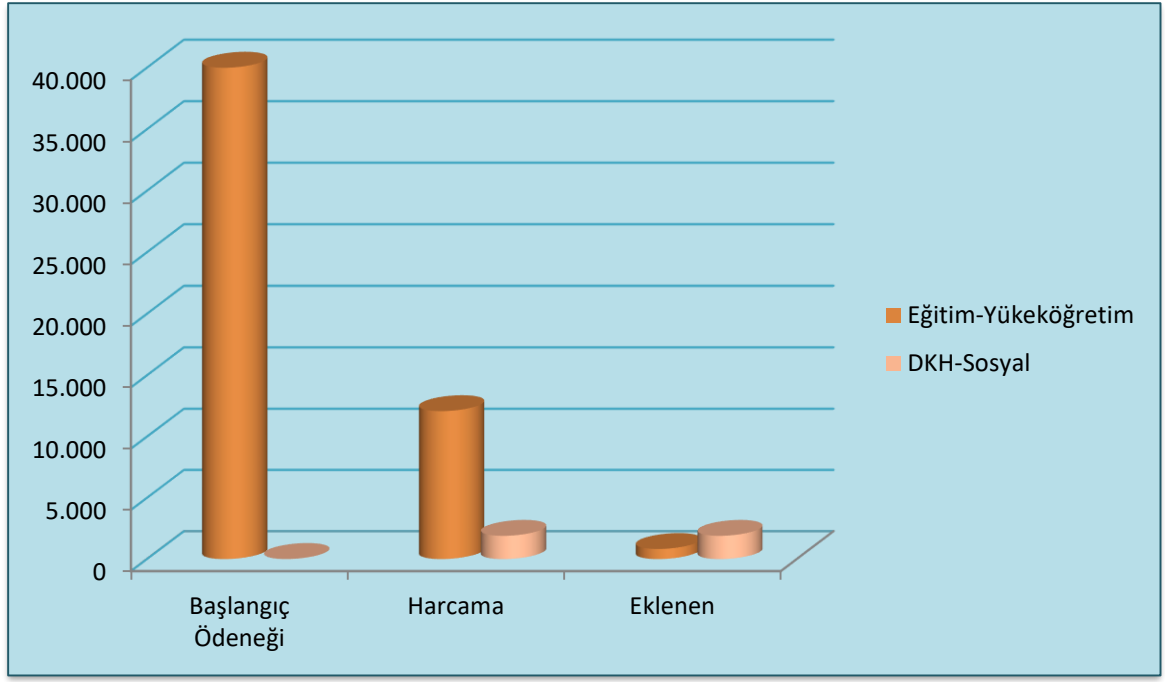

Grafik 1-Sektörel Bazda Harcama Oranları Grafiği

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım projelerinin ekonomik gider koda göre II. düzeyde dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ	Yedek	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	6.210.000,00	----	2.648.000,00	----	8.858.000,00	8.838.204,00
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	750.000,00	----	77.000,00	----	827.000,00	582.503,51
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	29.250.000,00	1.000.000,00	----	----	30.250.000,00	1.369.094,83
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.800.000,00	----	----	----	3.800.000,00	3.197.737,70
	TOPLAM	40.010.000,00	1.000.000,00	2.725.000,00	----	43.735.000,00	13.987.540,04

Tablo 4-Sermaye Giderleri Ekonomik Dağılım

2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

1-2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 28.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2011-2020 yıllarını kapsayan projenin toplam tutarı 235.000.000,00 TL' dir. Yıl içerisinde yatırımları hızlandırma ödeneğinden 1.000.000,00 TL ödenek aktarması yapılmış olup, toplam program ödeneği 29.500.000,00 olmuştur. 2018 yılında projeden 1.307.144,83TL harcanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Esenboğa I. Etap İnşaatı 2016 yılında tamamlanmış olup, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim-öğretime açılmıştır. I. Etap yapılaşması Merkezi Derslikler Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar Binası, Kafe, 2 adet futbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, basketbol sahası ile 606 araçlık açık otoparktan oluşmaktadır. Ayrıca projenin altında bulunan Dış Hek.Fak.veTam.Tıp Uyg.Araş.Mer. ile Sağ.Bil.Ort.Ders. Binası inşaatı sözleşmesi imzalanıp iş yeri teslimleri yapılmıştır

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Derslik ve Merkezi Birimler				
Numarası:	2011H037200				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2011-2020				
Karakteristiği:	Sağ.Bil.Ort.Ders.(50.000 m ²), Dış Hek.Fak.veTam.Tıp Uyg.Araş.Mer. (14.600 m ²), TOKİ I.Etap (74.000m ²)				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Ekleme/Aktarma	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2011	235.000	29.500	1.000	1.307	4,43

2-2012H033150 Kampüs Alt Yapısı

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2018 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Kampüs Alt Yapısı				
Numarası:	2012H033150				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2019				
Karakteristiği:	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı,Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı,Peyzaj, Su isale hattı,Telefon Hattı				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2012	16.000	500			

3-2014K120710 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Toplam Proje Tutarı 15.649,00 TL olan proje için 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 10.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeye yıl içerisinde 1.900.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş böylece toplam ödeneği 1.910.000,00 TL olmuştur. 1.900.000,00 TL harcama yapılarak % 99,99 oranında gider gerçekleşmiştir. İnşaat tamamlanmış olup, Laboratuvar cihaz alımları yapılmıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Merkezi Araştırma Laboratuvarı				
Numarası:	2014K120710				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2014-2018				
Karakteristiği:	İleri Araş.,Mak-Teçh.İnşaat(4900m2)				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2014	15.649	1.910	1.900	1.900	99,99

2.2 Etüt Projeler

1-2017H036080 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 250.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2018 yılında 61.950,00 TL harcama yapılmış ve % 24,78 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				
Numarası:	2017H036080				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2017-2019				
Karakteristiği:	Etüd-Proje ve Müş.				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2017	750	250	–	62	24,78

2.3 Yeni Projeler

1-2018H037000 Yayın Alımı

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 750.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödenek yetersizliği sebebiyle 293.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam ödeneği 1.043.000,00 TL olmuştur. Projeden 2018 yılı içerisinde basılı ve elektronik yayın alımları için 1.042.627,76 TL harcama yapılmış ve % 99,96 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Yayın Alımı				
Numarası:	2018H037000				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2018-2018				
Karakteristiği:	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2018	750	1.043	293	1.043	99,96

2-2018H036090 Muhtelif İşler

7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 10.000.000,00 TL tahsis edilen bu ödenek, Bilgi İşlem, Yapı İşleri ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın bakım-onarım ve yapım ve mal alımlarında kullanılmış olup, ihtiyaçlardan dolayı yıl içerisinde projeye 532.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Proje bütçesine ekleme ile birlikte toplam ödenek 10.532.000,00 TL olmuştur. Projeden 9.675.817,45TL harcama yapılarak % 91,87 oranında bir gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Muhtelif İşler				
Numarası:	2018H036090				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2018-2018				
Karakteristiği:	Bakım Onarım,Bilgi ve İletişim Teknolojileri,Makine Teçhizat, Kesin Hesap				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2018	10.000	10.532	532	9.676	91,87

2.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2018H036090					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2018	2.600	---	---	2.600	2.590	99,62

2018 yılında Muhtelif İşler projesinin 2.600.000,00 TL' lik kısmı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. Projeden 2.590.000,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 99,62oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Alınan Malzemeler	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	365.865,08
Okul Mefruşatı Alımları	1.256.681,12
Diğer Mefruşat Alımları	60.036,40
Hastane Mefruşatı Alımları	1.239,00
Tıbbi Cihaz Alımları	39.297,74
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	9.735,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	42.593,28
Hareketli İş Makinesi Alımları	10.148,00
Laboratuvar Cihaz Alımları	106.005,30
Büro Makineleri Alımları	737,50
Kara Taşıt Alımları	698.323,29
Toplam	2.590.661,71

2.2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2018H036090					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2018	3.600	350	---	3.950	3.706	93,82

2018 yılında Muhtelif İşler projesinin 2.850.000,00 TL' lik kısmı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın "Mamul Mal Alımları" bütçesi için ayrılmış, bu kalemden 3.200.000,00 TL harcama yapılmıştır. 750.000,00 TL' lik kısmı ise "Gayri Maddi Hak Alımları" bütçesi için ayrılmış olup, bu kalemden 506.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Projeden yıl içerisinde toplamda 3.706.000,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 93,82 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Mal Alımları gider kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Malzemeler	Miktar
Büro Makinaları Alımları	74.303,19
Bilgisayar Alımları	210.404,15
Laboratuvar Cihazı Alımları	71.016,83
İş Yer Makina Teçhizat Alımları	26.060,30
Diğer Makine Teçhizat Alımları	2.817.245,30
Avadanlık Alımları	99,12
Atölye Gereçleri Alımları	847,65
Toplam	3.199.976,54

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden Yazılım Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Malzemeler	Miktar
Bilgisayar Yazılım Alımları	505.803,51
Toplam	505.803,51

Ayrıca yıl içerisinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bütçesi altında 77.000,00 TL tutarında Bilgisayar Yazılım Alımı yapılmıştır.

2.3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2018H036090					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2018	3.800	105	---	3.905	3.303	84,58

2018 yılında Muhtelif İşler projesinin 3.800.000,00 TL' lik kısmı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı' nın "Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri" bütçesi için ayrılmıştır. Yıl içerisinde projeye 105.000,00 TL ödenek ekleme işlemi yapılarak toplam bütçesi 3.905.000,00 TL olmuştur. Projeden 3.303.000,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 84,58 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar, aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Diğer Giderler	650.781,80
Hizmet Binası	2.546.955,90
Toplam	3.197.737,70

Mamul Mal Alım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar, aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Diğer Mefruşat Alımları	991,20
Büro Makinaları Alımları	26.461,50
Laboratuvar Cihazı Alımları	188,80
Diğer Makine Teçhizat Alımları	16.060,98
Tamir Bakım Aleti Alımları	814,20
Diğer Avadanlık Alımları	60.421,31
Toplam	104.937,99

3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER

- Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hak ediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır.
- Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- İhale sürecinin uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.
- Ayrıca projelerin gerçekleştirilmesi bakımından yeterince ödenek tahsis edilmemesi de sorunların başında yer almaktadır.

2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		262.500			165.559			40.000			41.825			12.088
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		15.649			8.457			10			1.910			1.900
TOPLAM			278.149			174.016			41.100			43.735			13.988
