



T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART 2016

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

1. Genel Değerlendirme	4
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	4
1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	4
1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme	11
1.4 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları	16
2. 2015 Yılı Proje Uygulamaları	18
2.1 Devam Eden Projeler	18
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	18
1. 2011H037200Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	18
2. 2015H035070 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	19
3. 2012H033150 Kampüs Alt Yapısı Projesi	19
4. 2014K120710 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	20
5. 2015H035090 Yayın Alımları	20
6. 2015H030610 Muhtelif İşler Projesi	21
3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler	23
4. 2015 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	24



SUNUŞ

2015-2016 eğitim öğretim yılı itibari ile ön lisans düzeyinde 61, lisans düzeyinde 7.372' si Türk ve 803'ü yabancı uyruklu olmak üzere 8.175, lisansüstü eğitimde ise 886' sı Türk ve 152' si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3.038 öğrenciye eğitim öğretim vermekte olup, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mevcut ve gelecekte aramıza katılacak olan yeni öğrencilerimizin eğitim mekânlarının hazırlanması için çalışmalarına devam etmektedir.

Esenboğa Mahallesi' nde 3.433 dönümlük arazi üzerine kurulması kararlaştırılan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Külliyesinin I. Etap inşaatına 07.01.2015 tarihinde düzenlenen temel atma töreni ile başlanılmış olup Esenboğa Külliyesi I. Etabı 2016 yılı içerisinde tamamlanacak ve 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren hizmete sunulacaktır.

Bilkent Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası inşaatı ise tamamlanarak 15 Ocak 2015 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak hizmete sunulmuştur. Çağımıza uygun teknoloji, makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanun'un 25. Maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca Üniversitemizin 2015 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup saygılarımla kamuoyuna sunarım.

Prof. Dr. Metin DOĞAN
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Üniversitemize 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile aşağıda belirtilen mevcut projeler için 29.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde ödenek ihtiyacı bulunduğundan yatırımları hızlandırma ödeneğinden 10.000.000,00 TL yedek ödenek verilmiştir. Böylece 2015 yılı toplam proje tutarı 39.500.000,00 TL olmuştur.

Proje No	Proje Adı	Hazine Yardımı	Yedek Ödenek	Ekleme	Toplam
2011H037200	Derslik ve Merkezi Birimler	20.000	10.000	33.961	63.961
2015H035070	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400	—	11	411
2015H035080	Muhtelif İşler	3.600	—	313	3.913
2012H033150	Kampüs Alt Yapısı	1.000	—	5.393	6.393
2015H035090	Yayın Alımı	1.000	—	—	1.000
2014K120710	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	3.500	—	—	3.500
TOPLAM		29.500	10.000	39.678	79.178

Tablo 1-2015 Yılı Yatırımlarının Finansman Kaynakları

1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi inşaat çalışmaları devam etmekte olup Esenboğa Külliyesi ile eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütüldüğü yerleşkelere ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Çubuk Yerleşkesi:

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu



Çubuk ilçesi 96 ada 85 parsel, 124 ada 4 parsel ve 144 ada 153 parsel numaralı arsaların ve üzerindeki taşınmazlar Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2015 tarih ve 25351 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsis yapılmıştır. Bahsi geçen araziler üzerindeki binaların toplam kapalı alanı 19.705 m²'dir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 61 öğrenci ile önlisans eğitimine devam etmektedir.

Esenboğa Uluslararası Dökümantasyon Merkezi:



Esenboğa Mah. Atatürk Cd. Çubuk/Ankara adresindeki 538 ada' da bulunan eski Esenboğa Belediyesi Hizmet Binası 5393 sayılı Kanunun 75. Maddesi d bendine göre 07.01.2011 tarihli Çubuk Belediyesi Meclis kararıyla üniversitemize tahsis edilmiştir. 2.240m² kapalı alanı bulunan binanın oturma alanı 560m² dir. Bina 1 bodrum, 1 zemin, 2 normal kat olmak üzere toplamda 4 kattan oluşmakta; Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi olarak kullanılmaktadır.

Cinnah Yerleşkesi:

Cinnah yerleşkesi Cinnah A Blok, Cinnah B Blok, Cinnah C Blok ve Cinnah D Blok olmak üzere 4 Bloktan oluşmaktadır.

Güvenevler Mahallesi Cinnah Cad. no:16 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Cinnah A ve Cinnah B Blok, 30.05.2011 tarihinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce tahsisi yapılmış olup, 7.925m² kapalı alana sahiptir. A blok 1 bodrum 1 zemin, 6 normal kat, teras kattan oluşmakta olup Cinnah B Blok 1 bodrum 1 zemin, 4 normal kattan oluşmaktadır.



Güvenevler Mahallesi Güneş Sok. No:11 Kavaklıdere, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Cinnah C Blok Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan 22.01.2013 tarihli protokol ile tahsisi yapılmış 2.512 m² kapalı alana sahip ve 2 bodrum, 5 normal kat, teras kattan oluşmakta olup idari ofisler ile derslik olarak kullanılmaktadır.

Güvenevler Mahallesi Güneş Sok. No:5 Kavaklıdere, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Cinnah D Blok ise 2.500 m² kapalı alana sahip olup, 3 bodrum, zemin kat, 3 normal kattan oluşmakta ve akademik ofis olarak kullanılmaktadır.

Cinnah Yerleşkemizde yer alan 4 blokta; Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi hizmet vermektedir.

Etlik Yerleşkesi



Halil Sezai Erkut Cad. Sazak Sok. No: 2 Keçiören/Ankara adresinde bulunmakta olup 24.08.2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarafımıza tahsisi yapılmıştır. Yerleşkede bulunan iki adet betonarme binadan idari ofisler ile derslik olarak inşaa edilen bina bodrum kat+zemin kat + 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlıdır. Diğer bina ise 100 kişi kapasiteli kapalı spor salonudur. Toplam kapalı alan ise 13.830 m² dir.

Etlik Yerleşkemizde; tüm fakültelerin hazırlık sınıfları ile İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu hizmet vermektedir.

Ulus Yerleşkesi:



Üniversitemiz kurulduğundan bu yana Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Ulus – Altındağ/Ankara adresinde; eski Ankara İl Özel İdare Meclisi binası, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlük Ek Birimi olarak kullanmakta ve idari hizmetler bu birimde yürütülmektedir. 07.01.2011 tarihinde Ankara İl Özel İdaresi ile yapılan protokol ile üniversitemize tahsisi yapılmış; Ankara Valiliği’ nin 19.12.2012 tarih ve 28417 sayılı Olur’ larıyla kurulan devir, tasfiye ve paylaşırma komisyonu tarafından 6360 sayılı kanunun geçici 1.maddesi 5. fıkrası hükmü uyarınca 20.02.2014 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’ ne devri yapılmış olup tapu tescili Üniversitemiz adına kaydedilmiştir.

Binanın 16.432 m² kapalı alanı, 1.400 m² oturma alanı bulunmaktadır. Bina 2 Bodrum, 1 zemin ve 6 normal kattan oluşmaktadır.

Yerleşke Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Mühendislik Fakültesi Dekan ofisi ve Öğretim Görevlilerinin ofisleri olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’ nün ofisleri bulunmaktadır. 3 bodrum, zemin kat ve artı 6 kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında kapalı otopark olarak kullanılan alan mevcut olup toplam kapalı alan 15.180 m²’ dir.

Keçiören Yerleşkesi;



Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1480/2 Sokak Keçiören/ANKARA adresinde Keçiören Belediyesine ait 90172 ada 1 Parsel de bulunan bina Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak kullanılmakta olup 10.04.2012 tarihli protokol ile Keçiören Belediyesince Üniversitemize tahsisi yapılmıştır. Tahsisten sonra tadilat projesiyle idari ofisler ile derslik olarak kullanılmaktadır.

Bina 1 bodrum,1 zemin ve 1 normal kattan oluşmaktadır.

Binaya ilaveten 1000 m² kapalı alana sahip ek binanın 25.05.2015 tarihinde ihalesi yapılmış 2015-2016 eğitim öğretim yılında kullanıma başlanılan binanın 23.10.2015 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

Keçiören yerleşkesinin kapalı alanı toplam 4.900 m²dir.

Keçiören Yerleşkemizde; Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bilkent Yerleşkesi;



Sağlık Temel Bilimleri Ve Laboratuvarları Binası;

Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6/A Çankaya Adresinde; 7 Ocak 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Temel Bilimleri Ve Laboratuvarları binasının açılışını gerçekleştirmiş olup, Üniversitemiz Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenimlerine bu binada devam etmektedir. Bina 1 bodrum, zemin ve 3 kattan oluşup, 11.536 m² toplam kapalı alana sahiptir.

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi;

Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya / Ankara adresinde; ortak kullanım protokolü gereğince Üniversite Hastanesi/Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi;

Yeni Batı Mah.2026.Cad. Batıkent Yenimahalle/ANKARA adresinde ortak kullanım protokolü imzalanmıştır.

Küme Akademi Binası; İnşaata, Avrupa Birliği Hibe Programı Kapsamında plan değişikliğinin onayını müteakiben başlanılacaktır. Bina 4.606,89 m² kapalı alana sahiptir.

Sincan'da Ulaştırma Bakanlığı'na ait bir binanın Üniversitemize devri yapılmış olup binanın onarım ve tadilatı yapıldıktan sonra Aile Sağlığı Ve Yaşam Merkezi olarak Üniversitemize hizmet edecektir.

Varlık Yerleşkesi (Merkez Araştırma Laboratuvarları Binası);

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesini de kapsayan 200737 m² alanlı imarın 63805 ada 8 numaralı parseli Ankara Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 05.03.2015 tarih ve 16425 sayılı yazısı ile üniversitemize kesin tahsisi gerçekleştirilmiştir. Bu arsa üzerine yapılması planlanan 5.249 m² kapalı alana sahip olacak 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşacak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Binası 08.12.2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 20.01.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

İslami İlimler Fakültesi;



Altındağ ilçesi 857 ada 18 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Yıldırım Beyazıt Üniversitesine tahsisi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın 09.09.2014 tarihinde uygun görüşleri alınmış olup, Milli Emlak Dairesi Başkanlığıyla tahsis yazışmaları devam etmektedir. Bahsi geçen taşınmazın toplam kapalı alanı 1.861m² dir.

Eski Sincan Adliyesi Binası:

Ankara İli Sincan İlçesi 377 ada 2 parsel nolu taşınmazın Eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 47 nci maddesi gereğince 14.05.2013 tarihinde tahsisi yapılmıştır. Bina 1.900 m² kapalı alan, 5.670 m² açık alana sahiptir

YERLEŞKE	BİNA	TOPLAM KAPALI ALAN (M ²)
ETLİK	ETLİK YERLEŞKESİ	13.830
ULUS	REKTÖRLÜK BİNASI(ULUS YERLEŞKESİ)	16.432
	İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ	1.861
KEÇİÖREN	MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	4.900
CİNNAH	CİNNAH ENSTİTÜ BİNASI	7.925
	CİNNAH FAKÜLTELER DERSLİK BİNASI	2.512
	CİNNAH II. EK HİZMET BİNASI	2.500
BİLKENT	KÜME AKADEMİSİ	4.606
	SAĞLIK TEMEL BİLİMLERİ VE LABORATUVARLARI BİNASI	11.536
ESENBOĞA	KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON MERKEZİ	2.240
	ESENBOĞA KÜLLİYESİ BİRİNCİ ETAP	76.000
ÇUBUK	SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU	19.705
VARLIK	MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI BİNASI	5.249
SİNCAN	AİLE SAĞLIĞI VE YAŞAM MERKEZİ	1.900
TOPLAM	TOPLAM KALAI ALAN	169.944

1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

Derslik ve Merkezi Birimler (Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası)

Ankara İli Çankaya İlçesi Beytepe (Lodumlu) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 29104 ada 6 parselden yaklaşık 20.000,00 m² taşınmaz (tüm parsel alanı 717.793,00 m²dir) Üniversitemize tahsis edilmiştir. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından 15.08.2013 tarihinde Yapım sözleşmesi yapılarak tamamlanan bina 2014-2015 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler (Esenboğa Külliyesi)



Esenboğa Külliyesi 1. Etap yapım işi sözleşmesi 05.06.2014 tarihinde TOKİ BAŞKANLIĞI ile İZKA İNŞ. LTD. ŞTİ arasında 86.995.000 TL bedel ile imzalanmış olup 09.06.2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 1. Etap inşaatı sözleşmesine göre tamamlanarak 2016 Güz döneminde eğitime başlanacaktır.



Esenboğa Külliyesi 1. Etap yapılaşma alanı toplam 77.037,13 m² dir. Bu kapsamda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi A Blok 1 bodrum, 1 zemin ve üzerine 3 normal kattan oluşup toplam 25.929 m², B Blok 1 zemin ve üzerine 3 normal kattan oluşup toplam 21.088 m², Hukuk Fakültesi zemin artı 3 normal kattan oluşup 15.758 m², Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Labaratuvar Binası alt zemin, zemin ve 3 normal kattan oluşup 12.994 m² dir. Ayrıca 468 m² teknik bina, 529,29 m² Spor Kafe, 135,44 m² Spor Merkezi A- ve 135,44 m² spor merkezi B ile 2 adet futbol sahası, Tenis Sahası, Voleybol Sahası, Basketbol Sahası ve 606 Araçlık Açık Otopark yapılmaktadır.

Merkezi Arařtırma Laboratuvarı

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesini de kapsayan 200.737 m² alanlı imarın 63805 ada 8 numaralı parseli Ankara Valilięi Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 05.03.2015 tarih ve 16425 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsisi gerçekleştirilmiştir. Bu arsa üzerine yapılması planlanan 5.249 m² kapalı alana sahip olacak 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşacak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Binası 08.12.2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 20.01.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Yayın Alımları

2015 yılında 2015H035090 numaralı Yayın Alımları Projesi için 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödenek kapsamında açık ihale yolu ile 5.538 adet ve doğrudan temin yöntemi ile 22 adet olmak üzere toplam 5.560 adet kitap alımı yapılmıştır.

2015H035090 numaralı Yayın Alımları Projesi kapsamında alınan kitaplar ile birlikte Üniversitemiz kütüphane envanterinde yer alan toplam kitap sayısı 22.170 adete ulaşmıştır.

Kampüs Altyapısı

Kampüs Altyapısı projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile paralel olarak yürütölmektedir. Kampüs Altyapısı projesi ile 2015 yılında Esenboęa Külliyesi İnşaatının doğalgaz bağlantı anlaşmaları yapılmış olup, alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2015 yılı içerisinde var olan yerleşkelerimizdeki etüt ve proje çalışmaları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Merkezi Araştırma Laboratuvarının projelendirilmesi,

Ayrıca Keçiören Yerleşkesi Ek Hizmet Binasının uygulama projelerinin çizilmesi ve ihale dosyasının hazırlanması işi,

Esenboęa Külliyesi genel vaziyet planına göre imar planı revizyonlarının hazırlanması hizmet alımı ile uygulanması işi gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler

2015 yılında 2015H038050 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında aşağıda yer alan işler tamamlanmıştır.

Yapılan İş
Asansörlerin Periyodik Kontrolü Hizmeti
Ybu İslami İlimler Fakültesi (Atatürk Ortaokulu) A ve B Blok Binalarının İç Cephe Boyası Yapılması Ahşap Kapı ve Pencerelerinin Verniklenmesi Yapım İşİ
Ybu Ulus Yerleşke Binası ve Cinnah Yerleşke Binası Çatısı Onarımı Yapım İşİ
Ybu Ulus Rektörlük Binası Çeşİtli Tadilat İşleri
Ybu Ovacık Yerleşkesi Elektrik Enerji Kablolarının Arızalarının Giderilmesi ve Kablolar Ek Yapılması Hizmet Alım İşİ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Keçiören Ovacık Yerleşkesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Binası
Ybu Bağlı Binalardaki 6 Adet Jeneratörün 2015 Yılı İşletmeye Yönelik Bakım Onarım Hizmet İşİ
Ybu Temel Sağlık Bilimleri ve Laboratuvarları Binası İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşİ
Ybu Çubuk Yerleşkesi 1 Adet Asansörün Yeşİl Etiket Alınması İçin Asansör Tadilat İşleri Yapım İşİ
Ybu İslami İlimler Fakültesi Kantin Revizyonu ve Muhtelif Onarım İşİ
Ybu Muhtelif Binalardaki 10 Adet Asansörün 2015 Yılı İşletmeye Yönelik Bakım ve Onarım Hizmet İşİ
Ybu Sağlık Temel Bilimleri Fakültesi ve Laboratuvarları Binasında Muhtelif Tadilat İşleri Yapım İşİ
Ybu Üniversitesi Etlik Yerleşkesi 2. ve 3. Kat Derslikleri ve Cinnah Bodrum Kat Depolarının Düzenlenmesi Yapım İşİ
Ybu Cinnah Ek Hizmet Binası (Botaş) Aküminyum Doğrama ve Çeşİtli Tadilat İşİ
YBU binalarındaki 7 Adet Kompanzasyon Sistemlerinin İşletmeye Yönelik Bakım Onarım

YBU'ne Baęlı Binalardaki 5 Adet Kompanzasyon Sisteminin İřletmeye Yönelik Bakım ve Onarım Hizmeti
YBU Ulus Ek Hizmet Binası Drenaj Dalgıç Pompaların Montajı ve Tadilat İři
YBU Cinnah Yerleşkesi Ek Hizmet Binası(Botařtan Kiralanan) 1 Adet Asansörün Yeřil Etiket Alınması İin Asansör Tadilat İřleri Yapım İři
Cinnah Güvenlik Amalı Kamera Sistemi Yapılması
ubuk Yerleşkesi Saęlık M.Y.O Binasının Boyanması Kapıların Onarım İřleri Karo Seramik Yapılası Mermer Basamakların Ve eřitli Tadilat İřlerinin Yapılması
Saęlık temel bilimler fakóltesinin evresine panel it yapılması ve laboratuvar tezgah ve dolap yapılası tadilat işi
Cinnah Yerleşkesi A ve B blokların onarım İři
Ulus Rektörlük Binası Soęutma Grubunun Onarım İři
Ek Hizmet Binalarına Ait Isıtma Soęutma Sistemleri ile İřletmeye yönelik Rutin Bakım Hizmetlerinin Yapım İři


1.4 Üniversitemiz 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 29.500.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiş ve yıl içinde yatırımları hızlandırma ödeneğinden Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 10.000.000,00 TL yedek ödenek verilmiştir. 2015 yılı toplam yatırım bütçesi 39.500.000,00 TL olmuştur.

2015 yılsonu itibari ile projelerden yapılan toplam harcama 65.407.000,00 TL' dir. Böylece % 82,61 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

PROJE ADI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YEDEK ÖDENEK	EKLEME	TOPLAM ÖDENEK	YILSONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI %
	29.500	10.000	39.678	79.178	65.407	82,61
EĞİTİM (Toplam)	29.500	10.000	39.678	75.678	65.407	86,43
Derslik ve Merkezi Birimler	20.000	10.000	33.961	63.961	53.961	84,37
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400	—	11	411	411	100
Muhtelif İşler	3.600	—	313	3.913	3.695	94,43
Kampüs Alt Yapısı	1.000	—	5.393	6.393	6.393	100
Yayın Alımı	1.000	—	—	1.000	947	94,7
DKH-Sosyal(Toplam)	3.500	—	—	3.500	—	—
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	3.500	—	—	3.500	—	—
İnşaat	3.500	—	—	3.500	—	—
Diğer	—	—	—	—	—	—

Tablo 3-Sektörel Bazda Harcama Oranları

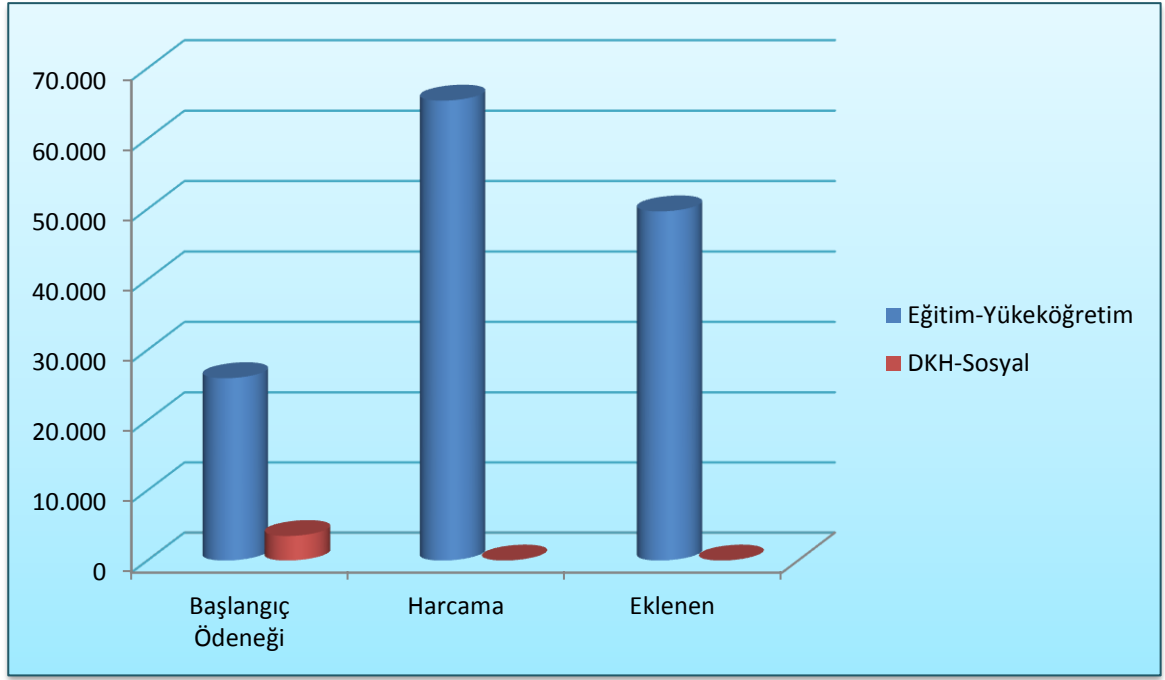

Grafik 1-Sektörel Bazda Harcama Oranları Grafiği

Üniversitemiz bütçesinde yer alan sermaye kalemlerinin ekonomik gider koda göre II. düzeyde dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	3.800.000,00	200.000,00	----	4.000.000,00	2.385.821,22
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	300.000,00	----	----	300.000,00	143.122,70
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	23.000.000,00	49.354.000,00	----	72.354.000,00	60.365.088,25
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.400.000,00	123.864,54	----	2.523.864,54	2.512.725,34
TOPLAM		29.500.000,00	49.666.725,34	-----	79.177.864,54	65.406.757,51

Tablo 4-Sermaye Giderleri Ekonomik Dağılım

2. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

1-2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler

6583 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 20.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Devam eden bu projeden eğitim-öğretim binaları, idari binalar, hizmet binaları, alt yapı tesisleri ve diğer tesislerin yapımı ile bu işlere ait giderlerin TOKİ Başkanlığı'na ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yine proje içerisinde devam eden Sağlık Temel Bilimleri Laboratuvarları Binası yapımı tamamlanarak 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlanılmıştır.

Projeye geçmiş yıllardan kalan ödeneklerden 33.961.000,00 TL likit ile yatırımları hızlandırma ödeneğinden 10.000.000,00 TL yedek ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 63.961.000,00 TL olmuştur. Projeden 2015 yılında 53.961.000,00 TL harcama yapılmıştır. Böylece projeden yapılan gider gerçekleşmesi % 84,37 olarak gerçekleşmiştir.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Derslik ve Merkezi Birimler				
Numarası:	2011H037200				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2011-2016				
Karakteristiği:	TOKİ I.Etap (74000m2)				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen		
2015	20.000	43.961	---	53.961	84.37

2-2015H035070 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 400.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ödenek ihtiyaçlarından dolayı 11.139,20 TL likit ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 411.139,20 TL olmuştur. 2015 yılında projenin tamamı harcanmış ve % 100 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				
Numarası:	2015H035070				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2015-2015				
Karakteristiği:	Etüd-Proje ve Müş.				
		Revize Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2015	400	11	---	411	100

3-2012H033150 Kampüs Alt Yapısı

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projenin geçmiş yıl ödeneklerinden 5.393.000,00 TL likit ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 6.393.000,00 TL olmuş ve toplam ödeneğin tamamı harcanarak % 100 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Kampüs Alt Yapısı				
Numarası:	2012H033150				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2016				
Karakteristiği:	KnI.,El.,Su.,Çev.D.,Gaz Yol,IsıMrk.,Art.,Trf.,Tlf.				
		Revize Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2015	1.000	5.393	---	6.393	100

4-2014K120710 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 3.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2015 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Merkezi Araştırma Laboratuvarı				
Numarası:	2014K120710				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2016				
Karakteristiği:	İleri Araş.,Mak-Teçh., İnşaat(4000m2)				
		Revize Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2015	3.500	---	---	---	---

5-2015H035090 Yayın Alımları

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2015 yılında 947.000,00 TL harcama yapılmış ve % 94,70 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı bütçesi içinde Büro Mefruşatı Alımları, Basılı Yayın Alımları ve Yapımları ile Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları kalemleri altında giderleşmiştir.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Yayın Alımları				
Numarası:	2015H035090				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2015-2015				
Karakteristiği:	Yayın Alımları				
		Revize Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2015	1.000	---	---	947	94,7

6-2015H035080 Muhtelif İşler

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 3.600.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeye 313.000,00 TL likit ödenek eklenmiş ve 3.694.991,70 TL' si harcanarak % 94,43 oranında bir gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Muhtelif İşler				
Numarası:	2015H035080				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2015-2015				
Karakteristiği:	B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt				
		Revize Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2015	3.600	313	---	3.695	94,43

6.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2015H035080					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
		Revize	Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2015	1.250	200	---	1.450	1.439	99,24

2015 yılında Muhtelif İşler projesinin 1.250.000,00 TL' lik kısmı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. İhtiyaçlardan dolayı projenin geçmiş yıl ödeneklerinden 200.000,00 TL ekleme yapılarak Başkanlığın 2015 yılı muhtelif işler proje bütçesi 1.450.000,00 TL olmuştur. Projeden 1.439.143,66 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 99,24 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Alınan Malzemeler	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	436.129,98
Okul Mefruşatı Alımları	183.068,04
Diğer Mefruşat Alımları	10.325,00
Büro Makinaları Alımları	96.012,09
Bilgisayar Alımları	328.935,12
Diğer Makine Teçhizat Alımları	226.994,95
Kara Taşıt Alımları	157.678,48
Toplam	1.439.143,66

6.2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2015H035080					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
		Revize	Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2015	300	---	---	300	143	47,67

2015 yılında Muhtelif İşler projesinin 300.000,00 TL' lik kısmı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı' nın "Gayri Maddi Hak Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. Projeden yıl içerisinde 143.122,70 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 47,67 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden Yazılım Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, alımın yapıldığı birimler ve alınan malzeme bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır.

Alınan Malzemeler	Miktar
Bilgisayar Yazılım Alımları	143.122,70
Toplam	143.122,70

6.3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2015H035080					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
		Revize	Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2015	2.050	113	---	2.163	2.113	97.69

2015 yılında Muhtelif İşler projesinin 2.000.000,00 TL' lik kısmı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı' nın "Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri" bütçesi için 50.000,00 TL' lik kısmı ise "Mamul Mal Alımları" için ayrılmıştır. İhtiyaçlardan dolayı projeye geçmiş yıl ödeneklerinden 113.000,00 TL likit ödenek eklenmiştir. Başkanlığın 2015 yılı muhtelif işler proje bütçesi 2.163.000,00 TL olmuştur.

Projeden 2.112.725,34 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 97,69 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

3.SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER

- Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hak ediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır.
- Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- İhale sürecinin uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.
- Ayrıca projelerin gerçekleştirilmesi bakımından yeterince ödenek tahsis edilmemesi de sorunların başında yer almaktadır.

2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bütçe Türü:Özel Bütçe

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek(Ekleme+Yedek Ödenek)			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		164.500			35.120			26.000			49.678			65.407
Sağlık															
D.KamuHizm.	1		12.720						3.500						
-İktisadi															
-Sosyal	1		12.720						3.500						
TOPLAM			177.220			35.120			29.500			49.678			65.407
