



T.C.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT
ÜNİVERSİTESİ
2019 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART 2020

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	3
1.GENEL DEĞERLENDİRME.....	4
1.1 Misyon.....	4
1.2 Vizyon	4
1.3 Temel Politikalar ve Öncelikler	4
1.4 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	5
1.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	6
1.6 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme	16
1.7 Üniversitemiz 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	20
2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI	21
2.1 Devam Eden Projeler.....	21
1-2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler	21
2-2012H033150 Kampüs Alt Yapısı.....	22
2.2 Etüt Projeler.....	22
1-2017H036080 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	22
2.3 Yeni Projeler	23
1-2019H037000 Yayın Alımı.....	23
2-2019H036090 Muhtelif İşler.....	23
3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER	26
2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	27



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2019-2020 güz dönemi eğitim öğretim yılı sonu itibari ile ön lisans düzeyinde 2.091' i Türk ve 50'si yabancı uyruklu olmak üzere 2.141, lisans düzeyinde 12.932' si Türk ve 1.772 'si yabancı uyruklu olmak üzere 14.704, lisansüstü eğitimde ise 3.916 ' sı Türk ve 463' ü yabancı uyruklu olmak üzere 4.379 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti vermektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanun'un 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca Üniversitemizin "2019 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu" hazırlanmış olup, saygılarımla kamuoyuna sunarım.

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Misyon

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Evrensel değerler ışığında verdiği nitelikli eğitimle bilim, kültür, spor ve sanat alanlarında sorgulamaya açık, ahlaki değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; yaptığı araştırmalar ile bilgi ve teknoloji üreterek toplum yararına sunmayı; sahip olduğu girişimcilik ruhuyla ürettiği bilgi ve teknoloji ekseninde insanlık için fayda üretmeyi; hissettiği sosyal sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası düzeyde beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunmayı misyonu olarak benimser.

1.2 Vizyon

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Sunduğu eğitim-öğretim ile iyi bir gelecek inşasına katkı sağlayan, ilim geleneğimizin engin birikimini günümüze taşımayı başaran, araştırma ve projeleriyle insanlık adına faydalar üreten, uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış, akademik, idari ve mali özerkliğe sahip bir üniversite olmayı vizyonu olarak benimser.

1.3 Temel Politikalar ve Öncelikler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kurumsal kültürünün ve kimliğinin oluşumuna yön veren değerler şunlardır:

Yönetsel Değerlerimiz:

- **Değerlere Dayalı Yönetim:** Belirlediğimiz ve benimsediğimiz değerlerimizi kurumsallaştırmak.
- **Rekabetçilik ve Performans Odaklılık:** Yapılanmasını rekabetçi ve performans odaklı bir temelde gerçekleştirmek ve rekabetçiliği üniversite içerisinde kurumsallaştırmak.
- **Paylaşımçı Olmak:** İdari iş ve işlemleri paylaşımçı bir usulle planlamak, kararları ilgili paydaşlarla birlikte almak.
- **Saydamlık:** Yönetsel şeffaflık ve hesap verebilirlik.

Eğitim Değerlerimiz:

- **Kalite Odaklı Olma Ve Mükemmeliyetçilik:** Eğitimin niteliğini sürekli geliştirmek ve en üst kalitede eğitim sunmak.
- **Uluslararası Yaklaşım:** Uluslararası bir bakış ile eğitim faaliyetlerini sunmak.
- **Öğrenci Odaklılık:** Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklılığı benimsemek.
- **Analitik ve Yenilikçi Yaklaşım:** Bilgi toplumunda gerekli en temel iki özellik olan analitik ve yenilikçi düşünme biçimini sentezleyerek öğrencilere kazandırmak.
- **Milli ve Manevi Değerlere Saygı:** Eğitim-öğretim süreçlerinde milli, manevi ve evrensel değerlere karşı saygılı ve duyarlı olmak.

Araştırma Değerlerimiz:

- **Akademik Özerklik:** Araştırmacıların yürüttüğü araştırma ve eğitim faaliyetlerinde hürriyet haklarına önem vermek.
- **Disiplinler Arası Yaklaşım:** Farklı disiplinlerin ortak yaklaşımlarını aynı süreçlerde bütünleştirerek geniş bakış açıları sunmak ve yeni keşifler yapmak.
- **Araştırma İşbirliklerini Teşvik:** Bilimsel faaliyetlerde üniversite içi ve dışı, ulusal ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmek.
- **Ahlaki Duyarlılık:** Araştırma süreçlerinde bilim ahlakının gerekliliklerini itinayla yerine getirmeye çalışmak.

Toplumsal Sorumluluk Değerlerimiz:

- **Toplumsal Duyarlılık:** Mensuplarımızın milli çıkarlarımıza ve toplumsal gelişmelere duyarlı davranmalarını teşvik etmek.
- **Çözüm Ortağı Olmak:** Ulusal ve küresel sorunlara araştırma ve önerileriyle çözüm ortağı olmak.
- **Yerel ve Ulusal Kalkınmaya Destek:** Tercih ve faaliyetlerini yerel ve ulusal kalkınmaya faydalı olacak şekilde planlamak ve yürütmek. Üretilen bilgiyi iç ve dış paydaşlar aracılığı ile topluma aktarmak.

Girişimcilik Değerlerimiz:

- **Girişimciliği Teşvik Etmek:** Öğretim elemanı ve öğrencilerini girişimci olmaya teşvik etmek.
- **Bilimsel Fayda ile Ticari Fayda Arasındaki Dengeyi Gözetmek-** Faaliyetlerinde bilimsel kazanım ve kaygılar ile ekonomik fayda arasında denge kurmak.

1.4 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Üniversitemize 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile aşağıda belirtilen mevcut projeler için 23.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca yıl içinde 3.248.000,00 TL ödenek eklenmiş ve böylelikle 2019 yılı toplam proje tutarı 26.748.000,00 TL olmuştur.

Proje No	Proje Adı	Hazine Yardımı	Yedek Ödenek	Ekleme	Toplam
2011H037200	Derslik ve Merkezi Birimler	18.000	—	1.000	19.000
2017H036080	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500	—	—	500
2019H036090	Muhtelif İşler	4.000	—	2.218	6.218
2012H033150	Kampüs Alt Yapısı	500	—	—	500
2019H037000	Yayın Alımı	500	—	30	530
TOPLAM		23.500	—	3.248	26.748

Tablo 1:2019 Yılı Yatırımlarının Finansman Kaynakları

1.5 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'nün fiziksel yapı durumları tabloda gösterilmiş olup, var olan fiziki yapı ve inşaatı devam eden alanlarla ilgili olarak gerekli açıklamalara da aşağıda yer verilmiştir.

Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (m ²)	Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (m ²)
Esenboğa Külliyesi	77.413,65	Merkezi Araştırma Lab. Binası	5.248,00
Bilkent Yerleşkesi	11.536,00	Esenboğa Uluslararası Dök. Merkezi	2.390,00
Çubuk Yerleşkesi	19.705,00	Milli İrade Yerleşkesi	29.847,00
Ulus Yerleşkesi	16.432,00	15 Temmuz Yerleşkesi	44.577,74
Cinnah Yerleşkesi	10.372,50	Keçiören Yurt Binası	2.354,00
Keçiören Yerleşkesi (Ovacık)	5.130,00	Şereflikoçhisar Yerleşkesi	10.200,00
TOPLAM		235.205,89	

Tablo 2:Kapalı Alan

Esenboğa Külliyesi:



Esenboğa Külliyesi 1. Etap bina kapalı alanı toplamı 77.413,65 m², açık alan toplamı 86.440,00 m²'dir. Kapalı alanlar dört ayrı bina, bir ısı merkezi, Kafe, Spor Merkezi/Soyunma Birimlerinden oluşmaktadır. Açık alanlar 2 adet futbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, 606 araçlık açık otoparktan oluşmaktadır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi sınırları içerisinde 40.000 m²'lik ve 60.000 m²'lik alana yurt yapılmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu kontrolünde inşaatı başlanılmış olup, ayrıca 10.000 m² lik alana cami inşaatına başlanılacaktır.

Esenboğa Külliye Yerleşkesinde; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Toplamda 11.452 öğrenci Esenboğa Külliyesinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, öğrenci başına 6,7 m² kapalı alan düşmektedir.

Çubuk Yerleşkesi:

Çubuk ilçesi 190645 ada 3 ve 4 parsel numaralı arsalar ve üzerindeki taşınmazlar Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14.10.2015 tarih ve 25351 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsis edilmiştir. Bahsi geçen taşınmazların toplam kapalı alanı 19.705 m²'dir. Yerleşkede 1.787 öğrenci eğitim - öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, öğrenci başına 11 m² kapalı alan düşmektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hipoterapi Merkezi ve Fitoterapi Merkezi ile sosyal etkinlik alanlarının mevcut olduğu Çubuk Yerleşkesinde okçuluk ve binicilik sporları için altyapı çalışmaları devam etmektedir.



Esenboğa Uluslararası Dökümantasyon Merkezi:



Esenboğa Mah. Atatürk Cd. Çubuk/Ankara adresinde Esenboğa Mahallesi 538 ada 3 ve 4 parselde bulunan bina 5393 sayılı kanunun 75. maddesi d bendine göre 07.01.2011 tarihli Çubuk Belediyesi Meclis kararıyla üniversitemize tahsisi yapılmıştır. 2.240 m² kapalı alanı bulunan binanın oturma alanı 560 m²'dir. Bina 1 bodrum, 1 zemin, 2 normal kat olmak üzere toplamda 4 kattan oluşmaktadır. 538 ada 5 ve 6 parseller üzerindeki halı saha ve sosyal tesisler de 28.05.2014 tarihinde Üniversitemize tahsis edilmiştir.

Etlik Yerleşkesi; 15 Temmuz Şehitler Binası:



29779 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yenimahalle İlçesi Çerçideresi Mahallesiinde bulunan 44.577,74 m² alanlı 8010 ada 9 parsel üzerindeki Ayvalı Kampüsü olarak kullanılan bina, Maliye Bakanlığı' nın 29.07.2016 tarih ve 21276 sayılı oluru ile Üniversitemize tahsis edilmiştir. Üniversitemiz tarafından 15 Temmuz Şehitler ismi verilen binada; Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Enstitüsü eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler. Yerleşkede 4.417 öğrenci eğitim - öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, öğrenci başına 10 m² kapalı alan düşmektedir.

Milli İrade Binası:



29779 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ankara ili Keçiören İlçesi Ayvalı Mahallesinde bulunan 7703 m² alanlı 90059 ada 2 parsel üzerindeki Rektörlük Kampüsü olarak kullanılan bina Maliye Bakanlığı'nın 29.07.2016 tarih ve 21276 sayılı oluru ile Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bina 29.847 m²'lik kapalı alana sahiptir. Üniversitemiz tarafından Milli İrade ismi verilen binada; hazırlık eğitimi veren Yabancı Diller Yüksek Okulu eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarları Binası:



Ankara Etlik Zübeyde Hanım Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesini de kapsayan 200.737 m² alanlı imarın 63805 ada 8 numaralı parseli Ankara Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 05.03.2015 tarih ve 16425 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsisi gerçekleştirilmiştir. 5.248 m² kapalı alana sahip olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşmaktadır.

Bilkent Yerleşkesi:



Sağlık Temel Bilimleri Ve Laboratuvarları Binası

Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya / Ankara adresinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin de üzerinde bulunduğu 29104 ada 13 (eski 6) numaralı parselin Tıp Fakültesi Temel Bilimler ve Laboratuvar Binası yapılmak üzere 20.000 m²'lik kısmı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 12.01.2012 tarihinde Üniversitemize tahsis edilmiştir. Söz konusu tahsisli arsa üzerine Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası inşaat ihalesi TOKİ tarafından 15.08.2013 tarihinde yapılmıştır. Bina 1 bodrum, zemin ve 3 kattan oluşup 11.536 m² toplam kapalı alana sahiptir. Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası 2014-2015 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencilerimiz öğrenimlerine bu binada devam etmektedir.

Yerleşkede 2.403 öğrenci eğitim - öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, öğrenci başına 4,8 m² kapalı alan düşmektedir.

Cinnah Yerleşkesi:



Cinnah Yerleşkesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Cad. No:16 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan iki adet binanın 30.05.2011 tarihinden itibaren 5 yıllığına Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne tahsisi yapılmıştır. Tahsisi yapılan binalardan 4433 ada 9 nolu parsel üzerindeki bina 1 bodrum, 1 zemin, 6 normal kat ve teras kattan oluşmakta olup, 5.651,42 m² kapalı alana sahiptir. 4433 ada 10 nolu parsel üzerindeki bina 1 bodrum, 1 zemin, 4 normal kattan oluşmakta olup 1.992,01 m² kapalı alana sahip olup bu iki binanın toplam kapalı alanı 7.643,43 m² dir.

Cinnah Yerleşkesinde Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü faaliyet göstermektedir. Ayrıca Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk olarak üniversitemizde kurulan Pearson Test of English Academic (PTE Academic) merkezi ile Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) hizmetlerini bu binada vermektedir.

Güvenevler Mahallesi Güneş Sok. No:11 Kavaklıdere, Çankaya / ANKARA adresinde bulunan diğer bina ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan 22.01.2013 tarihli protokol ile tahsisi yapılmıştır. Bina idari ofisler ile derslik olarak kullanılmaktadır. Tahsisi yapılan 4433 ada 23 nolu parsel üzerindeki bina (kapalı alan 2.729,07 m² bina oturma alanı 325 m², açık alan 650 m²) ve 2 bodrum, 5 normal kat, teras kattan oluşmaktadır. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Yerleşkede 150 öğrenci eğitim - öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, öğrenci başına 18 m² kapalı alan düşmektedir

Ulus Yerleşkesi:



Üniversitemiz kurulduğundan bu yana Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Ulus - Altındağ / Ankara adresinde bulunmaktadır. Ankara Valiliğinin 19.12.2012 tarih ve 28417 sayılı olurlarıyla kurulan devir, tasfiye ve paylaşırma komisyonu tarafından 6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi 5. fıkrası hükmü uyarınca binanın 20.02.2014 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğüne devri yapılmış olup tapu işlemleri tamamlanmıştır. Binanın 16.432 m² kapalı alanı, 1.400 m² oturma alanı bulunmaktadır.

Bina 3 bodrum, 1 zemin ve 6 normal kattan oluşmaktadır. Ulus Yerleşkesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ek Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı birimleri, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeler Ofisi, İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerini Ulus Yerleşkesinde sürdürmektedir.

Keçiören Yerleşkesi:



Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1480/2 Sokak Keçiören/ANKARA adresinde Keçiören Belediyesine ait 91845 ada 1 parsel (eski 90172 ada 1 parsel) de bulunan 3845 m² kapalı alanlı bina 10.04.2012 tarihli protokol ile Keçiören Belediyesince Üniversitemize tahsisi yapılmıştır. Binaya ilaveten 2013 yılında 1285 m² kapalı alanlı çelik bina yapılmıştır.

Yerleşke toplamda 5130 m² kapalı alana sahip bina olup 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşmakta olup hizmet binası olarak kullanılmaktadır.

ŞerefliKoçhisar Yerleşkesi:

15 Mart 2018 tarihli ve 2018/11394 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde iken Üniversitemize bağlanan ŞerefliKoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 11.01.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve 3843 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca ŞerefliKoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu 19.06.2018 tarihli protokol kapsamında Üniversitemize devredilmiştir.



215 ada 11 parsel üzerinde bulunan bina Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu olarak kullanılmakta olup 1 bodrum 1 zemin ve 3 kattan oluşan 4800 m² kapalı alana sahiptir.



215 ada 12 parsel üzerinde bulunan bina Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak kullanılmakta olup 1 zemin ve 3 kattan oluşan 3900 m² kapalı alana sahiptir.



215 ada 12 parsel üzerinde bulunan bina Şereflikoçhisar Uygulama Oteli olarak kullanılmakta olup 1 bodrum 1 zemin ve 1 kattan oluşan 1500 m² kapalı alana sahiptir.

Yerleşkede 1015 öğrenci eğitim - öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, öğrenci başına 10 m² kapalı alan düşmektedir.

Ankara Şehir Hastanesi:



Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya / Ankara adresinde; ortak kullanım protokolü gereğince Ankara Şehir Hastanesi ile Üniversite Hastanesi/Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi:

Yeni Batı Mah.2026.Cad. Batıkent Yenimahalle/ANKARA adresinde Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi ile imzalanan ortak kullanım protokolü çerçevesinde Üniversite Hastanesi/Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Hastanesi:

02 Aralık 2016 tarihinde; Tepebaşı Ağız Diş Sağlığı Merkezi ile birlikte kullanım protokolü çerçevesinde afiliasyon gerçekleştirilmiş ve Eğitim Hastanesi unvanını almış ve 23.01.2017 tarihinden itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Hastanesi; Güçlü Kaya Mah. Fatih Cad. Çağla Sok. No:2 Keçiören / ANKARA adresinde hizmete devam etmektedir.

1.6 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme

Derslik ve Merkezi Birimler

- **Aybü Diş Hekimliği Fakültesi Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi Binası Yapım İşi**



Derslik ve Merkezi Birimler Projesi altında yürütülen ve 2019 yılı yatırım programında 42.000.000,00 TL tutarlı proje olan Diş Hek. Fak. Ve Tam. Tıp Uyg. Araş. Mer. Binası Yapım İşi' için 10.09.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 32.647.000,00 TL olup, 14.09.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanmıştır. 17.01.2019 tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 'un 32. Maddesiyle 05.01.2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen " Sözleşmelerin Devri ve Tasfiyesi" başlıklı geçici 4. madde hükümlerince yüklenicinin talebi üzerine 18.07.2019 tarihinde sözleşme devri yapılmış olup, başka bir yüklenici firma ile 19.07.2019 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Kaba inşaatın % 50'si tamamlanmış olup, 04.08.2021 tarihinde bitmesi planlanmaktadır.

- **Çubuk Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi 1. Etap Yapım İşi**



05.11.2018 tarihinde ihale edilen 29.11.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan 935.553,00 TL sözleşme bedelli Çubuk Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi 1. Etap Yapım İşi 09.08.2019 tarihinde geçici kabulü yapıp teslim alınmıştır. Çubuk Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve

Araştırma Merkezi 1. Etap Yapım İşi (Sağlıklı Hayat Ve Kronik Hastalıklar Tedavi Merkezi) kapsamında 21.000 m² alternatif tıp bitki yetiştirme alanı, 12.000 m² sülük yetiştirme alanı ve 3.500 m² kapalı alanın onarımını tamamlanmıştır.

➤ TOKİ I. Etap Esenboğa Külliyesi

Esenboğa Külliyesi 1. Etap bina kapalı alanı toplamı 77.413,65 m², açık alan toplamı 86.440,00 m²'dir. Kapalı alanlar dört ayrı bina, bir ısı merkezi, kafe, spor merkezi/soyunma birimlerinden oluşmaktadır. Açık alanlar 2 adet futbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, 606 araçlık açık otoparktan oluşmaktadır. Proje tamamlanmış olup, Esenboğa Külliye Yerleşkesinde; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.





➤ Sağlık Bilimleri Ortak Derslik Binası

AYBÜ Bilkent Yerleşkesi Sağlık Temel Bilimleri Fakültesi Ek Binası Yapım İşi kapsamında yatırım programında yer alan 50.000 m²' lik inşaatın henüz ruhsat işlemleri devam ettiğinden projeye başlanılmamıştır.

Yayın Alımları

2019 yılında 2019H037000 numaralı Yayın Alımları Projesi için 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde kur artışları sebebiyle projeye 30.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, tahsis edilen bu ödenek kapsamında 524.029,74 TL tutarında elektronik ortamda yayın alımları ve yapımları için harcanmıştır. 2019H037000 numaralı Yayın Alımları Projesi kapsamında alınan kitaplar ile birlikte Üniversitemiz kütüphane envanterinde yer alan toplam kitap sayısı 67.492 adete ulaşmıştır.

Kampüs Altyapısı

Kampüs Altyapısı projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile paralel olarak yürütülmektedir. Kampüs Altyapısı projesi ile 2019 yılında Dış Hekimliği Fakültesi Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi Binası Yapım İşine ait alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2019 yılı içerisinde 2017H036080 nolu projeden yeni bir proje hizmet alım işi yapılmamıştır.

Muhtelif İşler

2019 yılında 2019H036090 nolu Muhtelif İşler Projesi Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kullanılmakta olup, yıl içerisinde projeden aşağıda yer alan işler yapılmıştır.

Yapılan İş	
Büro Mefruşatı Alımları	Diğer Makine Teçhizat Alımları
Okul Mefruşatı Alımları	Tamir Bakım Aleti Alımları
Diğer Mefruşat Alımları	Atölye Gereçleri Alımları
Büro Makineleri Alımları	Laboratuvar Gereçleri Alımları
Bilgisayar Alımları	Diğer Avadanlık Alımları
Tıbbi Cihaz Alımları	Bilgisayar Yazılım Alımları
Laboratuvar Cihazı Alımları	Diğer Giderler
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Hizmet Binası

Girişimsel MR ve İnme Klinik Araş.ve Uyg. Merkezi

2019 yılı sonu itibariyle Girişimsel MR ve İnme Klinik Araş.ve Uyg. Merkezi projesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanarak 6.000.000,00 TL kaynak aktarılmış olup, proje 2020 yılı yatırım programına dahil edilmiştir.

AYBÜ tarafından Ankara'da kurulacak GİMRİKAM projesi ile Türkiye'deki manyetik rezonans (MR) görüntüleme, inme veya girişimsel işlemler üzerine araştırma yapan öğretim üyelerinin, mühendislerin, doktorların ve diğer araştırmacıların birlikte tek bir çatı altında AR-GE faaliyetlerini yapabilecekleri, tüm araştırmacılara açık bir altyapının sağlanması hedeflenmektedir.


1.7 Üniversitemiz 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 23.500.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde Muhtelif İşler ve Yayın Alımları Projelerine ödenek ihtiyacından dolayı toplam 3.248.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklemeler yapılmış ve toplam ödeneğimiz 26.748.000,00 TL olmuştur.

2019 yılsonu itibari ile projelerden yapılan toplam harcama 16.075.000,00 TL' dir. Böylece % 60,09 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

PROJE ADI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YEDEK ÖDENEK	EKLEME	TOPLAM ÖDENEK	YILSONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI % (Toplam Ödenek)
EĞİTİM (Toplam)	23.500	—	3.248	26.748	16.075	60,09
Derslik ve Merkezi Birimler	18.000	—	1.000	19.000	9.634	50,71
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500	—	—	500	—	—
Muhtelif İşler	4.000	—	2.218	6.218	5.917	95,16
Kampüs Alt Yapısı	500	—	—	500	—	—
Yayın Alımı	500	—	30	530	524	98,87

Tablo 3-Sektörel Bazda Harcama Oranları

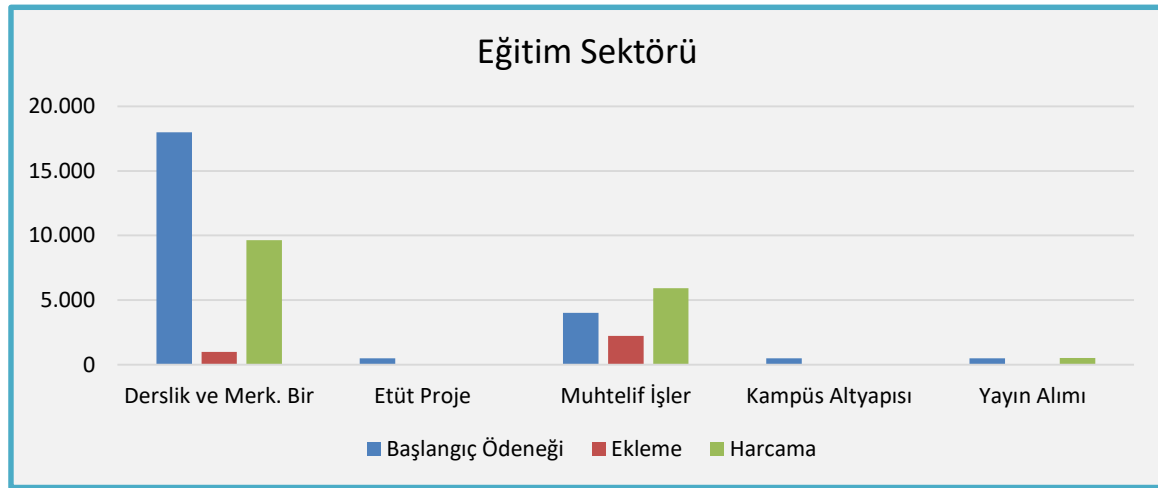

Grafik 1-Sektörel Bazda Harcama Oranları Grafiği

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım projelerinin ekonomik gider koda göre II. düzeyde dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eko. Kod	Açıklama	KBÖ	Yedek	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	2.500.000,00	----	1.130.000,00	----	3.630.000,00	3.586.000,00
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	----	----	520.000,00	----	520.000,00	292.000,00
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	19.000.000,00	----	1.000.000,00	----	20.000.000,00	9.634.000,00
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000,00	----	598.000,00	----	2.598.000,00	2.563.000,00
	TOPLAM	23.500.000,00	----	3.248.000,00	----	26.748.000,00	16.075.000,00

Tablo 4-Sermaye Giderleri Ekonomik Dağılım

2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

1-2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011H037200 nolu projeye 18.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2011-2021 yıllarını kapsayan projenin toplam tutarı 247.000.000,00 TL' dir. Yıl içerisinde projeden toplamda 9.634.308,29 TL harcama yapılarak %53,52 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Esenboğa Külliyesi 1. Etap bina kapalı alanı toplamı 77.413,65 m², açık alan toplamı 86.440,00 m²'dir. Kapalı alanlar dört ayrı bina, bir ısı merkezi, Kafe, Spor Merkezi/Soyunma Birimlerinden oluşmaktadır. Açık alanlar 2 adet futbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, 606 araçlık açık otoparktan oluşmaktadır. Proje tamamlanmış olup, Esenboğa Külliye Yerleşkesinde; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Proje altında yürütülen Diş Hek. Fak. Ve Tam. Tıp Uyg. Araş. Mer. Binası Yapım İşİ 2019 yılında başlamış olup, 2021 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca 2018 yılında yedek kaynak aktarımı ile desteklenen Çubuk Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi 1. Etap Yapım İşİ 2019 yılında ödemeleri yapılarak tamamlanmıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Derslik ve Merkezi Birimler				
Numarası:	2011H037200				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2011-2021				
Karakteristiği:	Sağ.Bil.Ort.Ders.(50.000 m ²), Diş Hek.Fak.veTam.Tıp Uyg.Araş.Mer. (18.958 m ²), TOKİ I.Etap (74.000m ²)				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Ekleme/Aktarma	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2011	247.000	18.000	1.000	9.634	50,71

2-2012H033150 Kampüs Alt Yapısı

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2019 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Kampüs Alt Yapısı				
Numarası:	2012H033150				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2020				
Karakteristiği:	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı,Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı,Peyzaj, Su isale hattı,Telefon Hattı				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2012	16.000	500	—	—	—

2.2 Etüt Projeler

1-2017H036080 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2019 yılında yeni bir proje alımı olmadığından harcama yapılmamıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				
Numarası:	2017H036080				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2017-2019				
Karakteristiği:	Etüd-Proje ve Müş.				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2017	750	500	—	—	—

2.3 Yeni Projeler

1-2019H037000 Yayın Alımı

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 5000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödenek yetersizliği sebebiyle 30.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam ödeneği 530.000,00 TL olmuştur. Projeden 2019 yılı içerisinde basılı ve elektronik yayın alımları için 524.029,74 TL harcama yapılmış ve % 98,87 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Yayın Alımı				
Numarası:	2019H037000				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2019-2019				
Karakteristiği:	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2019	500	530	30	524	98,87

2-2019H036090 Muhtelif İşler

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 4.000.000,00 TL tahsis edilen bu ödenek, Bilgi İşlem, Yapı İşleri ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın bakım-onarım ve yapım ile mal alımlarında kullanılmış olup, ihtiyaçlardan dolayı yıl içerisinde projeye 2.218.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Proje bütçesine ekleme ile birlikte toplam ödenek 6.218.000,00 TL olmuştur. Projeden 5.916.964,30 TL harcama yapılarak % 95,16 oranında bir gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Muhtelif İşler				
Numarası:	2019H036090				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2019-2019				
Karakteristiği:	Bakım Onarım,Bilgi ve İletişim Teknolojileri,Makine Teçhizat, Kesin Hesap				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2019	4.000	6.218	2.218	5.917	95,16

2.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2019H036090					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2019	1.200	1.100	---	2.300	2.262	98,35

2019 yılında Muhtelif İşler projesinin 1.200.000,00 TL' lik kısmı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. Yıl içerisinde ödenek ihtiyaçlarından dolayı projeye 1.100.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek 2.300.000,00 TL olmuştur. Projeden 2.262.000,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 98,35 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Alınan Malzemeler	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	822.336,74
Okul Mefruşatı Alımları	64.225,91
Diğer Mefruşat Alımları	58.026,50
Büro Makineleri Alımları	87.453,82
Bilgisayar Alımları	133.350,13
Tıbbi Cihaz Alımları	111.291,00
Laboratuvar Cihaz Alımları	77.290,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	847.987,96
Atölye Gereçleri Alımları	8.254,10
Laboratuvar Gereçleri Alımları	11.971,10
Diğer Giderler	40.104,92
Toplam	2.262.292,18

2.2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2019 yılında Muhtelif İşler projesinin 700.000,00 TL' lik kısmı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları " bütçesi için ayrılmış olup, yıl içerisinde Gayri Maddi Hak Alımları bütçesine 520.000,00 TL ödenek eklenerek toplam ödeneği 1.220.000,00 TL olmuştur. Projeden yıl içerisinde toplamda 992.000,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 81,31 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Proje Numarası	2018H036090					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2019	700	520	---	1.220	992	81,31

Mal Alımları gider kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Malzemeler	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	59,99
Diğer Mefruşat Alımları	5.755,24
Büro Makinaları Alımları	67.802,01
Bilgisayar Alımları	543.013,51
İş Yeri Makina Teçhizat Alımları	10.224,70
Diğer Makine Teçhizat Alımları	73.143,11
Toplam	699.998,56

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden Yazılım Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Malzemeler	Miktar
Bilgisayar Yazılım Alımları	292.161,80
Toplam	292.161,80

2.3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2018H036090					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2019	2.100	598	---	2.698	2.663	98,70

2019 yılında Muhtelif İşler projesinin 2.000.000,00 TL' lik kısmı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı' nın "Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri" bütçesi için, 100.000,00 TL lik kısmı da Mamul Mal Alımları bütçesi için ayrılmıştır. Yıl içerisinde projeye toplamda 598.000,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılarak toplam bütçesi 2.698.000,00 TL olmuştur. Projeden 2.663.000,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 98,70 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar, aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Diğer Giderler	1.055.527,70
Hizmet Binası	1.506.989,80
Toplam	2.562.517,50

Mamul Mal Alım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar, aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Diğer Mefruşat Alımları	36.226
İş Yeri Makine ve Teçhizat Alımları	4.265,70
Diğer Makine Teçhizat Alımları	43.284,76
Tamir Bakım Aleti Alımları	639,56
Diğer Avadanlık Alımları	15.578,24
Toplam	99.994,26

3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER

- Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hak ediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır.
- Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- Yıl içerisinde projelere Üniversite kaynaklarından yapılacak olan ödenek ekleme işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı iznine tabi olması sebebiyle iş ve işlemlerde gecikmeler yaşanmaktadır.
- İhale sürecinin uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.
- Ayrıca projelerin gerçekleştirilmesi bakımından yeterince ödenek tahsis edilmemesi de sorunların başında yer almaktadır.

2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		268.250			177.647			23.500			26.748			16.075
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
TOPLAM			268.250			177.647			23.500			26.748			16.075
